



**REGIONE BASILICATA**

**DIREZIONE GENERALE  
STAZIONE UNICA  
APPALTANTE**

ISO 9001  
ISO 27001  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza  
Tel. 0971 668194  
dg\_stazione.unica.appaltante@regione.basilicata.it  
dg.sua-rb@cert.regionebasilicata.it

## **RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA SUA – RB**

**ANNO 2023**

*(aggiornata al 29 febbraio 2024)*

**- Marzo 2024 -**

## Sommario

1.	Premessa.....	3
2.	Compiti e funzioni Stazione Unica Appaltante-Regione Basilicata .....	4
3.	Evoluzione del quadro normativo.....	8
3.1	Modifiche Codice dei contratti pubblici – Nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. n. 36/2023) .....	8
3.2	Novità in materia di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici .....	9
3.3	Adozione nuovo schema di convenzione tra la Regione Basilicata e gli Enti aderenti per la disciplina delle attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante .....	10
4.	Descrizione attività anno 2023 .....	11
5.	Soggetto Aggregatore .....	26
6.	Contenzioso.....	27
7.	Piano delle attività 2024 .....	29
8.	Certificazioni .....	43
9.	Articolazione organizzativa e funzionale alla data del 29.02.2024.....	44
10.	Attività Formative .....	48
11.	Considerazioni finali.....	50
	Allegato 1.....	52
	Allegato 2.....	75

## 1. Premessa

La presente relazione, in conformità all'art. 14, comma 4 del Regolamento 10 febbraio 2021, n.1, offre un quadro esaustivo di dati ed informazioni finalizzati alla rappresentazione dell'attività svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata fino al 29 febbraio 2024, con un focus sulle attività dell'anno 2023.

Come di consueto e in linea con il quadro normativo e regolamentare vigente, costituito dalla L.R. n. 15 del 21 aprile 2021 e dall'"Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata", emanato con Decreto n.1 del 10 febbraio 2021, entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale presenta, al Consiglio regionale, la relazione sull'attività svolta dalla SUA-RB. La stessa relazione viene pubblicata sulla pagina web della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante, ed è consultabile unitamente alle relazioni delle precedenti annualità.

L'Analisi delle attività viene condotta avendo a riferimento un quadro normativo sostanzialmente immodificato in riferimento ai compiti e alle funzioni espletate dalla Stazione Unica Appaltante e comunque tenendo conto anche di quanto emerso dai processi di audit tenutisi nel corso del 2023 e che hanno condotto al rinnovo e al mantenimento delle certificazioni del Sistema di gestione sicurezza delle informazioni (UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ) e del Sistema di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001:2015).

Sul piano normativo l'importante novità del 2023 ha riguardato il Nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. 36/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023, entrato in vigore il 1° aprile 2023 e con efficacia a partire dal 1° luglio 2023. Pertanto la seconda metà dell'anno 2023 ha visto l'entrata in vigore del nuovo Codice di cui alcune nuove disposizioni assoggettate ad un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2023) durante il quale è stata prevista un'estensione di vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice (d.lgs. 50/2016), del dl semplificazioni (dl 76/2020) e del dl semplificazioni bis (dl 77/2021).

## 2. Compiti e funzioni Stazione Unica Appaltante-Regione Basilicata

Di seguito si riportano brevi elementi esplicativi di compiti e funzioni della SUA-RB.

In via preliminare, si richiamano gli obiettivi sottesi alla previsione da parte del legislatore nazionale dell'istituzione delle stazioni uniche appaltanti e in generale a fondamento dell'esigenza, da esso rilevata, di centralizzazione degli acquisti.

L'art. 13 della Legge antimafia n. 136 del 13 agosto 2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e il conseguente Decreto di attuazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 pongono l'esigenza di promuovere l'istituzione in ambito regionale di una stazione unica appaltante (SUA) allo scopo di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

Da tale cornice normativa si evince in modo evidente che gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dal legislatore nazionale attraverso la previsione dell'istituzione della SUA regionale sono:

- ✓ favorire la maggiore celerità delle procedure e l'ottimizzazione delle risorse a disposizione nel settore dei contratti pubblici;
- ✓ conseguire standard tecnici e professionali più elevati;
- ✓ accrescere l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- ✓ permettere la prevenzione e il contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità organizzata.

Tali obiettivi e l'esigenza di conseguirli costituiscono la ratio della centralizzazione degli acquisti e, di conseguenza, della disciplina definita nel combinato disposto di cui agli articoli 37 e 38 del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Si aggiunge che nel nuovo Codice (d.lgs. 36/2023 entrato in vigore il 1°luglio 2023) agli artt. 62-64 viene dato nuovo impulso verso la centralizzazione e la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Nelle citate disposizioni del Codice dei contratti pubblici viene affermato il principio secondo cui le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente agli acquisti solo laddove siano in possesso di una specifica qualificazione che consegue al possesso di precisi requisiti, in presenza dei quali la stazione appaltante viene iscritta in un apposito elenco presso l'ANAC, con conseguente qualificazione della stessa.

La Stazione Unica Appaltante di cui all'art. 32 della L.R. n. 18/2013, attuativa a livello regionale delle finalità perseguite dal legislatore nazionale attraverso l'istituzione di una SUA per Regione, è inserita tra i «soggetti aggregatori», che sono le centrali di committenza iscritte nell'apposito elenco disposto dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014.

Vi sono iscritti fino a un massimo di 35 soggetti, tra cui di diritto Consip S.p.A. e una Centrale di Committenza per ogni regione. In ogni Regione è presente, quindi, per previsione nazionale, un solo Soggetto Aggregatore/Centrale di Committenza che è obbligato a rendere evidente la propria Pianificazione delle attività di gara attraverso il sito nazionale a tale scopo dedicato.

La Pianificazione integrata avviene nell'ambito del Tavolo Tecnico nazionale insediato presso il Ministero competente, di cui al D.P.C.M. del 14 novembre 2014. In tale ambito ciascun soggetto aggregatore deve inviare la pianificazione relativa alle attività dei due anni successivi, al fine di definire il Piano Integrato delle Iniziative di acquisto aggregato.

Ancora, i commi 548 e 549, art. 1, Legge n. 208 del 2015, al fine di garantire la razionalizzazione della spesa pubblica, impongono:

- ✓ da un lato, agli enti del SSN, l'approvvigionamento in via esclusiva per il tramite delle Centrali regionali di committenza di riferimento;
- ✓ in caso di indisponibilità o non operatività delle stesse, la norma riconosce comunque alla Centrale di riferimento il ruolo di soggetto deputato in via esclusiva all'individuazione di altra Centrale ai fini dell'approvvigionamento;
- ✓ infine, in linea più generale, e dunque in relazione a tutte le altre categorie merceologiche e agli approvvigionamenti di tutti gli enti, viene ritenuta necessaria la Pianificazione in rete in precedenza descritta, anche quale criterio premiale relativo alla collaborazione tra i soggetti aggregatori per il riparto annuale del Fondo nazionale ad esso dedicato.

Per maggiore completezza ed in ossequio alla L. R. n. 18 del 2013, articolo 32, e smi si riassumono nel seguito le funzioni svolte dalla Direzione Generale SUA-RB:

a) Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, degli enti del SSR, degli enti strumentali della Regione, delle società interamente partecipate dalla Regione e di quelle sulle quali la Regione esercita il controllo di cui all'art. 2359 c.c., nonché dei consorzi di bonifica e dei consorzi di sviluppo industriale operanti in Basilicata;

b) Centrale di Committenza degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale;

c) Soggetto aggregatore della Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89.

I soggetti operanti nel territorio regionale diversi dai precedenti hanno la facoltà di aderire alla SUA-RB previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Il Consiglio dell'ANAC con deliberazione n.58 del 23 luglio 2015 ha iscritto nell'elenco dei Soggetti Aggregatori ex art. 9 D.L. 66/2014, per la Regione Basilicata, il Dipartimento (oggi Direzione Generale) Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata.

Da ultimo, i compiti e le funzioni della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante sono riassunti **all'articolo 14 del Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata"**:

- ✓ esercita le funzioni relative all'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, nonché dei servizi e delle forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria e, in funzione di Soggetto Aggregatore, procede all'approvvigionamento dei beni e servizi di cui alle categorie

merceologiche individuate con DPCM emanato ai sensi del 3° co. dell'art. 9 del DL. 66/20104 convertito, con modificazioni, nella L. 89/2014 nei limiti di competenza ivi previsti;

- ✓ svolge i compiti previsti dai commi 2, 3, 4 e 4-bis dell'articolo 32 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata).

La Direzione Generale SUA-RB inoltre:

- ✓ cura la Qualità dei servizi, i processi di Certificazione e connessi adempimenti;
- ✓ cura le attività di formazione continua del personale degli uffici in materia di appalti pubblici;
- ✓ gestisce le attività amministrative e contabili correlate all'attivazione delle fonti di finanziamento;
- ✓ propone e cura la predisposizione di circolari e/o regolamenti di valenza generale ed aggiorna i disciplinari di gara tipo ed i Contratti tipo;
- ✓ cura l'aggiornamento delle Convenzioni tra la SUA-RB ed i soggetti che aderiscano alla stessa per obbligo di legge o su base volontaria e ne segue l'attuazione;
- ✓ cura adempimenti connessi all'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e ai relativi Aggiornamenti.

In relazione all'ultimo punto, nell'ambito della SUA-RB è individuato il funzionario incaricato di ricoprire il ruolo di RASA della Regione Basilicata, ossia di "Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante" con compiti di verifica e aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante.

In riferimento a quanto detto in precedenza in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti e alla luce delle disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti, la SUA-RB, in quanto soggetto aggregatore, è stazione appaltante qualificata di diritto, ai sensi del comma 4, art. 63 del d.lgs. 36/2023.

Inoltre, da ultimo, con DGR n. 100 del 22/02/2024 alla SUA-RB è stata attribuita la competenza alla predisposizione, tenuta ed aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici e del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi della Regione Basilicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del d.lgs. 36/2023 rubricato "Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi", che al comma 1 prevede che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi".

L'attribuzione della suddetta competenza alla SUA-RB risponde inoltre a quanto disposto dall'allegato I.5 al d.lgs. 36/2023 e, in particolare, dall'art. 3, commi 13 e 14 (per la programmazione dei lavori pubblici) e dall'art. 6, comma 13 (per la programmazione degli acquisti di forniture e servizi), secondo cui la programmazione triennale degli appalti è una attività che richiede un continuo e costante aggiornamento, secondo le necessità di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di interesse dell'Amministrazione e che, pertanto, deve essere affidata ad una struttura stabile all'interno dell'Amministrazione che ne curi la redazione e il relativo aggiornamento.

Conseguentemente a quanto disposto dalla DGR n. 100 del 22/02/2024, il Direttore Generale della SUA-RB con determina n. 20BA.2024/D.00063 dell'11/03/2024 ha individuato un

funzionario in servizio presso la Direzione Generale SUA-RB, cui attribuire il compito di referente della programmazione triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, nonché referente unico per la BDAP.

### 3. Evoluzione del quadro normativo

#### 3.1 Modifiche Codice dei contratti pubblici – Nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. n. 36/2023)

Nel 2023 il quadro normativo in materia di appalti è stato profondamente modificato con l'entrata in vigore dal 1 luglio 2023 del Nuovo Codice degli Appalti di cui al d.lgs. n. 36/2023 – adottato in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.

Alla luce di tale evoluzione normativa nel 2023 il percorso verso la piena e integrale applicazione del nuovo Codice ha visto una articolazione in tre fasi:

Nella prima fase, dal 1 gennaio al 1 aprile 2023, si è proceduto con l'applicazione del d. lgs 50/2016 in continuità con il 2022 e in ottemperanza degli importanti provvedimenti approvati nello stesso anno:

- Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- Decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108;
- Decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 (DL semplificazioni fiscali).

A tali decreti si è inoltre aggiunto il Decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13, c.d. “PNRR 3”, con importanti previsioni normative finalizzate all'accelerazione e allo snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere.

Nella seconda fase (1 aprile 2023 - 1 luglio 2023), in attesa dell'entrata in vigore del nuovo Codice, si è continuato ad operare con le disposizioni del d.lgs. 50/2016 (vigente fino alla data dell'1 luglio 2023) nel mentre è iniziato, per la Stazione Unica Appaltante, un processo formativo e informativo finalizzato al concreto accoglimento delle disposizioni del Nuovo codice.

Nella terza fase (1 luglio 2023 - 31 dicembre 2023), il nuovo Codice dei contratti pubblici ha acquisito efficacia ed è stato abrogato il precedente d.lgs. 50/2016, le cui disposizioni hanno continuato ad applicarsi esclusivamente ai “procedimenti in corso”, intendendo per tali le gare indette o le procedure avviate prima del 1 luglio 2023. In tale fase ha preso così avvio il cosiddetto “regime transitorio” (disciplinato agli artt. 224, 225 e 226 del d.lgs. 36/2023). In particolare l'efficacia delle disposizioni del nuovo codice in materia di obblighi di pubblicazione, digitalizzazione, trasparenza, accesso agli atti e modalità di verifica dei requisiti è stata posticipata al 1 gennaio 2024 (art. 225, commi 1 e 2). Il periodo interessato dal “regime transitorio”, di non facile gestione per l'evidente sovrapposizione di disposizioni vecchie e nuove, è cessato il 31 dicembre 2023, ferma restando la vigenza, anche oltre tale termine, di particolari disposizioni applicabili agli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC (art. 225 comma 8).



Alla luce dell'entrata in vigore del Nuovo Codice, anche le disposizioni operative adottate dalla DGR n. 713/2020, a conclusione della fase di adozione integrale delle disposizioni del nuovo Codice, saranno aggiornate in stretta coerenza con le modifiche apportate al ciclo di vita del contratto così come disposto dal d.lgs. 36/2023.

### 3.2 Novità in materia di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici

L'attuazione integrale del d.lgs. 36/2023 dal 1° gennaio 2024 ha portato alla luce alcuni degli istituti più ambiziosi della riforma, tra cui la digitalizzazione completa del ciclo di vita del contratto, e la conseguente interoperabilità tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC e le piattaforme di e-procurement in uso alle Stazioni Appaltanti e agli Enti concedenti.

Rispetto al d.Lgs. 50/2016, che già prevedeva la digitalizzazione delle procedure all'art. 44, il nuovo Codice si spinge ben più in là, mettendo le basi per un "ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)" (art. 22), costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali in uso alle Stazioni Appaltanti – con al centro la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico gestiti da ANAC - che nel loro complesso consentiranno il monitoraggio completo del ciclo dei contratti pubblici.

Al centro del nuovo sistema di appalti digitali c'è la Banca Dati Anac, che interagisce da una parte con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti, e dall'altra con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, come SIMOG per la richiesta del CIG e SCP per gli adempimenti informativi.

L'applicazione della disciplina riferita alla digitalizzazione ha richiesto alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la necessità di cambiare le modalità di svolgimento delle procedure di gara, imponendo loro, in primo luogo, l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili.

Ciò ha comportato l'obbligo, per tutte le stazioni Appaltanti, di utilizzare piattaforme di e-procurement certificate da AgID, e quindi interoperabili con la BDNCP nella gestione di tutte le fasi dei contratti pubblici.

La SUA-RB, stazione appaltante qualificata di diritto in quanto soggetto aggregatore, ai sensi del comma 4, art. 63 del d.lgs. 36/2023, ha, nel mese di marzo 2024 ottenuto la certificazione come gestore autorizzato della Piattaforma digitale "Basilicata Appalti".

Tale processo di certificazione, avviato già alla fine dell'anno 2023 e svoltosi con la preziosa e fondamentale collaborazione dell'Ufficio Amministrazione Digitale, si è concluso in tempi meno rapidi del previsto a causa della laboriosità del processo medesimo che ha previsto il coinvolgimento di più attori (ANAC, AGID, l'operatore economico titolare del contratto di manutenzione, la SUA-RB, l'Ufficio Amministrazione Digitale).

Tale piattaforma digitale, a disposizione di tutti gli Uffici regionali e non solo della SUA-RB, potrà essere, in futuro, utilizzata anche da altre amministrazioni.

L'utilizzo di piattaforme di e-procurement "certificate" da parte delle stazioni appaltanti permetterà a tutte le amministrazioni pubbliche una gestione trasparente, efficiente e moderna dei propri acquisti, con ricadute indotte anche sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini.

### 3.3 Adozione nuovo schema di convenzione tra la Regione Basilicata e gli Enti aderenti per la disciplina delle attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante

*L'art. 62 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, al comma 9, dispone che "il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata".*

In continuità con quanto già rilevato nella Relazione dell'anno precedente ovvero della necessità di una revisione delle convenzioni in essere con gli Enti Committenti, allo scopo di renderle conformi alle previsioni del Regolamento 25 ottobre 2021, n. 2, si è proceduto con l'adozione di un nuovo schema di Convenzione.

Pertanto, alla luce di quanto disposto dal succitato art. 62, comma 9 del d.lgs. 36/2023 e di quanto già in essere a seguito del Regolamento n. 2 del 25 ottobre 2021, è stato adottato un nuovo schema di convenzione, approvato con DGR n. 247 del 5/5/2023, coerente con le previsioni della DGR 713/2020, con quelle del Regolamento, n. 2/2021 e con un espresso rinvio al "Nuovo Codice dei contratti pubblici", nel quale sono stati disciplinati i rapporti tra la SUA-RB e gli Enti a qualsiasi titolo aderenti per la disciplina delle attività svolte dalla stessa Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'art. 32 della l.r. n. 18/2013 nonché in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89.

Alla data della presente relazione la nuova convenzione risulta sottoscritta da tutti gli Enti obbligatoriamente aderenti ad eccezione di SEL e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale alle quali, da ultimo, se ne è sollecitata l'adesione d'intesa con la Direzione Generale Per la Salute e le Politiche della persona.

## 4. Descrizione attività anno 2023

Le attività del 2023 sono state sviluppate a partire dalla pianificazione annuale definita attraverso le previste fasi di consultazione dei Soggetti Obbligati. Tale pianificazione prevedeva per il 2023 per la tipologia di “Servizi e Forniture” e la tipologia di “Lavori” un numero complessivo rispettivamente di 63 e 28 gare, per un totale generale di 91 gare.

Nello specifico:

- ✓ 32 gare (di cui 31 per “servizi e forniture” e 1 per “lavori”) per le Aziende del Sistema Sanitario Regionale approvate in apposita Conferenza di Servizi, tenutasi in modalità remota in data 28.02.2023, convocata dalla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona, che rappresenta istituzionalmente la sede decisionale competente per la Pianificazione sanitaria e relativa vigilanza e controllo ai sensi di legge.  
Tra di esse, sono ricomprese quelle ascrivibili alla competenza di Soggetto Aggregatore regionale facente capo alla Direzione Generale SUA-RB, come riconosciuto da ANAC con deliberazione del 23 luglio 2015;
- ✓ 16 gare (di cui 10 per “servizi e forniture” e 6 per “lavori”) per la Regione Basilicata;
- ✓ 43 gare (di cui 22 per “servizi e forniture” e 21 per “lavori”) per altri Enti.

Del numero di gare pianificate per il 2023, è stato possibile procedere con la pubblicazione di n. 40 gare, ovvero quelle per le quali i diversi Enti Committenti hanno prodotto la documentazione propedeutica all’indizione delle stesse e nello specifico:

- ✓ 20 gare per le Aziende del Sistema Sanitario Regionale;
- ✓ 8 gare per la Regione Basilicata;
- ✓ 12 gare per altri Enti.

Nel contempo sono proseguite le attività in riferimento alle gare relative alle pianificazioni delle annualità precedenti che risultavano non ancora concluse alla data del 31 dicembre 2022. In particolare sono state aggiudicate 11 gare pubblicate nelle annualità 2019-2022 (1 nel 2019, 1 nel 2021 e 9 nel 2022).

Con tali aggiudicazioni sono state portate a conclusione tutte le gare delle annualità precedenti al 2023.

Inoltre delle 40 gare pubblicate nel 2023 ne sono state concluse 28 di cui 26 aggiudicate, 1 infruttuosa e 1 deserta su un lotto e revocata sul secondo lotto.

Pertanto, in totale, considerando anche l’aggiudicazione delle 11 gare pubblicate nelle annualità 2019/2021, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 29 febbraio 2024, sono state portate a conclusione 39 procedure di gara di cui 37 aggiudicate, 1 infruttuosa e un’altra deserta su un lotto e revocata sull’altro lotto.

Le attività realizzate, analogamente all’anno precedente, sono state condotte avendo a riferimento la Delibera di Giunta Regionale n. 846 del 14 novembre 2019 con cui sono state approvate le Linee Guida per il funzionamento dei Tavoli Tecnici di Lavoro delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale propedeutici alla Conferenze di Servizio presso la SUA-RB, la DGR n.

713 del 20 ottobre 2020 nonché le previsioni di cui al Sistema per la Sicurezza delle Informazioni ISO ENI 27001 ed al Sistema per la Qualità ISO 9001 della SUA-RB.

Partendo dalla Convenzione che disciplina le attività di ogni Ente inerenti alla Stazione Unica Appaltante, le linee guida in parola provvedono a definire la documentazione necessaria all'avvio delle attività dei Tavoli Tecnici e le procedure di svolgimento di tali attività al fine di evitare l'allungamento dei tempi di lavoro e garantire la coerenza di tali attività con la programmazione di riferimento.

Di seguito, la ricognizione delle attività di gara viene rappresentata in una tabella riassuntiva che riporta i dati relativi alle gare pubblicate nel periodo 2015-2023 (divise per Ente Committente) a cui fanno seguito alcuni diagrammi da cui si evince, in forma sintetica, il trend delle gare pubblicate. Segue quindi una tabella con le gare pubblicate nell'annualità 2023, mentre nell'**Allegato 1** alla presente relazione vengono riportate le tabelle relative alle gare pubblicate nelle annualità 2015-2022 con relativo stato/esito.

Dai dati di seguito rappresentati è possibile rilevare quanto segue:

- Il 2023 è ad oggi l'anno in cui sono state pubblicate gare per l'importo totale più alto registrato nei nove anni di attività della SUA-RB. Ad incidere fortemente su tale dato è stata la procedura di gara relativa all'affidamento in concessione del servizio di "TPL gomma regionale, provinciale e comunale di competenza della Regione Basilicata", attualmente in corso.
- Nel 2023 in relazione al "totale importi a base d'asta" le gare gestite per "la Regione Basilicata" e quelle per il "Servizio Sanitario regionale" hanno pesato rispettivamente nella percentuale del 63% e del 34% a fronte di un 21% e di un 73% sul totale delle gare pubblicate nelle annualità precedenti. La maggiore percentuale legata alle gare della Regione Basilicata è ovviamente dovuta alla presenza della procedura di cui al punto precedente. In ogni caso il dato rileva un maggior bilanciamento nella distribuzione delle gare tra i diversi Enti Committenti e conferma una crescita nella richiesta di espletamento gare da parte dei diversi Enti aderenti ma anche una consolidata capacità della SUA-RB in termini di assistenza ai diversi soggetti committenti nonché alle altre Direzioni Generali della Regione Basilicata a partire dalle fasi preliminari di elaborazione della documentazione tecnica di gara;
- Rimane alta la percentuale di aggiudicazione delle gare che nel periodo 2015-2023 si attesta all'88 % ovvero 250 gare aggiudicate su 283 pubblicate.
- Migliora inoltre il trend in termini di percentuale di conclusione delle procedure di gara pubblicate che, nel periodo 2015-2023, si attesta al 96 % (percentuale più alta in assoluto rispetto agli anni precedenti), con un solo 4 % di gare in corso di espletamento, ovvero solo 12 gare, tutte peraltro pubblicate nel 2023. L'alta percentuale di conclusione delle procedure di gara denota una capacità di gestione delle gare assolutamente migliorata, da parte della SUA-RB, in termini di tempistica delle fasi operative estremamente contenuta. Ad avvalorare la consolidata "velocità" di gestione delle gare interviene un ulteriore dato riferito a 2 procedure di gara pubblicate e aggiudicate nel corso dell'anno

2023, per l'affidamento di lavori, espletate per conto del Consorzio di Bonifica della Basilicata e finanziate con le risorse del PNRR. Per entrambe le gare il decreto di finanziamento imponeva il rispetto di una tempistica particolarmente stringente, fissando al 31/01/2023 (successivamente prorogato al 28/02/2023) il termine per la pubblicazione del bando di gara e al 15/11/2023 il termine per l'aggiudicazione. I responsabili di procedimento della SUA-RB, operando di concerto e in perfetta sinergia con i funzionari del Consorzio di Bonifica della Basilicata, hanno consentito il rispetto dei tempi fissati dal decreto di finanziamento, nonostante sia stata necessaria una revisione dei Progetti che tenesse conto dell'adeguamento dei prezzi, e, conseguentemente, una nuova verifica e validazione degli stessi progetti da parte dei committenti. Verifica e validazione perfezionate, rispettivamente, solo in data 13/02/2023 e 21/01/2023, ovvero pressoché a ridosso del termine fissato per la pubblicazione del bando di gara. Le due gare, inoltre, sono state aggiudicate rispettivamente, in data 28/07/2023 e 25/08/2023 e quindi, in entrambi i casi, con largo anticipo rispetto al termine fissato dal decreto di finanziamento malgrado fosse stato adottato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, criterio che richiede adempimenti aggiuntivi e procedure non snelle.

Si precisa, infine, che nei grafici e nelle tabelle che seguono, lo stato di ciascuna procedura di gara è aggiornato alla data del 29 febbraio 2024.

Relativamente alla distribuzione per Ente delle gare pubblicate, i grafici che seguono vengono rappresentati dapprima con riferimento al periodo 2015-2022 e successivamente con riferimento solo all'anno 2023.

Si specifica inoltre che per anno di pubblicazione si intende l'anno della pubblicazione sulla GURI ovvero, per gare espletata attraverso SDAPA o per procedure ristrette, della lettera di invito.


## RIEPILOGO GARE PUBBLICATE

ANNO	SANITA'		REGIONE		ALTRI ENTI	
	N. GARE	BASE D'ASTA €	N. GARE	BASE D'ASTA €	N. GARE	BASE D'ASTA €
2015	2	314.341.464,54	4	41.414.378,15	0	0,00
2016	7	268.696.419,38	6	32.156.000,95	1	7.541.082,33
2017	22	513.128.947,81	11	11.910.595,23	2	8.277.150,00
2018	30	271.556.445,87	4	12.779.569,25	6	7.838.801,76
2019	22	971.991.538,59	8	9.630.830,00	12	98.205.540,00
2020	25	186.197.996,26	4	826.500,00	16	53.013.432,22
2021	16	295.422.156,51	5	2.974.575,00	12	17.567.225,53
2022	13	133.138.621,10	3	1.818.054,46	12	62.261.668,21
2023	20	458.631.457,42	8	853.713.544,86	12	38.974.913,91
	<b>157</b>	<b>3.413.105.047,48</b>	<b>53</b>	<b>967.224.047,90</b>	<b>73</b>	<b>293.679.813,96</b>

TOTALI	
N. GARE	BASE D'ASTA €
6	355.755.842,69
14	308.393.502,66
35	533.316.693,04
40	292.174.816,88
42	1.079.827.908,59
45	240.037.928,48
33	315.963.957,04
28	197.218.343,77
40	1.351.319.916,19
<b>283</b>	<b>4.674.008.909,34</b>

## GARE PUBBLICATE NEL PERIODO 2015-2023


NUMERO DI GARE SUDDIVISO PER ANNO E PER ENTE

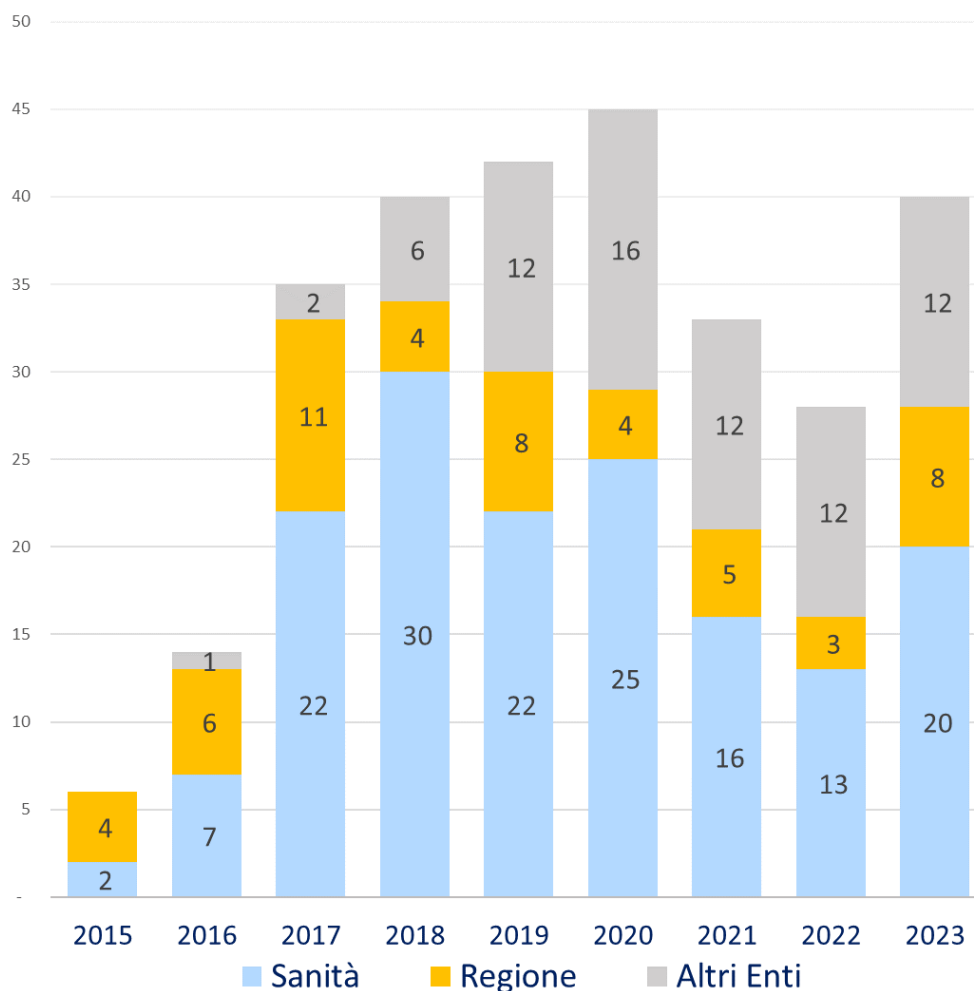

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Sanità	2	7	22	30	22	25	16	13	20	157
Regione	4	6	11	4	8	4	5	3	8	53
Altri Enti		1	2	6	12	16	12	12	12	73
Totale	6	14	35	40	42	45	33	28	40	283

## GARE PUBBLICATE NEL PERIODO 2015-2023

IMPORTI A BASE D'ASTA IN EURO, SUDDIVISI PER ANNO E PER ENTE

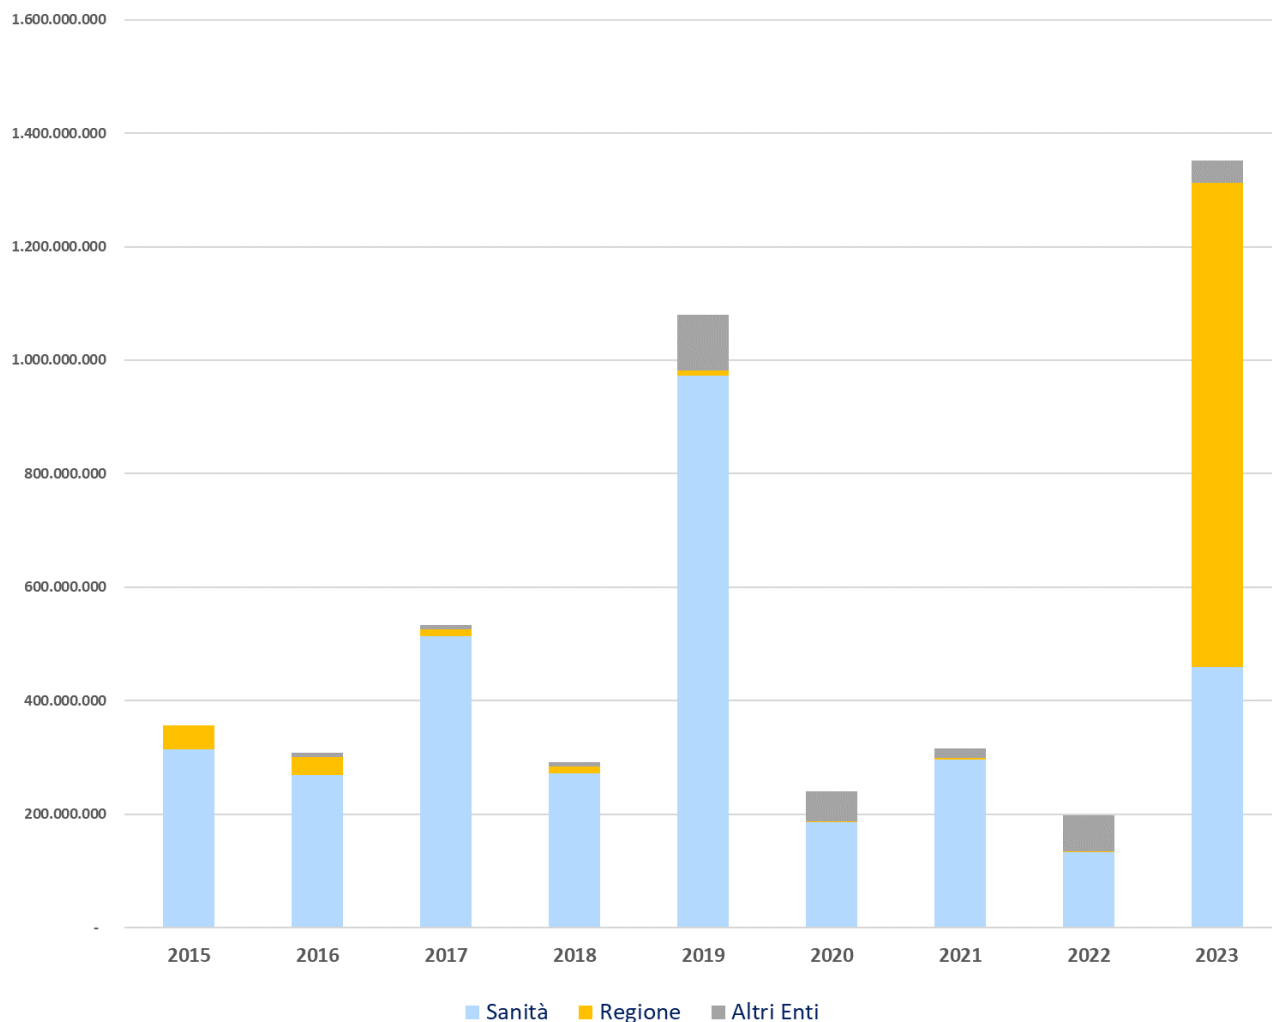


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Sanità	314.341.465	268.696.419	513.128.948	271.556.446	971.991.539	186.197.996	295.422.156	133.138.621	458.631.457	<b>3.413.105.047</b>
Regione	41.414.378	32.156.001	11.910.595	12.779.569	9.630.830	826.500	2.974.575	1.818.054	853.713.545	<b>967.224.048</b>
Altri Enti		7.541.082	8.277.150	7.838.802	98.205.540	53.013.432	17.567.226	62.261.668	38.974.914	<b>293.679.814</b>
Totale	<b>355.755.843</b>	<b>308.393.503</b>	<b>533.316.693</b>	<b>292.174.817</b>	<b>1.079.827.909</b>	<b>240.037.928</b>	<b>315.963.957</b>	<b>197.218.344</b>	<b>1.351.319.916</b>	<b>4.674.008.909</b>




## GARE PUBBLICATE NEL PERIODO 2015-2023

Distribuzione in percentuale tra gli Enti per numero di gare

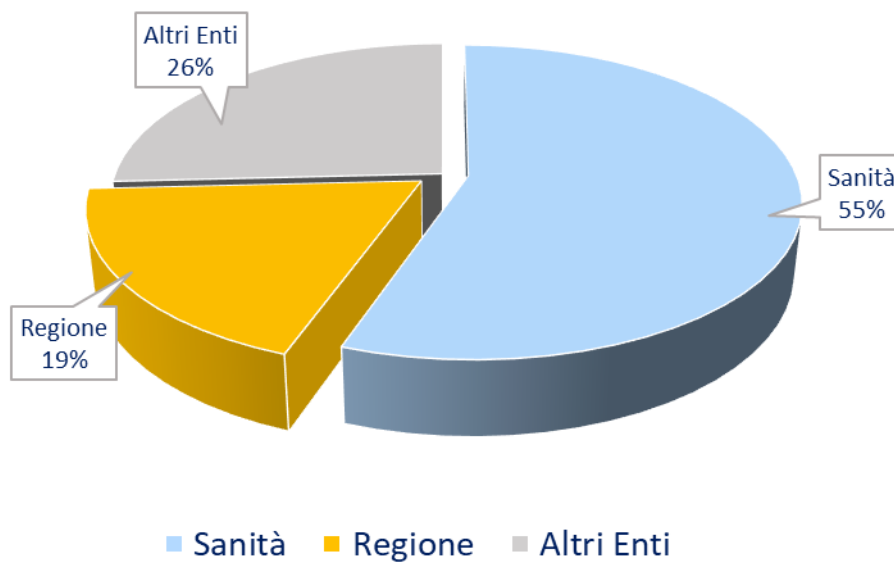


Distribuzione in percentuale tra gli Enti per importi

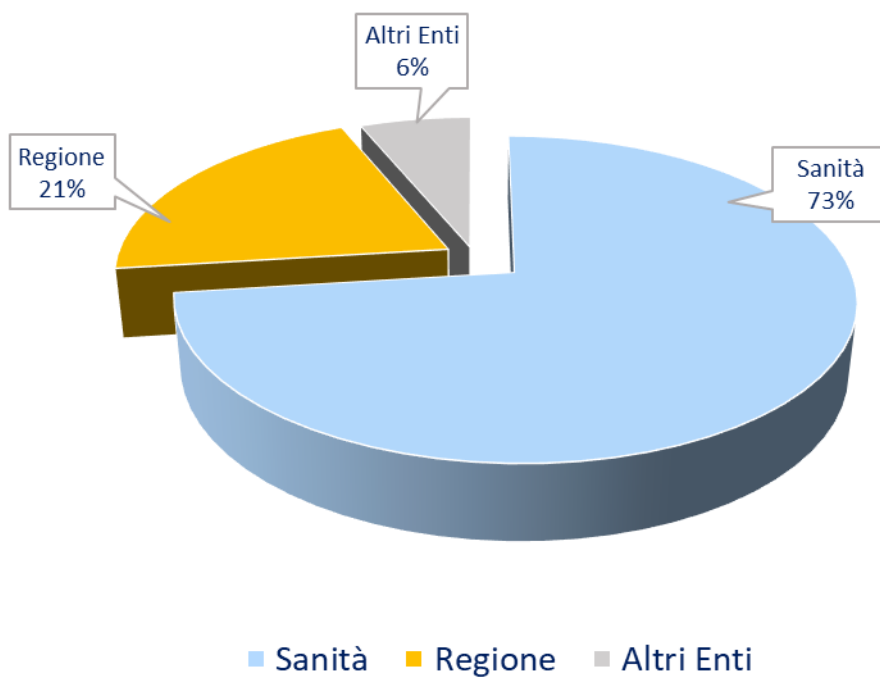

## GARE PUBBLICATE NEL 2023


	numero gare	importi per Enti
Sanità	20	458.631.457,42 €
Regione	8	853.713.544,86 €
Altri Enti	12	38.974.913,91 €
<b>TOTALI</b>	<b>40</b>	<b>1.351.319.916,19 €</b>

Distribuzione in percentuale tra gli Enti per numero di gare

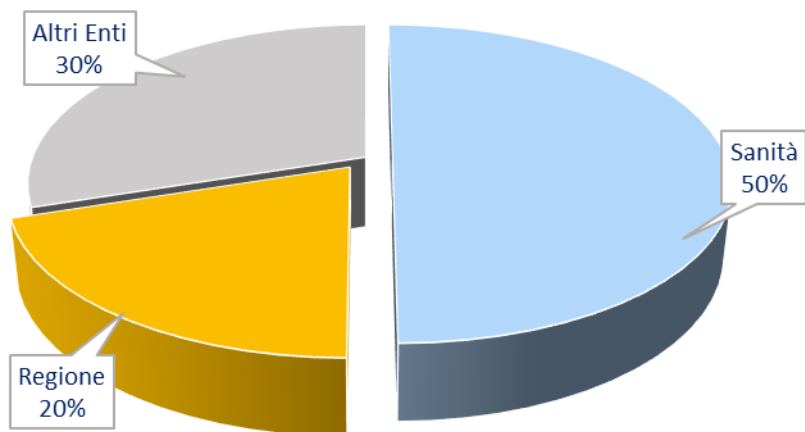

■ Sanità ■ Regione ■ Altri Enti

Distribuzione in percentuale tra gli Enti per importi

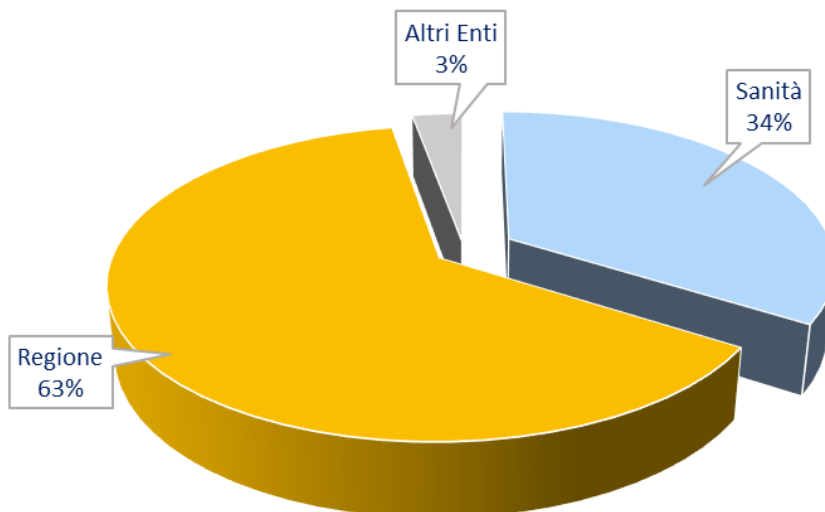


■ Sanità ■ Regione ■ Altri Enti

## NUMERO DI GARE PUBBLICATE NEL PERIODO 2015-2023

### CONCLUSE E AGGIUDICATE


(DATO AGGIORNATO AL 29/02/2024)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALI
<b>pubblicate</b>	6	14	35	40	42	45	33	28	40	283
<b>aggiudicate</b>	5	14	33	38	36	41	33	24	26	250
<b>annulate/revocate</b>	1			1	1	1			1	5
<b>sospese</b>			1							1
<b>deserte/infruttuose</b>			1	1	5	3		4	1	15
<b>in corso di espletamento</b>									12	12

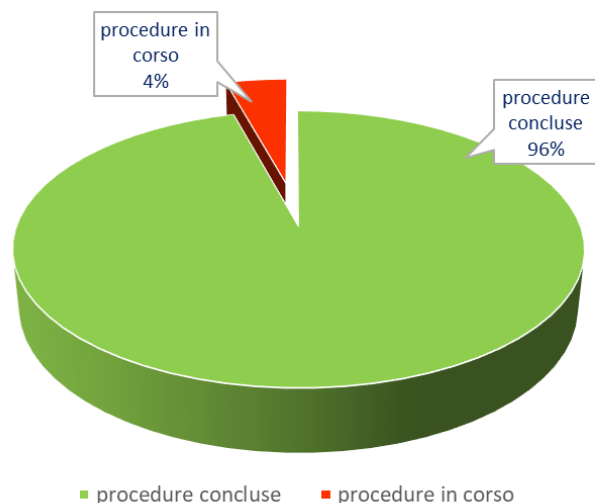

Delle 283 procedure di gara pubblicate nel periodo 2015-2023 ne risultano concluse 271 (ovvero il 96%), di cui 250 aggiudicate (ovvero l'88%).




(DATO AGGIORNATO AL 29/02/2024)

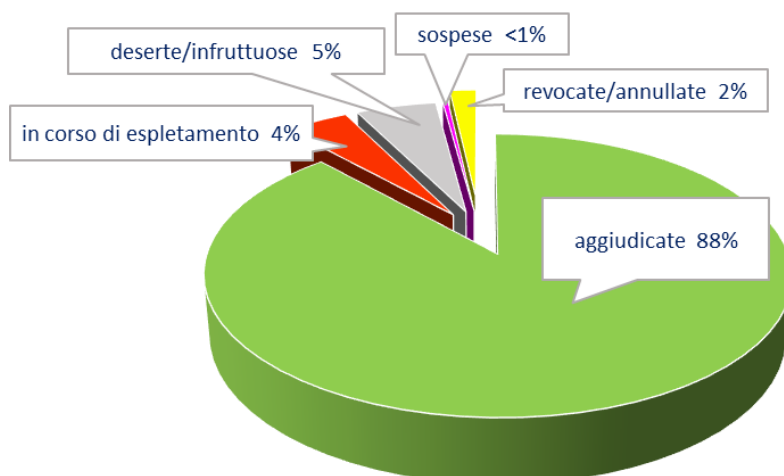

## PERCENTUALE DI GARE AGGIUDICATE RISPETTO A QUELLE PUBBLICATE NEL PERIODO 2015-2023, DISTINTE PER ENTE

(DATO AGGIORNATO AL 29/02/2024)

	Sanità	Regione	Altri Enti	Totale
Pubblicate	157	53	73	283
Aggiudicate	140	45	65	250

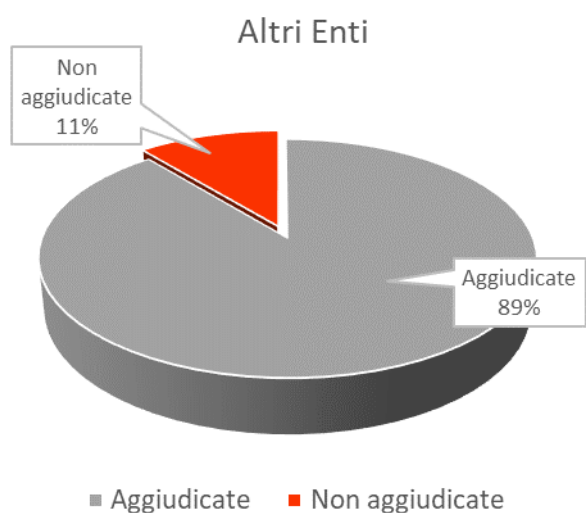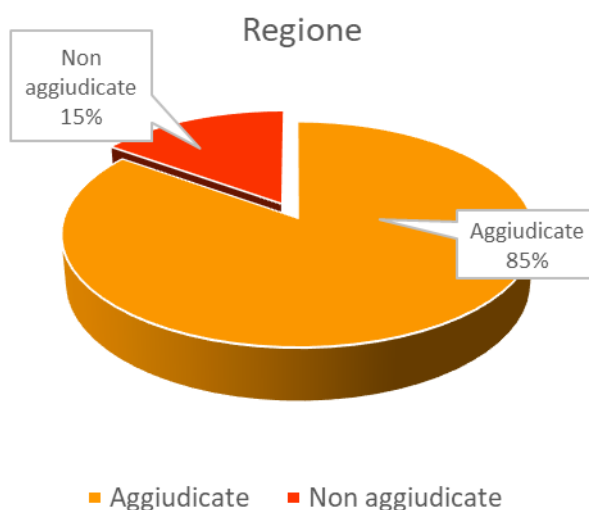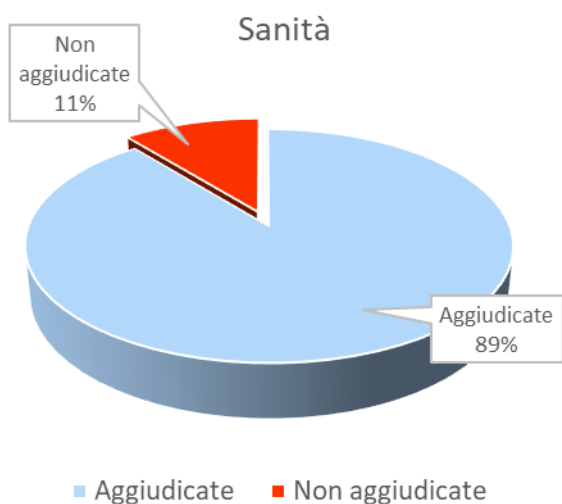


## PERCENTUALE DI GARE CONCLUSE RISPETTO A QUELLE PUBBLICATE NEL PERIODO 2015-2023, DISTINTE PER ENTE

(DATO AGGIORNATO AL 29/02/2024)


	Sanità	Regione	Altri Enti	Totale
Pubblicate	157	53	73	283
Concluse	151	48	72	271
<i>In corso</i>	6	5	1	12

Sanità

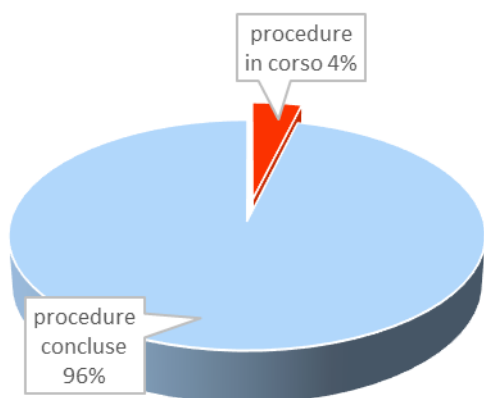


■ procedure in corso   ■ procedure concluse

Regione

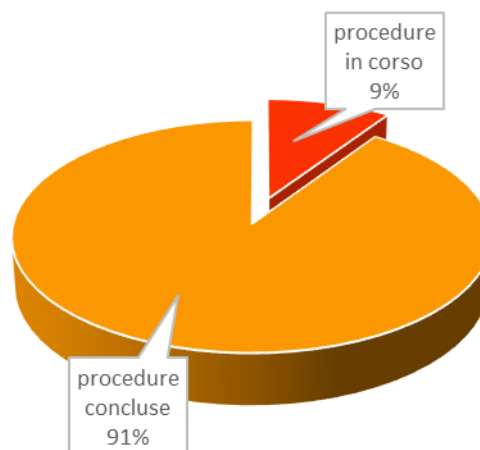

■ procedure in corso   ■ procedure concluse

Altri Enti

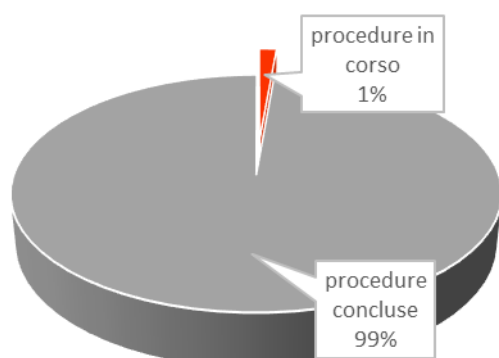

■ procedure in corso   ■ procedure concluse

*Seguono Tabelle con le gare pubblicate nell'annualità 2023*

## GARE PUBBLICATE - ANNO 2023

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
1	SERVIZIO PORTIERATO AG. LUCANA DI SVILUPPO AGRICOLTURA (MT)	G00374	8889731	11/01/2023	conclusa	Aggiudicata	-29,87%	288.615,71				288.615,71
2	GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI DELLE AZIENDE DEL SSR	G00375	8893742	16/01/2023	conclusa	Aggiudicata	-11,66%	4.806.165,00		4.806.165,00		
3	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO SIRFO REGIONE BASILICATA	G00377	8906356	25/01/2023	conclusa	Aggiudicata	-32,50%	406.500,00			406.500,00	
4	FORNITURA RADIOFARMACI - DISP. - APPARECCHIATURE - MEDICINA NUCLEARE	G00368	8699944	28/01/2023	conclusa	Aggiudicata	-22,61%	35.923.743,60		35.923.743,60		
5	CONDUZIONE, MANUTENZIONE, RIFIUTI IMPIANTI DEPURAZ	G00378	8916233	03/02/2023	conclusa	Aggiudicata	-23,33%	2.570.585,41				2.570.585,41
6	SISTEMI DI INFUSIONE AOR SAN CARLO DI POTENZA E ASM (QUINQUENNALE)	G00381	8960693	24/02/2023	conclusa	Aggiudicata	-3,83%	5.539.238,00		5.539.238,00		
7	ADEGUAMENTO MIGLIORATIVO DEI CANALI IRRIGUI CONSORTILI	G00382	8961586	27/02/2023	conclusa	Aggiudicata	-20,31%	15.751.651,56				15.751.651,56
8	LAVORI ADDUTTORE MISSANELLO	G00383	8960218	27/02/2023	conclusa	Aggiudicata	-24,63%	6.003.338,26				6.003.338,26
9	ELETTROPOMPE PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IDRICO: "PIETRASSASSO" A CASTELLUCCIO INFERIORE (PZ) E "AGGIA" A PATERNO (PZ)	G00384	8930807	13/03/2023	conclusa	Aggiudicata	-13,40%	2.580.000,00				2.580.000,00
10	PRODOTTI FARMACEUTICI -AZIENDE SSR - EDIZIONE N. 6	G00376	8906718	16/03/2023	conclusa	Aggiudicata	-19,88%	297.858.784,86		297.858.784,86		
11	ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	G00386	8969333	22/03/2023	conclusa	Aggiudicata	-13,69%	861.308,10				861.308,10
12	LAVORI E PROGETTAZIONE - "2° PADIGLIONE DELL'EX OSPEDALE CIVILE DI MATERA PER STUDENTI UNIVERSITARI" -	G00387	9014226	29/03/2023	conclusa	Aggiudicata	-14,95%	10.649.386,20		10.649.386,20		
13	SISTEMA PET/CT WHOLE BODY -UOC DI MEDICINA NUCLEARE DELL'IRCCS CROB DI RIONERO	G00388	9035002	07/04/2023	conclusa	Deserta/revocata		2.692.916,00	Un lotto deserto un lotto revocato	2.692.916,00		
14	ORGANIZZAZIONE E REVISIONE CONTABILE DEI BILANCI DI ESERCIZIO 2022-2023-2024 DELLE ASS DELLA BASILICATA	G00380	8969453	14/04/2023	conclusa	Aggiudicata	-25,16%	861.308,16				861.308,16

## GARE PUBBLICATE - ANNO 2023

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
15	DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO IN CONTINUO DEL GLUCOSIO, DEI SISTEMI DI INFUSIONE DELL'INSULINA	G00389	9073050	05/05/2023	conclusa	Aggiudicata	-2,98%	42.864.138,66		42.864.138,66		
16	IMBUSTAMENTO, RECAPITO FATTURE E COMUNICAZIONI AI CLIENTI DI ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	G00393	9118204	01/06/2023	conclusa	Aggiudicata	-1,57%	2.653.251,20				2.653.251,20
17	AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA PHENOLAB - AGROBIOS ALSIA	G00394	9138659	13/06/2023	conclusa	Aggiudicata	-7,11%	1.676.800,00				1.676.800,00
18	SISTEMA DI CHIRURGIA ROBOTICA - IRCCS CROB DI RIONERO IN VULTURE	G00395	9139351	13/06/2023	conclusa	Aggiudicata	-8,52%	2.533.889,00		2.533.889,00		
19	PROGETTAZIONE INTEGRATA TRASFERIMENTO DELLA RISORSA IDRICA AD USO IRRIGUO	G00396	9137351	14/06/2023	conclusa	Aggiudicata	-12,70%	1.391.104,00				1.391.104,00
20	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO - FRAZIONI DI ATELLA E RIONERO IN VULTURE	G00392	9157569	21/06/2023	conclusa	Aggiudicata	-22,76%	3.776.876,03				3.776.876,03
21	SISTEMA DI SEQUENZIAMENTO SU TECNOLOGIA NGS (NEXT GENERATION SEQUENCING) E FORNITURA DI PANNELLI -IRCCS CROB DI RIONERO.	G00399	9160897	21/06/2023	conclusa	Aggiudicata	-0,11%	274.638,00		274.638,00		
22	SERVIZI INTEGRATI GESTIONE EMERGENZA SUS SCROFA	G00398	9162380	23/06/2023	conclusa	Infruttuosa		1.663.343,17			1.663.343,17	
23	SISTEMA ROBOTICO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA PER IL P.O. DI POTENZA	G00390	9104774	26/06/2023	conclusa	Aggiudicata	-8,00%	2.000.000,00		2.000.000,00		
24	ACCELERATORE LINEARE E SISTEMI PER RADIOTERAPIA (SGRT E DOSIMETRIA) - UOC DI RADIOTERAPIA DELL'IRCCS CROB DI RIONERO.	G00400	9179737	29/06/2023	conclusa	Aggiudicata	-0,66%	2.651.359,52		2.651.359,52		
25	REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER LE CURE PALLIATIVE-HOSPICE- OSPEDALE SAN CARLO DI POTENZA	G00401	9184049	30/06/2023	conclusa	Aggiudicata	-8,64%	7.567.743,96		7.567.743,96		
26	REAGENTI E SISTEMA DIAGNOSTICO PER TIPIZZAZIONE HLA E RICERCA ANTICORPI ANTI-HLA	G00402	9180071	30/06/2023	conclusa	Apertura Busta C (lotti 1,2,3) 22 dicembre 2023		1.855.000,00	Aggiudicati i lotti 4,5,6 e 7. Per i lotti 1,2,3 è in corso l'aggiudicazione	1.855.000,00		
27	VACCINI ANTINFLUENZALI CAMPAGNA 2023/2024 - AZIENDE DEL SSR NELL'AMBITO DEL SDAPA	G00404	9298518	06/09/2023	conclusa	Aggiudicata	-0,24%	1.732.600,00		1.732.600,00		

## GARE PUBBLICATE - ANNO 2023

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
28	FORNITURA DI MEZZI PER LA COLONNA MOBILE ENTI LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE BASILICATA	G00405	9328920	25/09/2023	conclusa	Aggiudicata	-11,85%	702.044,10			702.044,10	
29	FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E AUSILIO OPERATIVO DELL'AOR SAN CARLO	G00406	9364347	13/10/2023	12/12/2023	In corso di valutazione offerte tecniche		13.261.360,90		13.261.360,90		
30	FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SISTEMA TRASFUSIONALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	G00408	9377632	20/10/2023	30/11/2023	In corso di valutazione offerte tecniche		3.417.100,00		3.417.100,00		
31	FORNITURA DI CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E STAMPATI PER LE AZIENDE DEL SSR E PER LA GIUNTA DELLA REGIONE BASILICATA	G00410	9375319	20/10/2023		Apertura Busta C 15 gennaio 2024		13.152.098,32	aggiudicati i lotti 1 e 4 per gli altri è in corso l'aggiudicazione	13.152.098,32	convenzione (in base al fabbisogno)	
32	VACCINI OBBLIGATORI E RACCOMANDATI - ANNUALITÀ 2023/24 IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE DEL SSR ( SDAPA)	G00409	9371498	13/11/2023	conclusa	Aggiudicata	-8,24%	6.396.245,40		6.396.245,40		
33	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TPL GOMMA REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE DI COMPETENZA DELLA REGIONE BASILICATA	G00412	9416219	14/11/2023	13/05/2024	In corso		844.547.175,81			844.547.175,81	
34	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTARIO CARTACEO DELLA REGIONE BASILICATA	G00411	9399757	17/11/2023	28/12/2023	Apertura Busta C 26 febbraio 2024		3.220.019,77			3.220.019,77	
35	ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA, IN AMBITO STRUTTURALE, GEOTECNICO, GEOLOGICO E PROCEDURALE IN MATERIA DI CONTROLLO E VIGILANZA PER L'OSSERVANZA DELLE NORME SISMICHE - PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN REGIONE BASILICATA.	G00413	9433282	22/11/2023	08/01/2024	Apertura Busta C 27 febbraio 2024		352.836,00			352.836,00	



## GARE PUBBLICATE - ANNO 2023

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
36	SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA CAUSATA DALL'ECESSIVO NUMERO DELLA SPECIE CINGHIALE (SUS SCROFA)	G00414	9469178	06/12/2023	22/01/2024	Apertura Busta C 29 febbraio 2024		1.657.426,01			1.657.426,01	
37	SERVIZI ASSICURATIVI DELLE AZIENDE DEL SSR DI BASILICATA RAMI DIVERSI DALLA RCT/RCO	G00407	9382431	13/12/2023	05/03/2024	In corso		2.493.000,00		2.493.000,00		
38	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA	G00415	9482873	21/12/2023	12/03/2024	In corso		560.075,48				560.075,48
39	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO FORMATIVO SULLE INFEZIONI OSPEDALIERE. MISSIONE 6 DEL PNRR	G00416	9500733	22/12/2023	29/01/2024	In corso		962.050,00		962.050,00		
40	SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO DELLA REGIONE BASILICATA (SIA-RB)	G00417	9513987	30/12/2023	23/02/2024	In corso		1.164.200,00			1.164.200,00	
<b>TOTALE 2023</b>								<b>1.351.319.916,19</b>		<b>458.631.457,42</b>	<b>853.713.544,86</b>	<b>38.974.913,91</b>
										<b>20</b>	<b>8</b>	<b>12</b>

Gare concluse/annulate/revocate

Gare aggiudicate nel corso dell'anno 2023

Gare aggiudicate nel corso dell'anno 2024 (dato aggiornato al 29/02/2024)

## 5. Soggetto Aggregatore

La Direzione Generale Stazione Unica Appaltante, in quanto Centrale di Committenza regionale per la Regione Basilicata, è tra i soggetti aggregatori individuati dall'ANAC nell'elenco istituito con Delibera n.58 del 22 luglio 2015, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 24/04/2014 n.66 che ha previsto l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti operante presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3, del citato decreto, con DPCM 24 dicembre 2015 sono state individuate le categorie merceologiche di beni e servizi nonché "le soglie di obbligatorietà" al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche sono tenute a ricorrere ai soggetti aggregatori previsti dall'art. 9, tra i quali appunto rientra la Direzione Generale Stazione Unica Appaltante per la Regione Basilicata.

Il richiamato DPCM ha individuato n.19 categorie merceologiche che con il DPCM 11.07.2018 sono state portate a 25. Attualmente, in sede di confronto nell'ambito del Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e di cui fa parte anche la Direzione generale della SUA-RB, si sta esaminando la possibilità di inserimento di ulteriori categorie merceologiche.

Nell'anno 2023 la SUA-RB ha garantito, come di consueto, la propria partecipazione ai Tavoli tecnici dei Soggetti Aggregatori nell'ambito dell'attività di disamina delle principali tematiche comuni.

Anche per l'anno 2023 il Ministero dell'Economia e Finanze ha riconosciuto alla SUA-RB, con riferimento all'annualità 2022, l'importo di € 320.570,97 nell'ambito del riparto del Fondo annuale dedicato ai Soggetti Aggregatori e sulla base dei criteri stabiliti nel Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2022.

Analogamente, la Direzione Generale della SUA-RB ha presentato, in data 31/01/2024, istanza di accesso al fondo per l'annualità 2023, sulla base dei criteri stabiliti nel DM 11 dicembre 2023, essendo in possesso dei requisiti previsti.

In ordine alle attività della SUA-RB in qualità di Soggetto Aggregatore, una completa e puntuale descrizione, con indicazione sullo stato delle singole procedure di gara, è rinvenibile sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) nell'apposita sezione dedicata ai Soggetti Aggregatori:

[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/Soggetti\\_Aggregatori\\_nuovo\\_portale/home.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/Soggetti_Aggregatori_nuovo_portale/home.html)

## 6. Contenzioso


### *Giudizi introdotti nel 2023- esiti*

Nel corso del 2023 sono state introdotte 19 controversie aventi ad oggetto gare della SUA-RB, 5 delle quali attinenti a gare pubblicate nel corso del medesimo anno e 14 riferite a gare pubblicate in anni antecedenti.

Dei 19, solo 3 dei contenziosi sono ancora in corso, mentre gli altri 16 sono stati definiti con sentenza o altro provvedimento.

In sintesi:


- 15 con esito totalmente favorevole alla Regione;
- 1 parzialmente sfavorevole;
- 3 giudizi non conclusi.

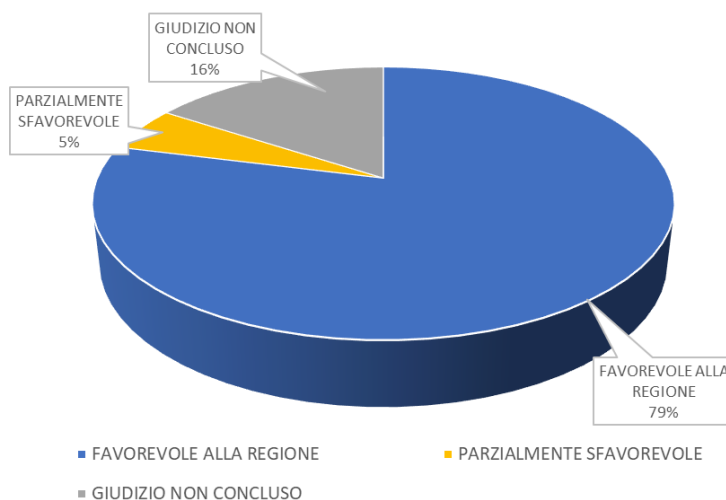

### *Giudizi introdotti ante 2023: esiti*

**Nel corso del 2023 sono stati definiti ulteriori 5 giudizi introdotti negli anni precedenti:**

- 3 con esito favorevole alla Regione;
- 2 con esito sfavorevole.




### *Giudizi definiti nel 2023*

Si evidenzia dunque che su 40 gare pubblicate nel corso del 2023 alla data del 29.02.2024 solo 3 sono state oggetto di impugnativa (dei 5 contenziosi citati nell'introduzione 3 riguardano la stessa gara). 3 giudizi si sono conclusi con esito favorevole alla regione, mentre due sono ancora in corso.

**Nel complesso nel corso del 2023 si sono definiti 15 giudizi di cui:**

- 12 ovvero oltre l'80 % - con esito pienamente favorevole alla Regione,
- 2 ovvero il 13% - con esito sfavorevole;
- 1 ovvero circa il 7% - con esito diversi.



## 7. Piano delle attività 2024

Allo scopo di pianificare le attività della SUA-RB per l'anno 2024, come di consueto, è stato richiesto a tutti i Soggetti obbligati di fornire indicazioni in merito alle procedure di gara da loro programmate per il 2024 e che, secondo il vigente quadro normativo nazionale e regionale, sono di competenza della SUA-RB.

Gli estremi delle richieste e dei relativi riscontri pervenuti dagli Enti aderenti sono riepilogati nella prima delle tabelle che seguono.

A seguire è riportato il piano delle gare per l'anno 2024, suddiviso per Enti (Aziende del Servizio Sanitario Regionale, Regione Basilicata, Altri Enti), e per tipologia di oggetto della procedura di gara (servizi/forniture o lavori).

Complessivamente, per il 2024, risultano pianificate n. 97 nuove procedure di gara di cui:

- n. 33 per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per appalti di servizi e forniture;
- n. 26 per gli Uffici Regionali (di cui n. 21 per appalti di servizi e forniture e 5 per appalti di lavori);
- n. 38 per gli altri Enti (di cui n. 22 per appalti di servizi e forniture e n. 16 per appalti di lavori).

La programmazione delle gare per servizi e forniture di interesse sanitario è stata approvata nella Conferenza di Servizi convocata dalla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona e tenutasi alla presenza dei rappresentanti delle diverse Aziende sanitarie interessate, nonché dei rappresentanti della SUA-RB e della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona, presso gli Uffici della suddetta Direzione Generale, in data 20/02/2024.

La Conferenza di Servizi si è conclusa con l'approvazione dei seguenti documenti:

- 1) "Piano Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per l'anno 2024" (riportato nelle schede che seguono);
- 2) Aggiornamento ai "Piani gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2023" (riportato nell'allegato 2 alla presente relazione).

Si precisa inoltre che si è ritenuto utile riportare, nell'ambito delle gare programmate per l'anno 2024, anche quelle già pianificate negli anni precedenti, laddove le stesse, mai avviate, siano state nuovamente indicate dagli Enti Committenti in riscontro alla richiesta relativa all'anno 2024.

Pertanto, nelle tabelle che seguono, nella colonna "Id Programmazione" viene indicato l'anno di primo inserimento nella pianificazione della gara in oggetto, seguito da un codice che contraddistingue l'Ente Committente (*i codici degli Enti Committenti sono riportati nella prima pagina di riepilogo*), nonché il numero d'ordine assegnato in occasione della prima pianificazione.

Inoltre, nell'**ALLEGATO 2**, con riferimento alle gare di interesse sanitario, si riporta l'aggiornamento delle gare già programmate fin dal 2015, allo scopo di rendere noto lo stato dei

procedimenti e gli impegni assunti dalle Aziende Sanitarie in relazione a tali gare, nel corso della citata Conferenza di Servizi tenutasi in data 20/02/2024.

## RIEPILOGO RICHIESTE E RELATIVI RISCONTRI

Destinatario	Codice Id Programmazione	Riscontro (prot e data/altro)	NOTE
Richiesta inviata alle AZIENDE SSR da parte della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della persona - prot. 0031919/13BA del 13/02/2024			
Aziende Sanitarie Regionali	AA_SSR	Verbale della Conferenza di Servizi del 20/02/2024	Nel corso della Conferenza di Servizi convocata dalla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona, tenutasi in presenza, presso la stessa D.G., in data 20/02/2024, sono stati approvati: 1) "Piano Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per l'anno 2024"; 2) Aggiornamento ai "Piani gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2023" .
Richiesta inviata alle DIREZIONI GENERALI della Regione Basilicata - prot.0235005/20BA del 13/11/2023			
D.G. Consiglio Regionale	RB_CR_	Prot. N. 0267081/20BA del 18/12/2023	
D.G. Risorse umane, Organizzazione e Affari generali	RB_ROA	Prot. N. 0268780/11BA del 19/12/2023	Dal riscontro si evince che non ci sono gare di competenza SUARB
D.G. per la Program. e la Gestione delle risorse strumentali e finanziarie	RB_PRO	Prot. N. 0016006/12BA del 23/01/2024	
D.G. dell'Ambiente, del territorio ed Energia	RB_AMB	Prot. N. 0261566/23AH del 12/12/2023	
D.G. Infrastrutture e Mobilità	RB_INF	Prot. N. 0025618/24BA del 05/02/2024	
D.G. per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla comunità	RB_SLS	Prot. N. 0237502/15BA del 15/11/2023	Con successiva mail del 20/12/2023 la DG comunica che la gara di loro interesse sarà espletata tramite CONSIP.
D.G. per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	RB_AGR	Prot. N. 0264492/14BA del 14/12/2023	
D.G. per la Salute e le Politiche della persona	RB_SAN	Prot. N. 0265384/13BA del 15/12/2023	
Uffici Speciali	RB_UFS	Protezione civile: Prot. N. 0276146/20BA del 29/12/2023	
Richiesta inviata ad ALTRI ENTI - prot. 0234817/20BA del 13/11/2023			
A.L.S.I.A	ALSIA_	Prot.n. 0002821/20BA del 04/01/2024	
A.P.T.	APT_	nessun riscontro	
A.R.D.S.U.	ARDSU_	Prot. N. 0244712/20BA del 24/11/2023	
A.R.P.A.B.	ARPAB_	Prot. N. 0005514/20BA del 09/01/2024	
Ente Parco Regionale Chiese Rupestri	PR_CHR	nessun riscontro	
Ente Parco Regionale di Gallipoli Cognato	PR_GAC	nessun riscontro	
Ente Parco Regionale del Vulture	PR_VUL	nessun riscontro	
ATER Potenza	ATERPZ	Prot. n. 0008127/20BA del 12/01/2024	
ATER Matera	ATERMT	Prot. n. 0248316/20BA del 28/11/2023; Prot. n. 0269720/20BA del 20/12/2023	
E.G.R.I.B.	EGRIB_	nessun riscontro	
Acquedotto Lucano S.p.A.	ACQ_LU	nessun riscontro	Non c'è stato alcun riscontro da parte dell'Ente in merito alla programmazione 2024. Viene però riportata una gara il cui progetto è stato trasmesso dal Responsabile Area Appalti con nota acquisita al Prot. 0042187 /20BA del 26/02/2024.
S.E.L. - S.p.A.	SEL_	Prot. N. 0241589/20BA del 21/11/2024	
Sviluppo Basilicata S.p.A.	SV_BAS	nessun riscontro	
Consorzio di Bonifica della Basilicata	C_BONI	Prot. N. 0274329/20BA del 27/12/2023 Prot. N. 0020660/20BA del 30/01/2024	
Api-Bas S.p.A.	APIBAS	nessun riscontro	
Consorzio ASI Matera	ASI_MT	nessun riscontro	
A.R.L.A.B.	ARLAB_	Prot. N. 0023577/20BA del 01/02/2024	

### Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali - Piano gare Servizi e Forniture - ANNO 2024

N	Id Programmazione	Denominazione gara	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Scadenza contratti attuali	Data consegna Document. Tecnica	Note
1	2024_AA_SSR_SF_01	Service sistema diagnostico in microbiologia	ASP - ASM	ASM	Dr.ssa Nicoletta Nuzzolese	€ 416.666,67	3	€ 1.250.000,00	Giugno 2024	31/03/2024	Bilancio aziendale
2	2024_AA_SSR_SF_02	Fornitura di TNT	ASP - ASM - S.CARLO - CROB	S.CARLO	Dr.ssa Enza Vomero	€ 1.780.000,00	5	€ 8.900.000,00	Giugno 2024	31/03/2024	Bilancio aziendale
3	2024_AA_SSR_SF_03	Farmaci ed. 8 (2024)	ASP - ASM - S.CARLO - CROB	CROB	Dr.ssa Rosa Le Rose	€ 25.000.000,00	3	€ 75.000.000,00	Gara annuale	30/09/2024	Bilancio aziendale
4	2024_AA_SSR_SF_04	Vaccini antinfluenzali (2024)	ASP - ASM	ASP	Dr. Michele De Lisa	€ 1.717.350,00	1	€ 1.717.350,00	Gara annuale	30/05/2024	Bilancio aziendale
5	2024_AA_SSR_SF_05	Vaccini obbligatori e raccomandati (2024)	ASP - ASM	ASP	Dr. Michele De Lisa	€ 4.451.500,00	2	€ 8.903.000,00	Gara annuale	30/06/2024	Bilancio aziendale
6	2024_AA_SSR_SF_06	Prodotti dietetici (Nutrizione clinica)	ASP - ASM - S.CARLO	ASP	Dr.ssa Tiziana Sabato	€ 2.300.000,00	3	€ 6.900.000,00	12/08/2025	30/09/2024	Bilancio aziendale
7	2024_AA_SSR_SF_07	Suturatrici (II ed.)	ASM - S.CARLO - CROB	S.CARLO	Dr. Del Vecchio	7.000.000,00 €	3	€ 21.000.000,00	30/09/2025	30/09/2024	Bilancio aziendale
8	2024_AA_SSR_SF_08	Fili di sutura (II ed.)	ASM - S.CARLO - CROB	S.CARLO	Dr. Del Vecchio	€ 1.500.000,00	3+2	€ 7.500.000,00	30/09/2025	30/09/2024	Bilancio aziendale
9	2024_AA_SSR_SF_09	Licenze server per ampliamento ambiente di virtualizzazione Vmware e Microsoft Windows Server Datacenter per sistema business continuity centrale	AOR San Carlo	AOR San Carlo	Ing. P. P. Galli	€ 170.000,00	3	€ 240.000,00	2024	01/06/2024	Bilancio aziendale
10	2024_AA_SSR_SF_10	Attrezzature informatiche	AOR San Carlo	AOR San Carlo	Ing. P. P. Galli	€ 100.000,00	3	€ 300.000,00	2023	01/06/2024	Bilancio aziendale
11	2024_AA_SSR_SF_11	Licenze Server per supporto e manutenzione data center centrali e periferici	AOR San Carlo	AOR San Carlo	Ing. P. P. Galli	€ 150.000,00	3	€ 450.000,00	2024	01/06/2024	Bilancio aziendale
12	2024_AA_SSR_SF_12	Adeguamento e aggiornamento per la sicurezza informatica (II. Edizione)	AOR San Carlo	AOR San Carlo	Ing. P. P. Galli	€ 430.000,00	1	€ 430.000,00	2024	01/06/2024	Bilancio aziendale
13	2024_AA_SSR_SF_13	Dispositivi medici per Radiologia interventistica	AOR San Carlo	AOR San Carlo	Dr. Chiumarulo	€ 1.400.000,00	3	€ 3.600.000,00	2024	31/03/2024	Bilancio aziendale
14	2024_AA_SSR_SF_14	Affidamento fornitura di un sistema PET/CT whole body (lotto 1) e fornitura un sistema SPECT/CT (lotto 2) da destinare all'UOC di medicina nucleare dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture, comprensiva di lavori accessori e servizi connessi	IRCCS CROB	IRCCS CROB	Ing. E. Arminio	n.a.	n.a.	€ 4.000.000,00	n.a.	31/03/2024	Finanziamento concesso con Determina dirigenziale Ufficio Internalizzazione, Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica n. 15BG.2022/D.01983 del 22/12/2022 - POC Basilicata 2014/2020
15	2024_AA_SSR_SF_15	Implementazione di un sistema di tumor tracking con utilizzo di TAC simulatore 4D dotato di laser mobili per applicazioni radioterapiche mediante definizione densitometrica su scale dei grigi del le variazioni dimensionali e strutturali e sistema di dosimetria in vivo nei trattamenti VMAT-IMRT attraverso rivelatori MOSFET portatili per verifiche inter e intra frazione"	IRCCS CROB	IRCCS CROB	Dr.ssa G. Lazzari	n.a.	n.a.	€ 700.000,00	n.a.	30/06/2024	Fondi Ministero della Salute Conto capitale IRCCS anni 2021-2023



## Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali - Piano gare Servizi e Forniture - ANNO 2024

N	Id Programmazione	Denominazione gara	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Scadenza contratti attuali	Data consegna Document. Tecnica	Note
16	2024_AA_SSR_SF_16	Sistema integrato audio/video per sale operatorie A e C del gruppo operatorio	IRCCS CROB	IRCCS CROB	Dr. C. Lequaglie	n.a.	n.a.	€ 300.000,00	n.a.	30/09/2024	Bilancio aziendale
17	2024_AA_SSR_SF_17	Sistema di tracking real-time del target con trasmettitore a RF	IRCCS CROB	IRCCS CROB	Dr.ssa G. Lazzari	n.a.	n.a.	€ 250.000,00	n.a.	30/09/2024	Bilancio aziendale
18	2024_AA_SSR_SF_18	Sistema di pianificazione piani radioterapici indipendente e compatibile con i LINAC presenti (3 contouring + 3 calcolo eventualmente modificabile)	IRCCS CROB	IRCCS CROB	Dr.ssa G. Lazzari	n.a.	n.a.	€ 400.000,00	n.a.	30/09/2024	Bilancio aziendale
19	2024_AA_SSR_SF_19	Aggiornamento ed integrazione strumentazione endoscopica con almeno 8 endoscopi sorgenti luminose e monitor con intelligenza artificiale. Gli strumenti devono essere compatibili OCN le colonne attualmente in servizio ovvero strumentazione Olympus	IRCCS CROB	IRCCS CROB	Dr. M. Ciuffi	n.a.	n.a.	€ 380.000,00	n.a.	30/09/2024	Bilancio aziendale
20	2024_AA_SSR_SF_20	Sistema di analisi di immagine costituito da hardware e software per la valutazione del danno causato da chemio e radioterapia a carico del DNA	IRCCS CROB	IRCCS CROB	Dr. A. Traficante	€ 160.000,00	3	€ 480.000,00	n.a.	30/09/2024	Bilancio aziendale
21	2024_AA_SSR_SF_21	Dispositivi per cardiologia ed emodinamica (ex ID 2019_08 e ID 2019_18)	S.CARLO	S.CARLO	Dr. E. Stabile	€ 3.100.000,00	5	€ 15.500.000,00	n.d.	30/04/2024	Bilancio aziendale
22	2024_AA_SSR_SF_22	Dispositivi medici (ex 2023_29) inclusiva di Aghi e Sirighe (ed. 2024)	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	S.CARLO	Dr.ssa Ravaioli	€ 9.370.000,00	5	€ 46.850.000,00	n.d.	30/04/2024	Bilancio aziendale
23	2024_AA_SSR_SF_23	Letti di degenza ospedalieri (ex 2020_21)	S.CARLO	S.CARLO	Dr.ssa P. Aloè	€ 609.000,00	1	€ 609.000,00	n.d.	30/04/2024	Varie fonti di finanziamento a seconda del Plesso
24	2024_AA_SSR_SF_24	Servizi di pulizia ed ausiliario (ex 2022_07 - 2022_16)	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	CROB	Dr.ssa S. Bisaccia	€ 17.500.000,00	5	€ 87.500.000,00	n.d.	31/05/2024	Bilancio aziendale
25	2024_AA_SSR_SF_25	Acquisto di n.50 monitor defibrillatori per le ambulanze del DEU-118 (ex 2023_13)	ASP	ASP	Arch. F. Cicale	€ 1.500.000,00	1	€ 1.500.000,00	n.d.	30/06/2024	Bilancio aziendale
26	2024_AA_SSR_SF_26	Accordo quadro gentica medica (ed. II)	ASM	ASM	Dr. Dell'Edera	€ 1.000.000,00	3+2	€ 5.000.000,00	Scorte esaurite	30/09/2024	Bilancio aziendale
27	2024_AA_SSR_SF_27	Colonna endoscopica con ecoendoscopio	ASM	ASM	Ing. Bengiovanni	€ 262.783,18	1	€ 262.783,18	n.a.	30/09/2024	L.160/2019 art. 1
28	2024_AA_SSR_SF_28	Portatili per radioscopio	ASM	ASM	Ing. Bengiovanni	€ 510.000,00	1	€ 510.000,00	n.a.	30/06/2024	L.160/2019 art. 1 e ADP MT
29	2024_AA_SSR_SF_29	Colonna chirurgica endoscopica (ICG - verde indocianina)	ASM	ASM	Ing. Bengiovanni	€ 320.000,00	1	€ 320.000,00	n.a.	30/09/2024	L.160/2019 art. 1
30	2024_AA_SSR_SF_30	Fornitura di 12 autoclavi occorrenti per varie UU.OO.	S.CARLO	S.CARLO	Dr.ssa P. Aloè	€ 517.500,00	1	€ 517.500,00	n.a.	23/01/2024	FSC Documentazione già consegnata
31	2024_AA_SSR_SF_31	Fornitura di materiale di consumo per n. 12 apparecchi per anestesia Draeger Perseus	S.CARLO	S.CARLO	Dr.ssa P. Aloè	€ 1.340.313,00	5	€ 6.701.565,00	n.a.	23/01/2024	Bilancio aziendale Documentazione già consegnata
32	2024_AA_SSR_SF_32	Servizio progettazione realizzazione manutenzione ed assistenza del nuovo sistema informatico di contabilità (ed. 2024)	ASM - S. CARLO - CROB	ASP	Dr. R. Dalia	€ 275.000,00	8	€ 2.200.000,00	mag-25	31/12/2024	Bilancio aziendale
33	2024_AA_SSR_SF_33	Servizi di Manutenzione e assistenza per il SW risorse umane	ASP - ASM - CROB	ASP	Dr. R. Dalia	€ 200.000,00	4	€ 800.000,00	ago-25	31/12/2024	Bilancio aziendale

Regione - Piano gare Servizi e Forniture - ANNO 2024

N.	Id Programmazione	Direzione Generale	Ufficio	OGGETTO DEL CONTRATTO (INDICARE ANCHE CPV)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (SE INDIVIDUATO)	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (INCLUSI ONERI SICUREZZA IVA ESCLUSA)	EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI N.	TRIMESTRE DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO (INDICATIVO)	DATA SCADENZA CONTRATTO IN ESSERE / PROROGA O NUOVA GARA	DURATA DEL CONTRATTO IN MESI	DATA PREVISTA PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZ. TECNICA	NOTE
1	2024_RB_CR_SF01	D.G. Consiglio Regionale	Ufficio Risorse Strumentali, Finanziarie e Tecnologiche	Servizio di Pulizia sedi di Potenza e Matera 90919200-4	Maria Antonietta Rossetti	€ 1.263.000,00	Lotto Unico	2°- 2024	Proroga fino al 31/05/2024	36	Già trasmessa	D.U.P. 202300075 del 12/12/2023
2	2024_RB_CR_SF02	D.G. Consiglio Regionale	Ufficio Risorse Strumentali, Finanziarie e Tecnologiche	Servizio di Vigilanza sede di Matera 98341140-8	Graziano Mignoli	€ 500.000,00	Lotto Unico	3°- 2024	31/05/2024	60	31/03/2024	D.U.P. 202300075 del 12/12/2024
1	2024_RB_AGR_SF_01	D. G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali	Autorità di Gestione PSR Basilicata e Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale	Servizi di Assistenza Tecnica per la programmazione, gestione, attuazione e monitoraggio degli interventi del PSN 2023-2027 di competenza della Regione Basilicata e per la chiusura del PSR Basilicata 2014-2022. CPV : 79411000 (servizi di consulenza gestionale).	dott. Nicola Rossi	€ 12.300.000,00	Lotto Unico	4°- 2024	15/10/2024	48+36	31/12/2023	
2	2024_RB_AGR_SF_02	D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali	Produzioni animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato (14BD)	Servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie-71356200-0-77500000-5	dott. Giorgio Rocco	€ 8.400.000,00	Lotto Unico		Nuova gara	24	31/12/2023	
1	2024_RB_UFS_SF_01	Uffici Speciali	Ufficio per la Protezione Civile	Implementazione, ottimizzazione del sistema di monitoraggio multirischio (Antincendio, Idro-meteopluvio, allertamento in tempo reale) della Protezione civile regionale e realizzazione della nuova piattaforma interoperabile per la integrazione dei dati di monitoraggio ai fini della gestione delle Sale operative quale supporto avanzato alle decisioni.		€ 6.700.000,00	NO	4°- 2024	Nuova gara	36	maggio 2024	

Regione - Piano gare Servizi e Forniture - ANNO 2024

N.	Id Programmazione	Direzione Generale	Ufficio	OGGETTO DEL CONTRATTO (INDICARE ANCHE CPV)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (SE INDIVIDUATO)	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (INCLUSI ONERI SICUREZZA IVA ESCLUSA)	EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI N.	TRIMESTRE DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO (INDICATIVO)	DATA SCADENZA CONTRATTO IN ESSERE / PROROGA O NUOVA GARA	DURATA DEL CONTRATTO IN MESI	DATA PREVISTA PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZ. TECNICA	NOTE
2	2024_RB_UFS_SF_02	Uffici Speciali	Ufficio per la Protezione Civile	Servizio aereo ad ala rotante di ricognizione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi in ambito di protezione civile integrato con attività di monitoraggio visivo e strumentale da effettuarsi con droni.		€ 1.100.000,00	NO	4° - 2024	Nuova gara	36	maggio 2024	
1	2024_RB_SAN_SF_01	D.G. per la Salute e le Politiche della persona	13BB - Ufficio Prevenzione sanità umana, veterinaria e sicurezza alimentare.	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione adeguata, migliorativa, correttiva ed evolutiva del Nodo Regionale delle Banche Dati dei Servizi Veterinari e del SIAN	dott. Gerardo Salvatore	€ 1.450.000,00	2	1° - 2024	14/02/2024	36+24	30/01/2024	
2	2024_RB_SAN_SF_02	D.G. per la Salute e le Politiche della persona	13BJ - Ufficio PNRR e Sanità Digitale	Servizio di realizzazione del fascicolo Sociale e integrazione del SISB Sistema Informativo Sociale Regionale della Basilicata		circa € 2.000.000,00 € 2.500.000,00	lotto unico	4° - 2024		36	30/06/2024	Possibile adesione a convenzione CONSIP
1	2024_RB_PRO_SF_01	D.G. per la Programmazione e la Gestione delle risorse strumentali e finanziarie		Servizio di consulenza e assistenza tecnica sui programmi ed interventi 2014-2020 di competenza regionale finanziati dai fondi F.E.S.R. - FSE +, e F.S.C.	dott. Alfonso Morvillo	€ 40.000,00	6 o 7	3° - 2024	21/10/2024	48 + proroga	31/03/2024	
2	2024_RB_PRO_SF_02	D.G. per la Programmazione e la Gestione delle risorse strumentali e finanziarie	Provveditorato e Patrimonio	Servizi di vigilanza e portierato degli uffici Regionali		<b>Lotto 1:</b> Immobili siti nel Comune di Potenza e Ufficio di Rappresentanza Roma € 11.358.879,34 <b>Lotto 2:</b> Immobili siti nel Comune di Matera € 2.031.535,65 <b>Lotto 3:</b> Comuni di Policoro, Lagonegro, Senise, Marsicovetere, Melfi, Sant' Arcangelo, Maratea . € 2.699.296,95	3		luglio 2025 per la sede di Matera il contratto scade a febbraio 2026 per la sede di Melfi a marzo 2026	36 mesi durata contratto. Rinnovo per ulteriori 36 mesi.	31/01/2024	

Regione - Piano gare Servizi e Forniture - ANNO 2024

N.	Id Programmazione	Direzione Generale	Ufficio	OGGETTO DEL CONTRATTO (INDICARE ANCHE CPV)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (SE INDIVIDUATO)	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (INCLUSI ONERI SICUREZZA IVA ESCLUSA)	EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI N.	TRIMESTRE DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO (INDICATIVO)	DATA SCADENZA CONTRATTO IN ESSERE / PROROGA O NUOVA GARA	DURATA DEL CONTRATTO IN MESI	DATA PREVISTA PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZ. TECNICA	NOTE
3	2024_RB_PRO_SF_03	D.G. per la Programmazione e la Gestione delle risorse strumentali e finanziarie	Provveditorato e Patrimonio	Servizio di pulizia degli uffici regionali sedi di Potenza e sedi decentrate		<p><b>Lotto 1:</b> Edifici siti in Potenza, Via Verrastro nn. 4, 8 e 10 e a Roma in Via Nizza n. 56)  <b>€ 1.737.437,82</b></p> <p><b>Lotto 2:</b> Edifici siti in Potenza, Via Verrastro n. 6 e C.so Garibaldi n. 139 e a Villa D'Agri  <b>€ 891.389,81</b></p> <p><b>Lotto 3 -</b> Edifici siti a Matera in Via Annibale M. Di Francia  <b>€ 459.020,06</b></p> <p>Lotto 4 - Edifici siti in Policoro e in Senise  <b>€ 136.558,14</b></p> <p><b>Lotto 5 -</b> Edifici siti in Melfi  <b>€ 48.963,83</b></p> <p><b>Lotto 6 -</b> Edifici siti Lagonegro  <b>€ 86.402,43</b></p>	6		giugno 2026	36 mesi durata contratto. Rinnovo per ulteriori 36 mesi.	31/12/2024	
4	2024_RB_PRO_SF_04	D.G. per la Programmazione e la Gestione delle risorse strumentali e finanziarie	Provveditorato e Patrimonio	Servizi assicurativi		€ 2.217.500,00	7		31/07/2024	30	30/12/2023	
1	2024_RB_INF_SF_01	Direzione Generale Infrastrutture e mobilità	Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile	Implementazione Sistema di Bigliettazione Elettronica		€ 10.000.000,00	NO	4°- 2024		*		Intervento candidato al finanziamento nell'ambito della nuova programmazione FSC. *Ancora non redatto un cronoprogramma di attuazione dell'intervento
2	2024_RB_INF_SF_02	Direzione Generale Infrastrutture e mobilità	Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile	Progettazione, implementazione e gestione del Sistema Regionale per il Monitoraggio e la Supervisione della Mobilità e del Trasporto Pubblico Locale.		€ 1.000.000,00	NO	4°- 2024		*		Intervento candidato al finanziamento nell'ambito della nuova programmazione FSC. *Ancora non redatto un cronoprogramma di attuazione dell'intervento

Regione - Piano gare Lavori - ANNO 2024

N.	Id Programmazione	Direzione Generale	Ufficio	OGGETTO DEL CONTRATTO (INDICARE ANCHE CPV)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (SE INDIVIDUATO)	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (INCLUSI ONERI SICUREZZA IVA ESCLUSA)	EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI N.	TRIMESTRE DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO (INDICATIVO)	DATA SCADENZA CONTRATTO IN ESSERE / PROROGA O NUOVA GARA	DURATA DEL CONTRATTO IN MESI	DATA PREVISTA PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZ. TECNICA	NOTE
1	2024_RB_AMB_LL_01	D.G. dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia	Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche.	Messa in sicurezza permanente del suolo mediante realizzazione barriera naturalizzata di protezione - Sito Orfano San Severino Lucano - Visciglie.	Ing. Vito Nardiello	€ 9.000.000,00	NO	1°- 2025		12	31/07/2024	
1	2023_RB_INF_LL_02	Direzione Generale Infrastrutture e mobilità	Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile	Lavori per la realizzazione della ciclovia dell'acquedotto pugliese. Tratto lucano - I lotto funzionale		€ 4.413.352,21	NO	4°- 2024		*		*Ancora non redatto un cronoprogramma di attuazione dell'intervento
2	2023_RB_INF_LL_03	Direzione Generale Infrastrutture e mobilità	Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile	Lavori per la realizzazione della ciclovia dell'acquedotto pugliese. Tratto lucano - II lotto funzionale	Ing. Carmela Cianciarulo	€ 2.283.942,97	NO	3°- 2024		*		*Ancora non redatto un cronoprogramma di attuazione dell'intervento.
3	2023_RB_INF_LL_04	Direzione Generale Infrastrutture e mobilità	Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile	Lavori per la realizzazione della ciclovia della Magna Grecia – tratto lucano -2° lotto funzionale, da Castelluccio Inferiore a Lagonegro	Ing. Carmela Cianciarulo	€ 4.320.997,43	NO	3°- 2024		*		*Ancora non redatto un cronoprogramma di attuazione dell'intervento.
3	2024_RB_INF_LL_01	Direzione Generale Infrastrutture e mobilità	Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile	Lavori per la realizzazione del 1° Lotto funzionale prioritario da Tempio di Hera a Stazione F.S. di Metaponto nel Comune di Bernalda (MT) - tratto Lucano, Versante ionico, della "ciclovia della Magna Grecia".	Ing. Carmen Vitiello	€ 1.072.108,35	NO	3°- 2024		*		L'importo potrebbe aumentare a seguito dell'approvazione del progetto definitivo nella CdS in corso.  *Ancora non redatto un cronoprogramma di attuazione dell'intervento.

### Altri ENTI - Piano gare Servizi e Forniture - ANNO 2024

N.	Id Programmazione	Ente	OGGETTO DEL CONTRATTO (INDICARE ANCHE CPV)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (SE INDIVIDUATO)	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (INCLUSI ONERI SICUREZZA IVA ESCLUSA)	EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI N.	TRIMESTRE DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO (INDICATIVO)	DATA SCADENZA CONTRATTO IN ESSERE / PROROGA O NUOVA GARA	DURATA DEL CONTRATTO IN MESI	DATA PREVISTA PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZ. TECNICA	NOTE
1	2018_C_BONI_SF_07	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Completamento schema idrico Basento-Bradano. Attrezzamento irriguo settore "G". COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO (CPV: 71632200-9)	Ing.Maria Carmela Leone	€ 327.224,19	NO	4°- 2024		34	settembre 2024	La durata é commisurata a quella dei lavori, al netto di eventuali proroghe.
2	2018_C_BONI_SF_08	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Completamento schema idrico Basento-Bradano. Attrezzamento irriguo settore "G". COLLAUDO STATICO (CPV: 71632000-7)	Ing.Maria Carmela Leone	€ 237.859,13	NO	4°- 2024		34	settembre 2024	La durata é commisurata a quella dei lavori, al netto di eventuali proroghe.
3	2018_C_BONI_SF_09	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Ristrutturazione dell'adduttore idraulico S. Giuliano - Ginosa - lotto secondo - Completamento delle opere principali di cui al Prog. BAS-03. - COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO (CPV: 71632200-9)	Ing.Maria Carmela Leone	€ 230.839,23	NO	4°- 2024		18	settembre 2024	Delibera CIPE n. 113 del 20.12.2004. Primo Programma delle Opere strategiche – Schemi idrici della Regione Basilicata - LA DURATA E' COMMISURATA A QUELLA DEI LAVORI
4	2020_C_BONI_SF_01	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Ristrutturazione dell'adduttore idraulico S. Giuliano - Ginosa - lotto secondo - Completamento delle opere principali di cui al Prog. BAS-03. - COLLAUDO STATICO (CPV: 71632200-9)	Ing.Maria Carmela Leone	€ 200.000,00	NO	4°- 2023			settembre 2024	Delibera CIPE n. 113 del 20.12.2004. Primo Programma delle Opere strategiche – Schemi idrici della Regione Basilicata
5	2018_C_BONI_SF_10	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Ristrutturazione dell'adduttore idraulico S. Giuliano - Ginosa - lotto secondo - Completamento delle opere principali di cui al Prog. BAS-03. - SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA (CPV: 71351914-3)	Ing.Maria Carmela Leone	€ 300.000,00	NO	1°- 2024		18	gennaio 2024	Delibera CIPE n. 113 del 20.12.2004. Primo Programma delle Opere strategiche – Schemi idrici della Regione Basilicata
6	2022_C_BONI_SF_01	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Servizi di riparazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e revisione di macchine operatrici (escavatori gommati/cingolati) comprensivi di accessori (trincee ecc.) e autocarri di massa complessiva sup. a q.li 35,00, trattori ed altri mezzi di proprietà dell'Ente	geom. Giuseppe Tortorelli	€ 1.500.000,00	3	1°- 2024		36	febbraio 2024	Fondi di Bilancio Consortile
7	2023_C_BONI_SF_02	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Servizi di riparazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e revisione di autoveicoli di proprietà dell'Ente ed operanti nell'are Bradanica e Jonica	geom. Giuseppe Tortorelli	€ 750.000,00	5	1°- 2024	31/12/2023	36	gennaio 2024	Fondi di Bilancio Consortile

### Altri ENTI - Piano gare Servizi e Forniture - ANNO 2024

N.	Id Programmazione	Ente	OGGETTO DEL CONTRATTO (INDICARE ANCHE CPV)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (SE INDIVIDUATO)	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (INCLUSI ONERI SICUREZZA IVA ESCLUSA)	EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI N.	TRIMESTRE DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO (INDICATIVO)	DATA SCADENZA CONTRATTO IN ESSERE / PROROGA O NUOVA GARA	DURATA DEL CONTRATTO IN MESI	DATA PREVISTA PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZ. TECNICA	NOTE
8	2024_C_BONI_SF_01	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Servizio di Brokeraggio Assicurativo per anni 5 - periodo 2025-2030	Dott.ssa Antonella Corrado	€ 300.000,00	NO	1° - 2024	08/07/2024	60	aprile 2024	Fondi di Bilancio Consortile
9	2024_C_BONI_SF_02	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Servizio di manutenzione ordinaria delle opere irrigue e di bonifica idraulica ricadenti nel comprensorio consortile – anno 2024.	Dott. Francesco Scarano	€ 540.000,00	SI - 8	1° - 2024		12	gennaio 2024	Fondi di Bilancio Consortile
10	2024_C_BONI_SF_03	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Servizio di conduzione dell'impianto di depurazione Gaudiano di Lavello (PZ) Giugno 2024-Dicembre 2024 (CPV PREVALENTE 90481000-2 Gestione di un depuratore)	Ing. Caterina Rago	€ 160.000,00	NO	1° - 2024		7	gennaio 2024	Fondi di Bilancio Consortile
11	2024_C_BONI_SF_04	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Servizio di ritiro e smaltimento fanghi rinvenienti dal processo depurativo dell'impianto di depurazione di Gaudiano per l'anno 2024 (CPV PREVALENTE 90510000-5 Trattamento e smaltimento dei rifiuti)	Ing. Caterina Rago	€ 180.000,00	NO	1° - 2024		6	gennaio 2024	Fondi di Bilancio Consortile
1	2023_ARPAB_SF_01	A.R.P.A.B.	Contratto di vigilanza armata sedi di Matera e Metaponto	dott. Claudio Dresda	€ 500.000,00	SI	3° - 2024		48	30/06/2024	Rup SUARB: Nicola Locaspi. In attesa di documentazione e di copertura finanziaria
2	2023_ARPAB_SF_02	A.R.P.A.B.	Servizi di gestione e manutenzione del Centro di Monitoraggio Ambientale	Dott. Claudio Dresda	€ 1.250.000,00	NO		gennaio 2024	30	già consegnata	Rup nominato dalla SUARB per la fase di affidamento: Giuseppe Bianchini
3	2024_ARPAB_SF_01	A.R.P.A.B.	Acquisto di un sistema di spettrometria di massa a rapporto isotopico (IRMS). 38433100-0	Dott.ssa Lucia Summa	€ 750.000,00	NO	2° - 2024			già consegnata	Documentazione consegnata e RUP della SUA già nominato - Vincenzo Telesca
4	2024_ARPAB_SF_02	A.R.P.A.B.	Laboratorio mobile e dotazione strumentale per il monitoraggio della qualità dell'aria (38000000-5)		€ 290.000,00	NO	3° - 2024			31/03/2024	
5	2024_ARPAB_SF_03	A.R.P.A.B.	Servizio di manutenzione e taratura attrezzature scientifiche e di misurazione 50411000-9		€ 700.000,00	SI	3° - 2024		24	31/03/2024	
1	2024_ARDSU_SF_01	ARDSU	Servizio mensa universitaria sedi di Potenza e Matera 55300000-3		€ 1.968.400,00	no	1° - 2024	24/02/2024	50	04/12/2023	

### Altri ENTI - Piano gare Servizi e Forniture - ANNO 2024

N.	Id Programmazione	Ente	OGGETTO DEL CONTRATTO (INDICARE ANCHE CPV)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (SE INDIVIDUATO)	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (INCLUSI ONERI SICUREZZA IVA ESCLUSA)	EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI N.	TRIMESTRE DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO (INDICATIVO)	DATA SCADENZA CONTRATTO IN ESSERE / PROROGA O NUOVA GARA	DURATA DEL CONTRATTO IN MESI	DATA PREVISTA PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZ. TECNICA	NOTE
1	2024_ATERMT_SF_01	ATER Matera	Servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'ATER di Matera CPV: 66518100 - 5	Francesco D'Onofrio	€ 45.000,00	no	1° - 2024	Contratto scaduto	60		Tale gara è stata programmata in quanto è possibile aggregarla alla gara con ID 2024_C_BONI_SF_01
1	2024_ARLAB_SF_01	ARLAB	Servizio di pulizia, sedi ARLAB e CPI Provincia di Potenza e Matera		€ 856.812.344,00	2 (di cui uno per immobile ex ATER di largo Carmelo Azzarà, 1 - Potenza)	3° - 2024 (1 luglio 2024)	30/06/2024	36	30/05/2024	
2	2024_ARLAB_SF_02	ARLAB	Servizio di guardiania e vigilanza Sedi ARLAB e CPI di Potenza		€ 227.571,54	1	3° - 2024 (1 luglio 2024)	30/06/2024	36	30/05/2024	
3	2024_ARLAB_SF_03	ARLAB	Servizio di guardiania e vigilanza Sedi ARLAB e CPI di Matera e Policoro		€ 237.600,00	1	3° - 2024 (1 luglio 2024)	30/06/2024	36	30/05/2024	
1	2024_ACQ_LU_SF_01	Acquedotto Lucano	Gestione di servizi di Contact Center e servizi di assistenza clientela di Acquedotto Lucano SPA	Raffaele Anzalone	€ 3.797.316,00	1				26/02/2024	E' stato nominato dalla SUA_RB il RdP Paola Santarsiero per la fase di affidamento



**Altri ENTI - Piano gare Lavori - ANNO 2024**

N.	Id Programmazione	Ente	OGGETTO DEL CONTRATTO (INDICARE ANCHE CPV)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (SE INDIVIDUATO)	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (INCLUSI ONERI SICUREZZA IVA ESCLUSA)	EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI N.	TRIMESTRE DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO (INDICATIVO)	DATA SCADENZA CONTRATTO IN ESSERE / PROROGA O NUOVA GARA	DURATA DEL CONTRATTO IN MESI	DATA PREVISTA PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZ. TECNICA	NOTE
1	2022_C_BONI_LL_08	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria delle vasche di accumulo "Salerno" e "Caramola" - Progetto Esecutivo - Lav. 1692	Ing. Vito Chico	€ 2.153.526,05	NO	1°-2024		18	gennaio 2024	Progetto finanziato in attesa di approvazione
2	2023_C_BONI_LL_02	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Manutenzione straordinaria canale idraulico "scolmatore 1" di Policoro – lavoro n.1698	Ing. Vito Chico	€ 5.172.568,00	NO	1°-2024		24	gennaio 2024	Progetto finanziato in attesa di approvazione - MIPAAF legge 178/2020
3	2023_C_BONI_LL_07	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Lavori di manutenzione straordinaria condotta adduttrice e distributrice "Vasca Pasciucco" – lav. 1704	Ing. Vito Chico	€ 3.811.323,06	NO	1°-2024		18	gennaio 2024	Progetto finanziato in attesa di approvazione - MIPAAF legge 178/2020  Tale gara era inserita nella programmazione 2023 con il titolo "Manutenzione condotte distribuzione e vasche di compenso straordinaria condotte "settore 5" in agro di Ferrandina, Salandra – lav. 1704" e un importo di euro 3.754.555,00.
4	2023_C_BONI_LL_08	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Ripristino diga di Abate Alonia - PNRR M2C4 - I 4.1	Ing. Maria Carmela Leone	€ 61.692.000,00	NO	1°-2024		24	gennaio 2024	Progetto finanziato in attesa di approvazione - MIT - PNRR M2C4 I4.1
5	2024_C_BONI_LL_01	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Lavori di adeguamento migliorativo schema Sinni - reti Codicino Lav. 1708	Ing. Vito Chico	€ 640.614,54	NO	1°-2024		12	gennaio 2024	Reg. Bas. PSR 2014-2020 Misura 4 sottomisura 4.3.2
6	2024_C_BONI_LL_02	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Lavori di adeguamento migliorativo schema Sinni - reti Francavilla. Lav. 1709	Ing. Vito Chico	€ 889.422,27	NO	1°-2024		12	gennaio 2024	Reg. Bas. PSR 2014-2020 Misura 4 sottomisura 4.3.2
7	2024_C_BONI_LL_03	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Lavori di adeguamento migliorativo schema Sinni - reti sottesi alla vasca Mesossero. Lav. 1710	Ing. Vito Chico	€ 718.564,92	NO	1°-2024		12	gennaio 2024	Reg. Bas. PSR 2014-2020 Misura 4 sottomisura 4.3.2
8	2024_C_BONI_LL_04	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Lavori per adeguamento e potenziamento dell'impianto di acque reflue in località Gaudiano di Lavello . Lav. 1705	Ing. Maria Carmela Leone	€ 2.000.000,00	NO	1°-2024		3	marzo 2024	Siamo in attesa del finanziamento e delle autorizzazioni ambientali

**Altri ENTI - Piano gare Lavori - ANNO 2024**

N.	Id Programmazione	Ente	OGGETTO DEL CONTRATTO (INDICARE ANCHE CPV)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (SE INDIVIDUATO)	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (INCLUSI ONERI SICUREZZA IVA ESCLUSA)	EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI N.	TRIMESTRE DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO (INDICATIVO)	DATA SCADENZA CONTRATTO IN ESSERE / PROROGA O NUOVA GARA	DURATA DEL CONTRATTO IN MESI	DATA PREVISTA PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZ. TECNICA	NOTE
1	2019_ATERPZ_LL_01	ATER Potenza	Lavori di costruzione di n. 12 alloggi (I Stralcio) nel Comune di Melfi - Legge 560/1993	Ing. Michele Gerardi	€ 2.348.923,99	NO		nuova gara	24		
2	2024_ATERPZ_LL_01	ATER Potenza	Lavori di completamento di un fabbricato per complessivi n. 9 alloggi in Piazza Europa nel Comune di Maratea (PZ).	Ing. Michele Gerardi	€ 1.154.000,00	NO	1°-2023	nuova gara	18	I trimestre 2023	Doc consegnata e RUP della SUA nominato
3	2024_ATERPZ_LL_02	ATER Potenza	Lavori di efficientamento energetico di n. 2 fabbricati di e.r.p. nel comune di RIONERO	Ing. Carla De Fino	€ 854.583,00	NO		nuova gara			
4	2024_ATERPZ_LL_03	ATER Potenza	Lavori di efficientamento energetico di n. 2 fabbricati di edilizia residenziale sovvenzionata per complessivi 13 alloggi nel comune di ATELLA (PZ) - L.go S. Eligio nn. 10 e 11	Ing. Carla De Fino	€ 788.746,50	NO		nuova gara			
5	2024_ATERPZ_LL_04	ATER Potenza	Lavori di efficientamento energetico di n. 1 fabbricato di edilizia residenziale sovvenzionata per complessivi 12 alloggi nel comune di FRANCAVILLA S.S. (PZ) - Loc. Vigna della Chiesa nn. 16 e 18	Ing. Carla De Fino	€ 577.665,45	NO		nuova gara			
6	2024_ATERPZ_LL_05	ATER Potenza	Lavori di efficientamento energetico di n. 1 fabbricato di edilizia residenziale sovvenzionata per complessivi 7 alloggi nel comune di SENISE (PZ) - Rione Fratelli Mattei n. 19	Ing. Carla De Fino	€ 854.583,00	NO		nuova gara			
7	2024_ATERPZ_LL_06	ATER Potenza	Legge 80/2014 - Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di alloggi di e.r.p. - Intervento in Via Piano dei Lippi nn. 24-26 nel Comune di LAGONEGRO (PZ)	Ing. Michele Gerardi	€ 900.000,00	NO		nuova gara			
1	2024_SEL_LL_01	S.E.L. - S.p.A.	Affidamento lavori per nuova realizzazione di impianto fotovoltaico a terra in loc. Pincia del Comune di Calvello (PZ)	Ing. Rocco Fasanella	€ 2.368.340,45	NO	2°-2024		4	gennaio 2024	

## 8. Certificazioni

All'inizio dell'anno 2023, la Direzione Generale Stazione Unica Appaltante era in possesso delle seguenti certificazioni rilasciate dalla DASA RÄGISTER S.P.A.:

1. certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 per le attività come oggetto: *“Garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni gestite e trattate nell'ambito dei servizi svolti attraverso la Piattaforma telematica SUA-RB procurement”*, con scadenza al 13/08/2023;
2. certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per le attività come oggetto: *“Erogazione dei servizi di Stazione Unica Appaltante, Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata”* con scadenza al 17/07/2024.

Al fine di procedere ad un rinnovo congiunto, nonché ad un mantenimento nel triennio a seguire di entrambe le certificazioni, con Determinazione Dirigenziale n. 20BA.2023/D.00129 del 13/06/2023 è stato affidato, a seguito di procedura MEPA, alla società Bureau Veritas Italia s.p.a, il servizio di rinnovo delle certificazioni di conformità suddette.

In attuazione dell'affidamento di cui sopra si è proceduto con lo svolgimento dei seguenti audit:

- audit in data 21/07/2023, (norma ISO 9001:2015);
- pre-audit in data 14/07/2023 e audit in data 24/07/2023, 25/07/2023 e 26/07/2023 (norma ISO 27001:2013 - 27001:2017).

In esito a tali audit la società Bureau Veritas Italia s.p.a ha emesso:

- in data 01/08/2023, il Certificato n. IT324850 di conformità alla norma ISO 27001:2013 - 27001:2017 con scadenza 31/10/2025;
- in data 31/08/2023, il Certificato n. IT324401 di conformità alla norma ISO 9001:2015 con scadenza 31/08/2026.

Si precisa che la scadenza *“anticipata”* al 31/10/2025 del certificato n. IT324850 è dovuta alla circostanza che la norma ISO 27001:2013-27001:2017 dovrà transitare al nuovo standard ISO/IEC 27001:2022 entro il 31 ottobre 2025 e pertanto entro tale data andranno a scadenza tutti i certificati emessi in conformità alla norma ISO 27001:2013-27001:2017.

Si precisa che nel rispetto delle norme di riferimento citate (ISO 9001 e ISO 27001), la *“Politica per la qualità SUA-RB”* e la *“Politica per la Sicurezza per le informazioni”*, che sono parte integrante, rispettivamente del *Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ)* e del *Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI)*, sono pubblicate in forma permanente sul sito della Direzione Generale della SUA-RB.

## 9. Articolazione organizzativa e funzionale alla data del 29.02.2024

La Direzione Generale Stazione Unica Appaltante risulta articolata in 3 Uffici: 1) Ufficio Appalti di Ingegneria, Architettura e Lavori, 2) Ufficio Appalti di Servizi e Forniture; 3) Ufficio centrale di Committenza e soggetto aggregatore. L'attuale articolazione riflette quanto disposto dagli art. 3 e 5 del Regolamento 10 febbraio 2021, cui si è dato attuazione con DGR del 19 marzo 2021, n. 219 "Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale" e successiva DGR del 6 ottobre 2021, n. 750 "Modifiche parziali alla DGR n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l'organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale".

Al 29.02.2024 il totale del personale a tempo indeterminato in organico della SUA-RB è pari a n. 23 persone tra cui il Direttore Generale e una unità part-time.

Nelle tabelle che seguono è riportato il personale attualmente in servizio presso la Direzione Generale SUA-RB, il profilo professionale e/o il titolo di studio posseduto:

	COGNOME	NOME	QUALIFICA	STATUS
1	DEL CORSO	Donato	Direttore Generale	di ruolo
2	ANDRIANI	Teresa	cat. D – PO	di ruolo
3	BIANCHINI	Giuseppe	cat. D – PO	di ruolo
4	CAIMO	Esterina	cat. D - PO	di ruolo
5	CIRIGLIANO	Guido	cat. D - PO	di ruolo
6	CLAPS	Donato	cat. C	di ruolo
7	GERARDI	Maria	cat. D	di ruolo
8	GROSSO	Simone	cat. D	di ruolo
9	LOCASPI	Nicola	cat. D	di ruolo part-time
10	LOCICERO	Venera	cat. D - PO	di ruolo
11	MAZZITELLI	Maria Teresa	cat. D	di ruolo
12	ONORATI	Rocco	cat. D – PO	di ruolo
13	OSTUNI	Anna	cat. C	di ruolo
14	PETRUZZI	Enzo Paolo	cat. D – PO	di ruolo
15	PIEDILATO	Maria Grazia	cat. D – PO	di ruolo
16	ROTA	Pietro	cat. C	di ruolo
17	SABIA	Mariangela	cat. D – PO	di ruolo
18	SANTARSIERO	Paola	cat.D -PO	di ruolo
19	SASSANO	Pasquale	cat. C	di ruolo
20	SELVAGGI	Michele	cat. D -PO	di ruolo
21	SERGIO	Teresa	cat. C	di ruolo
22	TELESCA	Vincenzo	cat. D - PO	di ruolo
23	ZACCAGNINO*	Sergio	cat. D	di ruolo
* decorrenza in Sua-RB dal 14/12/2023			<b>TOTALE PERSONALE</b>	<b>23</b>

Direttore Generale	Dirigenti	Cat.D	Cat. C
Avvocato		3 avvocati	2 Ragionieri
		1 Ingegnere clinico	3 geometri
		3 Ingegneri civili	
		1 Geologo	
		1 Ingegnere Ambiente	
		2 Agronomo	
		1 Architetto	
		1 Scienze della Comunicazione	
		1 Lettere con indirizzo linguistico	
		1 Maturità magistrale	
		1 Forestale	
		1 geometra	
1		17	5

La dotazione organica prevista ed approvata con 49 unità complessive di personale, giusta DGR del 30 settembre 2015, n. 1258, sarebbe idonea ad affrontare in toto la *mission* affidata alla Direzione Generale SUA-RB, ovvero a conseguire gli obiettivi generali posti dalla disciplina nazionale e regionale nonché a fornire un valido supporto ad un numero sempre maggiore di soggetti aderenti oltre quelli attualmente obbligati per legge.

A tal proposito con una prima nota prot. n. 14750/20BA del 23/01/2023, seguita poi da una successiva nota acquisita al prot. n. 242487/20BA del 22/11/2023, avente quale oggetto: “Art. 6 comma 1 e art. 33 comma 2 del D- Lgs 165/2001 – Ricognizione annuale del personale al fine della verifica di condizioni di sovrannumero o eccedenze di personale e stima del fabbisogno di personale in relazione alle esigenze funzionali”, è stata trasmessa comunicazione alla competente Direzione Generale Risorse umane, Organizzazione e Affari generali, con la quale sono stati indicati i profili e le competenze professionali da reclutare al fine di pervenire alla dotazione organica complessiva di 49 unità.

Con ulteriore nota acquisita al prot. n. 0030590/20BA del 12/02/2024, inviata alla Direzione Generale Risorse umane, Organizzazione e Affari generali è stata ribadita la grave situazione di organico in cui attualmente si trova ad operare la Direzione Generale Stazione Unica Appaltante riconfermando i profili e le competenze professionali da reclutare al fine di pervenire alla dotazione organica complessiva di 49 unità, già comunicati con le precedenti comunicazioni e che si riassumono di seguito:

**- Personale dirigenziale (tot. 2 unità):**

**n. 1 unità:**

*titolo di studio* – Laurea in disciplina giuridico/economica

*altri eventuali titoli da valutare:* esperienza in materia di appalti pubblici

*area di competenza: Direzione Ufficio Centrale di Committenza e soggetto aggregatore per la seguente attività: Responsabilità Ufficio*

**n. 1 unità**

*titolo di studio – Laurea in disciplina giuridico/economica o laurea tecnica (ingegneria-architettura)*

*altri eventuali titoli da valutare: esperienza in materia di appalti pubblici*

*area di competenza: Direzione Appalti di Servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori per la seguente attività: Responsabilità Ufficio*

**- Personale non dirigenziale (tot. 23 unità):**

**n. 2 unità - cat. D**

*profilo professionale: tecnico*

*titolo di studio – Laurea in ingegneria biomedica/ingegneria clinica*

*altri eventuali titoli da valutare: esperienza in materia di appalti pubblici*

*per la seguente attività: Procedure di gara – Responsabile del procedimento*

*per la seguente motivazione: necessità di competenza specifica per procedure della Direzione*

**n. 3 unità -cat. D**

*profilo professionale: Tecnico/ Ingegnere/informatico*

*titolo di studio: Laurea in ingegneria elettronica/informatica*

*altri eventuali titoli da valutare: esperienza in materia di appalti pubblici*

*per la seguente attività: Procedure di gara – Responsabile del procedimento*

*per la seguente motivazione: necessità di competenza specifica per procedure della Direzione.*

**n. 4 unità - cat. D**

*profilo professionale: Tecnico/ Ingegnere/Architetto*

*titolo di studio: Laurea in ingegneria edile/idraulica/architettura*

*altri eventuali titoli da valutare: esperienza in materia di appalti pubblici*

*per la seguente attività: Procedure di gara – Responsabile del procedimento*

*per la seguente motivazione: necessità di competenza specifica per procedure della Direzione*

**n. 2 unità - cat. D**

*profilo professionale: Biologo-Farmacista*

*titolo di studio: Laurea in biologia/biotecnologia/farmacia/chimica farmaceutica*

*altri eventuali titoli da valutare: esperienza in materia di appalti pubblici*

*per la seguente attività: Procedure di gara – Responsabile del procedimento*

*per la seguente motivazione: necessità di competenza specifica per procedure della Direzione*

**n. 4 unità - cat. D**

*profilo professionale: Legale*

*titolo di studio: Laurea in giurisprudenza*

*eventuale abilitazione o specializzazione:* Avvocato  
*altri eventuali titoli da valutare:* esperienza in materia di appalti pubblici  
*per la seguente attività:* Procedure di gara – Responsabile del procedimento/Supporto al RUP  
*per la seguente motivazione:* necessità di competenza specifica per procedure della Direzione.  
Supporto tecnico contenzioso amministrativo.

**n. 1 unità - cat. D**

*profilo professionale:* Amministrativo  
*titolo di studio:* Laurea in discipline giuridico/economiche  
*altri eventuali titoli da valutare:* esperienza in materia lavoristica  
*per la seguente attività:* Procedure di gara – Responsabile del procedimento  
*per la seguente motivazione:* necessità di competenza specifica per procedure della Direzione, in particolare per gli appalti che prevedono valutazione di aspetti giuslavoristici.

**n. 1 unità - cat. D**

*profilo professionale:* Amministrativo  
*titolo di studio:* Laurea generica  
*per la seguente attività:* Attività di monitoraggio. Supporto alla direzione per le attività connesse alla certificazione di qualità. Auditor. Supporto alla direzione per relazioni interne ed esterne – Tavolo dei soggetti aggregatori – Struttura di missione PNRR.  
*per la seguente motivazione:* necessità di unità dedicata a attività trasversali

**n. 3 unità - cat. C**

*profilo professionale:* tecnico  
*titolo di studio:* Diploma tecnico/geometra/professionale  
*altri eventuali titoli da valutare:* esperienza in materia di appalti pubblici  
*per la seguente attività:* Procedure di gara – Supporto al Rup  
*per la seguente motivazione:* necessità di competenza specifica per procedure della Direzione.

**n. 3 unità - cat. C**

*profilo professionale:* amministrativo  
*titolo di studio:* Diploma ragioneria/perito commerciale  
*altri eventuali titoli da valutare:* esperienza in materia di appalti pubblici  
*per la seguente attività:* Procedure di gara – Supporto al Rup  
*per la seguente motivazione:* necessità di competenza specifica per procedure della Direzione.

## 10. Attività Formative

Nel corso del 2023 sono state svolte le seguenti attività formative dirette ai dipendenti della Direzione Generale:

- 1) Webinar di formazione professionale “Simog e Fascicolo Virtuale Operatore Economico: pratica delle procedure di gara” che si è svolto in data 19/01/2023, mediante collegamento da remoto, in un’unica sessione antimeridiana della durata di 4 ore tenuta dal relatore Avvocato Francesco Russo. Il corso ha fornito conoscenze aggiuntive in merito agli adempimenti necessari ad un’appropriata gestione delle procedure di gara, rappresentando una guida pratica ed operativa al funzionamento dei sistemi SIMOG e FVOE, anche alla luce dei recentissimi provvedimenti di ANAC.
- 2) Corso di Formazione in presenza - “IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, Aggiornato alle novità della riforma (d.lgs. 36/2023)” - promosso dalla SUA-RB in collaborazione con la Giuffrè Francis Lefebvre Basilicata. La formazione ha interessato la totalità dei dipendenti della SUA-RB e i dipendenti delle altre Direzioni Generali della Regione Basilicata che si occupano di procedure di appalto. Il percorso formativo si è sviluppato su 24 ore organizzate in 6 sessioni tenute da: Cons. Dario Simeoli, Consigliere di Stato; Prof. Avv. Marco Giustiniani, Università Lumsa, Presidente Dike formazione giuridica; Prof. Avv. Fabrizio Fracchia, Ordinario Diritto amministrativo Bocconi – Milano. Una sessione formativa dello stesso corso è stata riservata al personale degli Enti committenti e, in modalità asincrona, l’intero corso è stato messo a disposizione degli Enti Locali della regione attraverso la struttura di missione del PNRR.
- 3) È proseguita l’attività nell’ambito del Piano Nazionale di formazione per l’aggiornamento professionale dei RUP - annualità 2022-2023 – realizzato nel quadro della Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere e ITACA, IFEL e SNA, in collaborazione con la rete nazionale degli Osservatori regionali, Anac e Consip. La formazione ha interessato la totalità dei dipendenti della SUA-RB.
- 4) La Regione Basilicata, ufficialmente accreditata sulla piattaforma “SYLLABUS” del Ministero della Pubblica Amministrazione, ha dato avvio ad un processo formativo con l’obiettivo di sviluppare e accrescere nuove competenze digitali all’interno dell’amministrazione, offrendo una formazione del capitale umano personalizzata, in modalità e-learning e con certificazione finale delle competenze. Nell’ambito di tale iniziativa la competenza assegnata nel 2023 al personale dipendente della Regione Basilicata è stata “La trasformazione sostenibile per la Pubblica Amministrazione - CONOSCERE IL RUOLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA TRASFORMAZIONE SOSTENIBILE”.
- 5) Nell’ambito dell’Iniziativa Valore PA promossa dall’INPS e che vede la partecipazione di dipendenti pubblici a corsi di formazione erogati da Università, sono stati sviluppati i seguenti percorsi formativi cui hanno partecipato alcuni dipendenti della SUA-RB:



- Corso di formazione “Il lavoro agile nelle PP.AA. La definizione di modelli organizzativi agili e resilienti per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici, implementando al contempo policies di work life balance” - Programma Valore P.A. INPS 2022/2023. Durata di 60 ore, dal 30 marzo al 14 giugno 2023.
- Corso di Formazione “CAPRI-Comprendere la transizione digitale della Pubblica amministrazione nella visione del PNRR per l’Informatica” Programma Valore P.A. INPS 2022/2023. Durata di 60 ore, dal 30 marzo al 12 giugno 2023.
- Corso di formazione “NISIDA – Nuovi strumenti Digitali per il lavoro a distanza nella Pubblica Amministrazione”, Programma Valore P.A. INPS 2022/2023. Durata di 60 ore, dal 28 marzo al 19 giugno 2023.
- Corso di formazione “P.A. e social media: comunicazione e ascolto efficace, organizzazione e scambio delle informazioni, relazioni innovative tra Pubblica Amministrazione e cittadini”, Programma Valore P.A. INPS 2022/2023. Durata di 60 ore, dal 17 aprile al 30 giugno 2023.

## 11. Considerazioni finali

Nel corso del 2023 la SUA-RB, malgrado presenti ancora un numero di dipendenti di gran lunga inferiore alla dotazione organica ottimale, ha confermato la capacità di garantire la celerità e la trasparenza delle procedure di gara nel pieno rispetto delle finalità della legge regionale istitutiva volta ad *“assicurare il contenimento delle spese e l'economicità della gestione”* delle procedure di affidamento.

Infatti è ulteriormente migliorato il trend in termini di percentuale di conclusione delle procedure di gara pubblicate che, nel periodo 2015-2023, si attesta al 96 % (percentuale più alta in assoluto rispetto agli anni precedenti), con un solo 4 % di gare in corso di espletamento, ovvero solo 12 gare, tutte peraltro pubblicate nel 2023.

Ad avvalorare la consolidata *“velocità”* di gestione delle gare interviene un ulteriore dato riferito alle procedure di gara per l'affidamento di lavori, finanziate con le risorse del PNRR, pubblicate e aggiudicate nel corso dell'anno 2023 con largo anticipo rispetto al termine fissato dal decreto di finanziamento nonostante fosse stato adottato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, criterio che richiede adempimenti aggiuntivi e procedure non snelle.

Nel 2023 sono state aggiudicate anche 11 gare pubblicate nelle annualità 2019-2022 (1 nel 2019, 1 nel 2021 e 9 nel 2022); con tali aggiudicazioni sono state portate a conclusione tutte le gare delle annualità precedenti al 2023.

In totale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 29 febbraio 2024, sono state portate a conclusione 39 procedure di gara di cui 37 aggiudicate, 1 infruttuosa e un'altra deserta/revocata.

Inoltre, un elevato livello di conoscenza della normativa vigente in materia di contratti pubblici e un elevato livello di esperienza comportano l'adozione di scelte e comportamenti amministrativi idonei non solo a velocizzare l'iter procedurale ma anche - elemento certamente non secondario - a deflazionare l'incidenza del contenzioso giudiziario.

A tal proposito si evidenzia che su 40 gare pubblicate nel corso del 2023 alla data del 29.02.2024 solo 3 sono state oggetto di impugnativa portando a 5 contenziosi di cui 3 che riguardano la stessa gara. Tre giudizi si sono conclusi con esito pienamente favorevole alla Regione Basilicata, mentre due sono ancora in corso.

Va tra l'altro evidenziato che l'entrata in vigore del Nuovo Codice ha posto sul piano delle procedure di appalto, non pochi problemi legati al complesso regime transitorio che ha comportato una differenziazione nella gestione delle procedure di gara sia rispetto alle tipologie di disposizioni (come nel caso delle disposizioni relative alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti) che al tipo di finanziamento degli interventi oggetto di procedura di gara (come nel caso di interventi finanziati con fondi PNRR, PNC e fondi strutturali UE).

A fronte di tali complessità e al fine di rafforzare la capacità conoscitiva delle disposizioni del d.lgs. 36/2023, la SUA-RB ha intensificato l'attività formativa per il proprio personale, per un verso proseguendo con la formazione erogata nell'ambito del Piano Nazionale di formazione per l'aggiornamento professionale dei RUP, iniziata nel 2021 e per altro facendosi promotore in collaborazione con la Giuffrè Francis Lefebvre Basilicata di un corso di Formazione in presenza - "IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, Aggiornato alle novità della riforma (d.lgs. 36/2023)", della durata di 60 ore articolate in 6 sessioni, che ha interessato la totalità dei dipendenti della SUA-RB ed una selezione di dipendenti delle altre Direzioni Generali della Regione Basilicata.

Nel 2023 alla luce delle disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti, in ottemperanza e ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 36/2023 rubricato "Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi", alla SUA-RB (stazione appaltante qualificata di diritto, ai sensi del comma 4, art. 63 del d.lgs. 36/2023 in quanto soggetto aggregatore), con DGR n. 100 del 22/02/2024 è stata attribuita la competenza alla predisposizione, tenuta ed aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici e del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi della Regione Basilicata.

L'attribuzione della suddetta competenza alla SUA-RB risponde inoltre a quanto disposto dall'allegato I.5 al d.lgs. 36/2023 e, in particolare, dall'art. 3, commi 13 e 14 (per la programmazione dei lavori pubblici) e dall'art. 6, comma 13 (per la programmazione degli acquisti di forniture e servizi), secondo cui la programmazione triennale degli appalti è una attività che richiede un continuo e costante aggiornamento, secondo le necessità di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di interesse dell'Amministrazione e che, pertanto, deve essere affidata ad una struttura stabile all'interno dell'Amministrazione che ne curi la redazione e il relativo aggiornamento.

Infine, l'applicazione della disciplina riferita alla digitalizzazione di cui al Capo II del d.lgs. 36/2023, ha imposto a tutte le stazioni Appaltanti l'obbligo di utilizzare piattaforme di e-procurement certificate da AgID, e quindi interoperabili con la BDNCP nella gestione di tutte le fasi dei contratti pubblici. In accoglimento a tale disciplina la SUA-RB, stazione appaltante qualificata di diritto in quanto soggetto aggregatore ai sensi del comma 4, art. 63 del d.lgs. 36/2023, ha avviato alla fine dell'anno 2023 il processo di certificazione della propria piattaforma, processo particolarmente laborioso e reso ancora più complesso per il coinvolgimento di più attori interessati: ANAC, AGID, l'operatore economico titolare del contratto di manutenzione, la SUA-RB, l'Ufficio Amministrazione Digitale.

Nel mese di marzo 2024 tale processo si è concluso con la certificazione per la SUA-RB in qualità di gestore autorizzato della Piattaforma digitale "Basilicata Appalti". Tale certificazione, se per un verso ha significato l'assolvimento di una tappa importante nel percorso verso la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, per altro apre una fase di non facile gestione che vede già la SUA-RB impegnata con altre Stazioni Appaltanti e Soggetti Aggregatori, nei tavoli nazionali in tema di digitalizzazione e interoperabilità delle piattaforme, coordinati dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) e da ITACA.

**Allegato 1**  
**Gare pubblicate nelle annualità 2015-2022**  
**(lo stato delle gare è aggiornato al 29/02/2024)**

### GARE PUBBLICATE - ANNO 2015

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
1	CRF – lotti 1 – 2 - 3	G00062	6126697	04/08/2015	Conclusa	Aggiudicata	-0,82%	3.186.980,00			3.186.980,00	
2	TPL	G00073	6089753	24/11/2015	ANNULLATA			12.931.661,16	Annull. al TAR Appello in CdS ANNULLATA		12.931.661,16	
3	FARMACI	G00071	6147240	02/12/2015	Conclusa	Aggiudicata	-16,05%	229.479.908,96	Id prog. 2015_01 SS.AA.	229.479.908,96		
4	AGENDA DIGITALE	G00066	6269693	23/12/2015	Conclusa	Aggiudicata	-13,13%	15.295.736,99	Annull. al TAR Appello in CdS ANNULLATA		15.295.736,99	
5	PULIZIA	G00063	6071598	26/12/2015	Conclusa	Aggiudicata	-26,33%	84.861.555,58	Id prog 2015_02 SS.AA. annullato in primo grado lotto 5 e poi C.d.S. OK	84.861.555,58		
6	Consulenza Strategica	G00064	6283713	24/12/2015	Conclusa	Aggiudicata	-18,10%	10.000.000,00			10.000.000,00	
							TOTALE 2015	355.755.842,69	Importi	314.341.464,54	41.414.378,15	-
									N. gare	2	4	0

Legenda:

Gare concluse/annullate/revocate

### GARE PUBBLICATE - ANNO 2016

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI	
1	AA.TT. fondi U.E.	G00070	6330204	17/02/2016	Conclusa	Aggiudicata	-20,51%	28.930.000,00			28.930.000,00		
2	MANUTENZIONI	G00067	6333559	07/04/2016	Conclusa	Aggiudicata	-26,17%	62.860.000,00	Id prog. 2015_03 SS.AA.	62.860.000,00			
3	FARMACI_PHT	G00069	6373314	07/04/2016	Conclusa	Aggiudicata	-8,56%	42.269.325,87	Id prog. 2015_15 SS.AA.	42.269.325,87			
4	VACCINI	G00065	6382396	12/04/2016	Conclusa	Aggiudicata	-3,13%	3.838.755,52	Id prog. 2015_22 SS.AA.	3.838.755,52			
5	FARMACI Ed 2	G00068	6382413	18/04/2016	Conclusa	Aggiudicata	-22,05%	71.052.657,51	Id prog. 2015_19 SS.AA.	71.052.657,51			
6	Lavoro Temporaneo x ARPAB	G00047	6494981	22/08/2016	Conclusa	Aggiudicata	non applicabile	7.541.082,33	Ricorso al TAR			7.541.082,33	
7	Vigilanza Armata	G00046	6491056	05/10/2016	Conclusa	Aggiudicata	-11,96%	49.700.000,00	Id prog. 2015_04 SS.AA. Ricorso al TAR	49.700.000,00			
8	CRF lotti 4 - 5	G00031	6398772	10/11/2016	Conclusa	Aggiudicata 4	-5,50%	412.000,00			412.000,00		
9	Baseline	G00032	6601095	14/12/2016	Conclusa	Aggiudicata	-18,43%	1.050.000,00			1.050.000,00		
10	Piano Paesaggistico	G00033	6601169	14/12/2016	Conclusa	Aggiudicata	-29,70%	397.622,95			397.622,95		
11	Valore Turismo	G00034	6609703	30/12/2016	Conclusa	Aggiudicata	-20,00%	309.378,00			309.378,00		
12	Lavanolo	G00039	6602746	30/12/2016	Conclusa	Lotto 1 aggiudicato Lotto 2 infruttuoso	-16,00%	23.319.240,50	Id Prog. 2015_05 SS.AA. Ricorso TAR +CDS	23.319.240,50			
13	Medicazioni generali	G00037	6620757	30/12/2016	Conclusa	Aggiudicata	-33,15%	15.656.439,98	Id prog. 2015_07 SS.AA.	15.656.439,98			
14	Rete Idropluviometrica	G00038	6622580	30/12/2016	Conclusa	Aggiudicata	-8,50%	1.057.000,00			1.057.000,00		
<b>TOTALE 2016</b>								<b>308.393.502,66</b>	Importi	268.696.419,38	32.156.000,95	7.541.082,33	
Legenda:										N. gare	7	6	1
Gare concluse/annulate/revocate													

## GARE PUBBLICATE - ANNO 2017

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
1	Progettazione S.Carlo Pad. M7	G00040	6650597	18/02/2017	Conclusa	Aggiudicata	-45,67%	982.327,63	Id prog. 2017_02bis SS.AA.	982.327,63		
2	Progettazione vecchio Ospedale Lagonegro	G00041	6677157	01/03/2017	Conclusa	Aggiudicata	-20,00%	773.950,60	Id prog. 2017_01bis SS.AA.	773.950,60		
3	Lavori ristrutturaz. IRCCS reumatol. San Carlo	G00045	6677409	01/03/2017	Conclusa	Aggiudicata	-13,72%	1.832.576,10	Id prog. 2017_01bis 1a - GARA	1.832.576,10		
4	Archivio Regione	G00044	6662595	06/03/2017	Conclusa	Aggiudicata	-3,60%	3.180.000,00			3.180.000,00	
5	Ossigenoterapia	G00050	6704775	21/04/2017	Conclusa	Aggiudicata	-7,40%	17.806.356,30	Id prog. 2015_08 SS.AA. Facoltativo	17.806.356,30		
6	Service Ricetta Elettronica	G00051	6705541	09/05/2017	Conclusa	Aggiudicata	-6,25%	452.480,00			452.480,00	
7	Service Centri Trasfusionali	G00053	6733978	18/05/2017	Conclusa	Aggiudicata	-22,75%	19.898.125,00	Id prog. 2015_12 SS.AA. Facoltativo	19.898.125,00		
8	Bonifica Sito inquin. Tito	G00054	6684250	19/05/2017	Conclusa	Aggiudicata	-71,45%	241.295,24			241.295,24	
9	Caratterizzaz. SIN fosfogessi	G00055	6684268	19/05/2017	Conclusa	Aggiudicata	-29,22%	596.813,39	Ricorso al TAR respinto		596.813,39	
10	ATER PZ Manutenzioni	G00052	6723720	10/05/2017	Conclusa	Aggiudicata	-22,04%	3.900.000,00	Ricorso al TAR respinto 2a - GARA			3.900.000,00
11	Case Alloggio	G00056	6744460	24/05/2017	SOSPESA			58.630.801,99	Id Prog. 2015_13 SS.AA. Facoltativo	58.630.801,99		
12	Ristorazione	G00058	6747069	24/05/2017	Conclusa	Aggiudicata	-2,92%	36.900.093,98	SS.AA.	36.900.093,98		
13	Stent	G00060	6752156	31/05/2017	Conclusa	Aggiudicata	-30,19%	11.576.100,00	Id prog. 2015_10.1 SS.AA.	11.576.100,00		
14	Materiale Ortopedia	G00059	6754018	05/06/2017	Conclusa	Aggiudicata	-28,73%	51.895.250,00	Id Prog. 2015_18 SS.AA. Facoltativo	51.895.250,00		

## GARE PUBBLICATE - ANNO 2017

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
15	CRF lotto 5	G00057	6674929	05/06/2017	Conclusa	Aggiudicata		137.000,00			137.000,00	
16	Assicurazioni Regione	G00072	6774052	14/07/2017	Conclusa	Aggiudicata	-34,44%	475.000,00			475.000,00	
17	ARPAB attrezzature e strumentazione	G00061	6791404	04/08/2017	Conclusa	Aggiudicata (alcuni lotti deserti)	-11,55%	4.377.150,00				4.377.150,00
18	Pulizia Regione e Comune di MT	G00074	6816516	07/08/2017	Conclusa	Aggiudicata	-20,44%	4.506.634,62	Id prog. 2018_01_02 SS.AA.		4.506.634,62	
19	VACCINI 2017	G00077	6822586	24/08/2017	Conclusa	Aggiudicata	-3,17%	5.669.803,87	Id prog. 2017_12 SS.AA.	5.669.803,87		
20	Defibrillatori + elettrofisiologia Pacemakers	G00076	6831367	06/09/2017	Conclusa	Aggiudicata	-19,79% -48,1% -19,97%	36.836.640,00	Id prog. 2015_10.2 SS.AA.	36.836.640,00		
21	Dispositivi x Cardiochirurgia	G00075	6826685	04/09/2017	Conclusa	Aggiudicata	-13,48%	13.780.173,00	Id prog. 2015_14	13.780.173,00		
22	Pubblicazione Gare	G00078	6842081	18/09/2017	Conclusa	Aggiudicata	-3,17%	112.406,78	Ricorso al TAR respinto		112.406,78	
23	PET/TAC	G00080	6849398	25/09/2017	Conclusa	Aggiudicata	-0,16%	1.425.600,00	Id prog. 2017_01	1.425.600,00		
24	Servizi Museo Lagopesole	G00081	6836776	29/09/2017	Conclusa	Aggiudicata	-15,00%	218.175,00			218.175,00	
25	Vigilanza Arm. Regione Matera	G00082	6857189	02/10/2017	Conclusa	Aggiudicata	-27,60%	1.115.327,20	Id Prog. 2018_03 SS.AA.		1.115.327,20	
26	FARMACI 3	G00083	6848886	13/10/2017	Conclusa	Aggiudicata	-23,73%	122.265.590,40	Id Prog. 2017_15 SS.AA. Ricorso al TAR x 1	122.265.590,40		
27	Telemedicina Sperimentale	G00084	6876595	23/10/2017	Conclusa	INFRUTTUOSA		286.000,00	Id Prog. 2017_07	286.000,00		



### GARE PUBBLICATE - ANNO 2017

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
28	Magazzino centralizzato	G00085	6890672	03/11/2017	Conclusa	Aggiudicata	-15,76%	25.213.200,00	Id Prog. 2015_20	25.213.200,00		
29	Anagrafe Bovina	G00088	6909316	01/12/2017	Conclusa	Aggiudicata	-23,73%	875.463,00	Id Prog. 2017_04		875.463,00	
30	Aghi e Siringhe	G00092	6920555	04/12/2017	Conclusa	Aggiudicata	-45,44%	7.456.281,50	Id Prog. 2017_13 SS.AA.	7.456.281,50		
31	Lavoro Temp. AASS e Regione	G00087	6918486	04/12/2017	Conclusa	Aggiudicata	non applicabile	45.500.000,00	SS.AA. Facoltativo	45.500.000,00		
32	Dispositivi x Neurochirurgia	G00090	6904369	11/12/2017	Conclusa	Aggiudicata	-34,72%	3.176.340,00	Id Prog. 2015_16	3.176.340,00		
33	Ausili Protesici (+ Incontinenza)	G00089	6925706	15/12/2017	Conclusa	Aggiudicata	-38,27%	40.658.890,08	Id Prog. 2015_11 SS.AA. (Lotti 1, 2,	40.658.890,08		
34	Fornitura TNT	G00091	6937458	20/12/2017	Conclusa	Aggiudicata	-11,16%	8.305.793,00	Id Prog. 2017_02 1a TELEMATICA	8.305.793,00		
35	Assicuraz. AASS + Ater PZ	G00093	6930312	22/12/2017	Conclusa	Aggiudicata	-44,25%	2.259.054,36	Id Prog. 2017_05	2.259.054,36		
							TOTALE 2017	533.316.693,04	Importi	513.128.947,81	11.910.595,23	8.277.150,00
									N. gare	22	11	2

Legenda:

Gare concluse/annullate/revocate

## GARE PUBBLICATE - ANNO 2018

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
1	Radiofarmaci	G00096	6948819	03/01/2018	Conclusa	Aggiudicata	-15,98%	3.002.370,00	SS.AA.	3.002.370,00		
2	Interventistica strutturale	G00097	6956660	10/01/2018	Conclusa	Aggiudicata	-17,29%	8.406.150,00	Id Prog. 2015_10.4	8.406.150,00		
3	Progettaz. Osped. Villa d'Agri osp.	G00099	6959225	17/01/2018	Conclusa	Aggiudicata	-40,67%	234.959,59	Id Prog. 2018_01	234.959,59		
4	Openspace APT	G00098	6951358	19/01/2018	Conclusa	Aggiudicata	-28,34%	675.078,29				675.078,29
5	Ater costruzione 36 alloggi	G00094	6960669	19/01/2018	Conclusa	Aggiudicata	-12,05%	3.898.176,13	Prog. 2017 3a - GARA LAVORI			3.898.176,13
6	Basil	G00100	6963643	22/01/2018	Conclusa	Aggiudicata	-22,42%	1.260.000,00			1.260.000,00	
7	Emodinamica	G00095	6963850	26/01/2018	Conclusa	Aggiudicata	-30,25%	9.963.187,50	Id Prog. 2015_10.3 2a	9.963.187,50		
8	Anatomia patologica	G00101	6965677	26/01/2018	Conclusa	Aggiudicata	-26,68%	5.310.000,00	Id Prog. 2017_11	5.310.000,00		
9	Dispositivi x Endoscopia digestiva.	G00161	7023711	30/03/2018	Conclusa	Aggiudicata	-42,31%	9.235.900,00	Id Prog. 2017_10 3a TELEMATICA	9.235.900,00		
10	Sistema SIRFO	G00160	7027970	26/03/2018	Conclusa	Aggiudicata	-15,50%	497.600,00	Ricorso al TAR RITIRATO		497.600,00	
11	Brokeraggio	G00162	7020179	23/04/2018	Conclusa	Aggiudicata	non applicabile	3.274.851,00	Id Prog. 2017_39 4a TELEMATICA	3.274.851,00		
12	Chirurgia Vascolare	G00165	7048234	27/04/2018	Conclusa	Aggiudicata	-14,50%	15.719.523,00	Id Prog. 2015_10.5 5a	15.719.523,00		
13	Sale Operatorie	G00169	7063848	04/05/2018	Conclusa	Aggiudicata	-1,00%	1.092.000,00	Id Prog. 2017_31 6a TELEMATICA	1.092.000,00		
14	Biosimilari AQ	G00170	7050799	11/05/2018	Conclusa	Aggiudicata	-38,23%	10.034.631,00	Id Prog. 2018_30 7a TELEMATICA	10.034.631,00		

## GARE PUBBLICATE - ANNO 2018

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
15	Gruppi Elettrogeni S.Carlo	G00172	7065123	07/05/2018	Conclusa	Aggiudicata	-35,01%	1.229.323,78	Id Prog. 2018_34	1.229.323,78		
16	Progett. Rischio idrogeol. Stigliano	G00171	7065054	07/05/2018	Conclusa	Aggiudicata	-37,90%	611.584,29	Id Prog. 2018_3-4			611.584,29
17	Impianti tecnologici S.Carlo	G00164	7079731	16/05/2018	Conclusa	Aggiudicata	-31,96%	1.825.598,15	Id Prog. 2018_3 4a - GARA LAVORI	1.825.598,15		
18	Cancelleria e stampati	G00166	7032138	16/05/2018	Conclusa	Aggiudicata	-39,77%	4.515.693,90	Id Prog. 2017_35 8a TELEMATICA	4.515.693,90		
19	Smaltim. fanghi Consorzio ASI - PZ	G00167	7073667	21/05/2018	Conclusa	DESERTA		550.740,00	Id Prog. 2018_01			550.740,00
20	App. Elettromedicali VideoEndoscopia	G00174	7075940	28/05/2018	Conclusa	Aggiudicata	-25,98%	3.770.000,00	Id Prog. 2017_26 9a TELEMATICA	3.770.000,00		
21	Progett. Rischio idrogeol. Lauria	G00175	7099757	06/06/2018	Conclusa	Aggiudicata	-42,78%	707.983,05	Id Prog. 2018_1-2			707.983,05
22	Riqualficazione Padiglioni San Carlo	G00173	7112373	13/06/2018	Conclusa	Aggiudicata	-18,02%	1.080.230,19	Id Prog. 2018_04 5a - GARA LAVORI	1.080.230,19		
23	AQ rianimaz. ASM	G00176	7092466	15/06/2018	Conclusa	Aggiudicata	-1,87%	300.000,00	10a TELEMATICA	300.000,00		
24	SDAPA App. Radiologia	G00179	7133403	02/07/2018	Conclusa	Aggiudicata	-25,88%	1.665.131,00	Id Prog. 2017_25.1 9a	1.665.131,00		
25	Manutenzioni App. Elettromedicali	G00187	7133894	06/07/2018	Conclusa	Aggiudicata	-36,41%	48.913.868,86	SS.AA. aggiudicaz. lotto 69 annullata dal	48.913.868,86		
26	57 Ambulanze	G00181	7143117	11/07/2018	Conclusa	Aggiudicata	-2,00%	4.099.650,00	Id Prog. 2017_03	4.099.650,00		
27	Arredi sanitari ASM	G00177	7143744	25/07/2018	Conclusa	Aggiudicata	-24,48%	1.261.460,00	12a TELEMATICA	1.261.460,00		
28	Rete Radio Unitaria	G00182	7158492	27/07/2018	Conclusa	Aggiudicata	-0,50%	9.630.800,00			9.630.800,00	

## GARE PUBBLICATE - ANNO 2018

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI	
29	Lampade Scialitiche ASM	G00178	7156389	08/08/2018	Conclusa	Aggiudicata	-17,09%	335.500,00	Id Prog. 2017_32 13a TELEMATICA	335.500,00			
30	VACCINI 2018	G00184	7163865	06/08/2018	Conclusa	Aggiudicata	-6,21%	5.555.544,31	Id Prog. 2018_18 SS.AA.	5.555.544,31			
31	Tesoreria AASS e Consorzio Bonifica	G00183	7167800	06/08/2018	Conclusa	Aggiudicato lotto 1 (Lotto 2 deserto)	-82,00%	1.466.000,00	Id Prog. 2017_08 14a TELEMATICA	1.466.000,00			
32	Manutenz. Assist. Ventil. Domic. asp	G00180	7169680	20/08/2018	Conclusa	Aggiudicata	-4,39%	526.392,00	Id Prog. 2017_38 15a TELEMATICA	526.392,00			
33	Service Laborat. Analisi	G00185	7191224	14/09/2018	Conclusa	Aggiudicata	-24,48%	58.159.345,00	Id Prog. 2017_16	58.159.345,00			
34	AQ Assistenza Domiciliare Respiratoria PZ e MT	G00188	7214860	24/10/2018	ANNULLATA			7.089.760,00	Id Prog. 2017_16 Annull. al TAR	7.089.760,00			
35	Gamma Camere x S.Carlo, ASM e Crob	G00186	7234953	31/10/2018	Conclusa	Aggiudicata	-0,16%	1.360.000,00	Id Prog. 2017_06 15a TELEMATICA	1.360.000,00			
36	Progett. Bonifica Val Basento	G00190	7238987	05/11/2018	Conclusa	Aggiudicata	-48,29%	1.391.169,25	Id Prog. 2018_01 ULTIMA GARA NON TELEMATICA		1.391.169,25		
37	Arpab Manutenz. e Taratura	G00189	7235691	07/11/2018	Conclusa	Aggiudicata	-14,58%	1.395.240,00	Id Prog. 2018_02			1.395.240,00	
38	2 TAC per ASM e S.Carlo	G00192	7253258	21/12/2018	Conclusa	Aggiudicata	-0,22%	1.700.967,59	Id Prog. 2018_25.2	1.700.967,59			
39	Radiofarmaci Tutte meno ASP	G00199	7274718	27/12/2018	Conclusa	Aggiudicata	-15,99%	44.535.909,00	Id Prog. 2018_28 SS.AA.	44.535.909,00			
40	Manutenzione ASP e S. Carlo del Lagonegrese	G00196	7301914	31/12/2018	Conclusa	Aggiudicata	-18,89%	15.892.500,00	Id Prog. 2018_10 SS.AA.	15.892.500,00			
								TOTALE 2018	292.174.816,88	Importi	271.556.445,87	12.779.569,25	7.838.801,76
										N. gare	30	4	6

Legenda:

Gare concluse/annullate/revocate

## GARE PUBBLICATE - ANNO 2019

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
1	CMA - ARPAB	G00194	7296525	11/01/2019	Conclusa	Aggiudicata	-10,00%	2.083.341,22	Id Prog. 2018_09			2.083.341,22
2	Fascicolo Sociale	G00197	7306332	11/01/2019	Conclusa	Aggiudicata	-20,97%	1.993.000,00	Id Prog. 2017_41		1.993.000,00	
3	Proc. Negoziata Fanghi Consorzio ASI PZ	G00201	7312599	15/01/2019	Conclusa	DESERTA		402.000,00	Prog. 2018			402.000,00
4	Tesoreria AASS – RegBas e Enti	G00195	7290653	17/01/2019	Conclusa	DESERTA		1.652.500,00	Id Prog. 2017_08	1.652.500,00		
5	Beni consumo ARPAB	G00202	7333619	18/02/2019	Conclusa	Aggiudicata	-12,02%	2.038.846,11	Id Prog. 2018_03			2.038.846,11
6	Pubblicazioni legali (sotto soglia)	G00208	n.a.	04/03/2019	Conclusa	Aggiudicata	-16,23%	33.600,00	Id Prog. 2015_19		33.600,00	
7	ELISOCORSO	G00207	7360121	08/03/2019	Conclusa	Aggiudicata	-21,48%	36.381.000,00	Id Prog. 2015_06 gara sospesa e poi riattivata	36.381.000,00		
8	Manut. Computer	G00203	7367093	15/03/2019	Conclusa	Aggiudicata	-9,66%	1.332.045,00			1.332.045,00	
9	Service e CQI Lab. ASP e S.Carlo	G00205	7345429	18/03/2019	Conclusa	Aggiudicata	-26,12%	9.478.400,00	Id Prog. 2018_24- 25-26	9.478.400,00		
10	Banchi Lavoro e cappe - ARPAB	G00206	7372088	22/03/2019	Conclusa	Aggiudicata	-9,62%	378.224,33	Id Prog. 2018_03			378.224,33
11	Proc. Negoziata Attezz. ARPAB	G00209	7375669	26/03/2019	Conclusa	Aggiudicata	-0,13%	909.650,00	Id Prog. 2018_05			909.650,00
12	Smaltim. fanghi Cons. ASI – PZ - 2	G00212	7392173	05/04/2019	Conclusa	DESERTA		301.735,80	Prog. 2018			301.735,80

## GARE PUBBLICATE - ANNO 2019

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
13	CTR Regionale	G00211	7394506	12/04/2019	Conclusa	Aggiudicata	-10,73%	3.091.630,00	Prog . 2018		3.091.630,00	
14	Depuratori A.L. Manutenzione	G00210	7403113	17/04/2019	Conclusa	Aggiudicata	-19,16%	65.338.242,97	Prog . 2018			65.338.242,97
15	Agenda Digitale 2	G00216	7414248	29/04/2019	Conclusa	Aggiudicata	-19,02%	18.200.808,96	Prog . 2018 aggiudicaz. riformulata in	18.200.808,96		
16	Fisiopatologia della Riproduzione	G00215	7413385	03/05/2019	Conclusa	Aggiudicata	-9,99%	1.686.908,58	Id Prog. 2018_17	1.686.908,58		
17	RIS-PACS AASS	G00217	7431573	17/05/2019	Conclusa	Aggiudicata	-18,99%	4.333.000,00	Id Prog. 2018_36	4.333.000,00		
18	Gest. e Manut. Imp. Val D'Agri - ASI PZ.	G00219	7449492	07/06/2019	Conclusa	<u>REVOcata</u>		8.648.400,00	Prog . 2019			8.648.400,00
19	Rete Idrica PZ A.L.	G00221	7457017	17/06/2019	Conclusa	Aggiudicata	-24,72%	4.312.070,31	Id Prog. 2018_01			4.312.070,31
20	Servizi di screening oncologici AA.SS.	G00232	7464571	21/06/2019	Conclusa	Aggiudicata	-9,31%	9.691.887,00	Id Prog. 2018_02	9.691.887,00		
21	Iniettori TAC San Carlo	G00230	7476587	03/07/2019	Conclusa	Aggiudicata	-7,67%	1.067.500,00	Id Prog. 2018_35	1.067.500,00		
22	Pubblicazioni legali (sotto soglia)	n.a.	n.a.	26/07/2019	Conclusa	Aggiudicata	-28,39%	8.960,00	Prog . 2019		8.960,00	
23	Revisione contabile dei Bilanci AA.SS. e Regione	G00214	7494199	26/07/2019	Conclusa	Aggiudicata	-24,16%	360.000,00	Id Prog. 2019_22	360.000,00		
24	Farmaci AA.SS. (Edizione n.4)	G00226	7473581	26/07/2019	Conclusa	Aggiudicata	-25,83%	745.501.261,29	Prog . 2019 SS.AA.	745.501.261,29		
25	Vaccini AA.SS.	G00227	7495246	29/07/2019	Conclusa	Aggiudicata	-1,07%	5.735.344,79	Id Prog. 2019_22 SS.AA.	5.735.344,79		

## GARE PUBBLICATE - ANNO 2019

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
26	Videosorveglianza aree industriali ASI PZ	G00228	7501342	31/07/2019	Conclusa	Aggiudicata	-41,35%	2.701.610,99	Id Prog. 2019_01	2.701.610,99		
27	Monitoraggio parametri vitali ASM	G00223	7485024	02/08/2019	Conclusa	Aggiudicata	-3,93%	569.000,00		569.000,00		
28	Contratti Assicur. AA.SS. ARPAB Cons. Bonif.	G00213	7413834	26/08/2019	Conclusa	Aggiudicata (2 lotti deserti)	-39,78%	28.987.730,06		28.987.730,06		
29	Manutenzione impianti polo regionale	G00233	7543934	08/10/2019	Conclusa	Aggiudicata	-27,57%	2.628.000,00	Id Prog. 2018_05-06		2.628.000,00	
30	Autoespurgo, derattizz. videoispez. A.L.	G00234	7562264	16/10/2019	Conclusa	Aggiudicata	-24,76%	7.200.589,75	Id Prog. 2019_02			7.200.589,75
31	Supporto operativo portale SUA - RB (sotto soglia)	n.a.	n.a.	02/12/2019	Conclusa	DESERTA		38.875,00	Prog. 2019		38.875,00	
32	Manutenzione evolutiva portale SUA - RB	G00238	7617267	09/12/2019	Conclusa	Aggiudicata	-9,98%	504.720,00	Prog. 2019		504.720,00	
33	Manutenzione imp.ti di sollev.to fognari A.L.	G00241	7625336	16/12/2019	Conclusa	Aggiudicata	-20,38%	6.575.889,51	Id Prog. 2019_03			6.575.889,51
34	Tesoreria AA.SS. - RegBas e Enti	G00242	7624725	20/12/2019	Conclusa	DESERTA		1.871.500,00		1.871.500,00		
35	Stent AA.SS.	G00248	7632242	20/12/2019	Conclusa	Aggiudicata	-20,08%	684.500,00	Id Prog. 2017_13 SS.AA.	684.500,00		
36	Asilo nido Regione, S. Carlo, UniBas	G00244	7624262	20/12/2019	Conclusa	Aggiudicata	-15,90%	15.600,00	Id Prog. 2018_04 Termine differito causa COVID-19			16.550,00
37	Guanti AA.SS.	G00246	7631929	20/12/2019	Conclusa	Aggiudicata	-50,73%	11.427.750,00	Id Prog. 2017_13 SS.AA.	11.427.750,00		

## GARE PUBBLICATE - ANNO 2019

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
38	Pannoloni, mutande e traverse AA.SS.	G00247	7632145	20/12/2019	Conclusa	Aggiudicata	-47,72%	3.912.425,00	Id Prog. 2017_13 SS.AA.	3.912.425,00		
39	Dispositivi medici e Aghi AA.SS.	G00245	7627821	20/12/2019	Conclusa	Aggiudicata (33 lotti su 172 deserti/infrutt.)	-35,12%	59.756.209,05	Id Prog. 2017_13 SS.AA.	59.756.209,00		
40	Farmaci Biosimilari AA.SS.	G00235	7596227	23/12/2019	Conclusa	Aggiudicata	-58,30%	19.553.346,40	Id Prog. 2019_12 SS.AA.	19.553.346,40		
41	Trasporto sangue AA.SS.	G00249	7634958	23/12/2019	Conclusa	Aggiudicata	-17,45%	3.422.040,00	Id Prog. 2018_33	3.422.040,00		
42	Riufiuti Ospedalieri AA.SS.	G00250	7638639	23/12/2019	Conclusa	Aggiudicata	-9,19%	5.016.816,00	Id Prog. 2018_20	5.016.816,52		
							TOTALE 2019	1.079.826.958,12	Importi	971.991.538,59	9.630.830,00	98.205.540,00
									N. gare	22	8	12

Legenda:

Gare concluse/annullate/revocate

Gare aggiudicate nel corso dell'anno 2023



## GARE PUBBLICATE - ANNO 2020

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
1	Progettazione edificio da adibire a centro per le cure palliative- Hospice	G00251	7664353	29/01/2020	Conclusa	Aggiudicata	-45,33%	331.698,13		331.698,13		
2	Lavori di ripristino canale irriguo adduttore sinistra Agri - 1° Stralcio	G00240	7621526	07/02/2020	Conclusa	Aggiudicata	-30,57%	2.161.144,71				2.161.144,71
3	Lavori miglioramento rete di distribuzione irrigua e conturizzazione	G00254	7700656	04/03/2020	Conclusa	Aggiudicata	-21,00%	14.782.019,78				14.782.019,78
4	Supporto specialistico per implementare il Sistema di Qualità della SUA-RB	n.a.	n.a.	06/03/2020	Conclusa	Aggiudicata	Non Applicabile	25.500,00			25.500,00	
5	Lavori rete idrica località Santa Loya - Comune di Tito	G00255	7710216	18/03/2020	Conclusa	Aggiudicata	-28,89%	2.552.669,15				2.552.669,15
6	Monitor multiparametrici, letti per terapia intensiva e ventilatori polmonari	G00256	7721007	20/03/2020	Conclusa	Aggiudicata	-30,11%	1.090.000,00	EMERGENZA COVID-19	1.090.000,00		
7	Dispositivi trasportabili ad alto bio-contenimento (sotto soglia)	n.a.	7718394	23/03/2020	Conclusa	Aggiudicata	Non Applicabile	127.529,60	EMERGENZA COVID-19	127.529,60		
8	Servizio di pubblicità legale sui quotidiani	G00253	7693723	27/03/2020	Conclusa	Aggiudicata	-61,77%	492.800,00			492.800,00	
9	Letti di degenza e emogasanalizzatori	G00258	7732654	02/04/2020	Conclusa	Aggiudicata (1° lotto infruttuoso)	-41,00%	390.000,00	EMERGENZA COVID-19	390.000,00		
10	Letti di degenza e arredi sanitari	G00259	7740193	11/04/2020	Conclusa	Aggiudicata	-24,18%	209.800,00	EMERGENZA COVID-19	209.800,00		
11	Fornitura dello strumentario dedicato al Robot Da Vinci	G00260	7744876	20/04/2020	Conclusa	Aggiudicata	-0,69%	1.116.020,40		1.116.020,40		
12	Lavori di miglioramento reti irrigue e bacini di accumulo	G00261	7754742	11/05/2020	Conclusa	Aggiudicata	-20,40%	8.148.742,64				8.148.742,64
13	Sistema informativo risorse umane ASP, ASM e CROB	G00262	7765491	25/05/2020	Conclusa	Aggiudicata	-50,22%	307.500,00		307.500,00		
14	Fornitura disinfettanti per AOR San Carlo, ASM, ASP e CROB	G00252	7684619	29/05/2020	Conclusa	Aggiudicata	-6,33%	6.378.637,50		6.378.637,50		

## GARE PUBBLICATE - ANNO 2020

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
15	Lavori di riqualificazione della viabilità - Area industriale di Potenza	G00257	7723245	10/06/2020	Conclusa	Aggiudicata	-18,39%	1.099.999,44				1.099.999,44
16	Lavori schema irriguo Diga di Marsico Nuovo (Matina-Maglianese e Cavolo)	G00263	7792607	17/06/2020	Conclusa	Aggiudicata	-31,19%	4.823.354,77				4.823.354,77
17	VACCINI antinfluenzali	G00265	7800134	30/06/2020	Conclusa	Aggiudicata	0,00%	731.415,70	SS.AA.	731.415,70		
18	Fornitura di ipoclorito di sodio per Acquedotto Lucano S.p.A.	G00266	7810930	06/07/2020	Conclusa	Aggiudicata	-46,44%	1.130.580,00				1.130.580,00
19	Assistenza Domiciliare (infermieristica, riabilitativa, medico, ecc.)	G00267	7823367	17/07/2020	REVOCATA			48.129.908,25	Annullati lotti 3 4 con Sentenza TAR 10/2021	48.129.908,25		
20	Fornitura di un gascromatografo per ARPAB	G00268	7824342	20/07/2020	Conclusa	Aggiudicata	-0,08%	414.000,00				414.000,00
21	Contratti assicurativi RTC-RCO per le Aziende del SSR	G00264	7826248	10/08/2020	Conclusa	Aggiudicata	-13,82%	18.750.000,00		18.750.000,00		
22	Sistemi per l'estrazione di materiale virale (1^gara)	G00269	7874029	14/09/2020	Conclusa	DESERTA		1.320.000,00	EMERGENZA COVID-19	1.320.000,00		
23	Fornitura di materiale per OCULISTICA per AOR San Carlo, ASM e ASP	G00270	7883017	23/09/2020	Conclusa	Aggiudicata	-24,11%	26.028.875,00	aggiudicazione riformulata aper alcuni lotti	26.028.875,00		
24	Farmaci biosimilari (BEVACIZUMAB)	G00272	7887037	02/10/2020	Conclusa	Aggiudicata	-71,78%	3.234.000,00	SS.AA.	3.234.000,00		
25	Fornitura di reagenti per Laboratorio di Genetica A.S.M.	G00271	7894577	05/10/2020	Conclusa	Aggiudicata	-17,67%	3.013.500,00		3.013.500,00		
26	Lavori di ripristino traversa Santa Venere sul fiume Ofanto	G00274	7914039	06/10/2020	Conclusa	Aggiudicata	-29,79%	2.175.712,09	Proc. negoziata previa manif. di interesse			2.175.712,09
27	Sistemi per l'estrazione di materiale virale (2^gara)	G00275	7906471	13/10/2020	Conclusa	DESERTA		1.320.000,00	EMERGENZA COVID-19	1.320.000,00		
28	Bunker radioterapico e acceleratore lineare A.S.M.	G00276	7910198	20/10/2020	Conclusa	Aggiudicata	-1,30%	3.700.000,00		3.700.000,00		

## GARE PUBBLICATE - ANNO 2020

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
29	Sistemi per l'estrazione di materiale virale (3ª gara)	G00278	7922640	26/10/2020	Conclusa	Aggiudicata	-1,37%	2.000.000,00	EMERGENZA COVID-19	2.000.000,00		
30	Adeguamento delle tendostrutture donate dal QATAR	G00281	7924988	28/10/2020	Conclusa	Aggiudicata (2° lotto deserto)	-0,10%	257.320,00	EMERGENZA COVID-19		257.320,00	
31	Fornitura di box di biocontenimento (1ª gara)	G00284	7928207	29/10/2020	Conclusa	INFRUTTUOSA		864.000,00	EMERGENZA COVID-19	864.000,00		
32	Adeguamento rete idrica e fognaria di Muro Lucano	G00280	7924916	02/11/2020	Conclusa	Aggiudicata	-24,92%	2.055.541,21				2.055.541,21
33	Fornitura prodotti chimici per impianti di potabilizzazione	G00282	7928821	03/11/2020	Conclusa	Aggiudicata	-22,73%	2.162.583,44				2.162.583,44
34	Fornitura materiale specialistico per DIALISI	G00285	7930588	09/11/2020	Conclusa	Aggiudicata	-17,98%	10.399.415,00		10.399.415,00		
35	Fornitura di box di biocontenimento (2ª gara)	G00288	7942636	11/11/2020	Conclusa	Aggiudicata	-15,55%	864.000,00	EMERGENZA COVID-19	864.000,00		
36	Adeguamento tendostrutture donate dal QATAR - 2° Lotto	n.a.	7942965	12/11/2020	Conclusa	Aggiudicata	Non Applicabile	50.880,00	EMERGENZA COVID-19		50.880,00	
37	Sistema informatizzato Laboratorio Analsisi (LIS) AOR San Carlo e A.S.M.	G00289	7948432	18/11/2020	Conclusa	Aggiudicata	-13,93%	875.000,00		875.000,00		
38	Sorveglianza archeologica (lavori schema idrico Basento-Bradano)	G00291	7954354	28/11/2020	Conclusa	Aggiudicata	-33,98%	1.027.000,00	aggiudicazione riformulata a seguito di ricorso			1.027.000,00
39	SUTURATRCICI meccaniche	G00283	7919445	01/12/2020	Conclusa	Aggiudicata	-22,66%	33.191.154,00	SS.AA.	33.191.154,00		
40	Matrici ambientali e valori di fondo inquinanti - ARPAB	G00292	7970825	07/12/2020	Conclusa	Aggiudicata	-54,55%	711.984,08				711.984,08

## GARE PUBBLICATE - ANNO 2020

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO%	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
41	Trasporto integrativo interno e accompagnam. pazienti	G00294	7973186	07/12/2020	Conclusa	Aggiudicata	-4129,00%	12.324.943,50		12.324.943,50		
42	Trasporto scolastico per i COMUNI aderenti	G00296	7988100	18/12/2020	Conclusa	Aggiudicata	-9,12%	6.323.585,72	SS.AA.			6.323.585,72
43	Pulizia delle sedi di Consorzio di Bonifica, ARPAB, ATER PZ, SEL	G00295	7984679	18/12/2020	Conclusa	Aggiudicata	-27,27%	1.959.023,11	SS.AA.			1.959.023,11
44	SUTURE	G00293	7955633	22/12/2020	Conclusa	Aggiudicata	-31,81%	9.500.599,18	SS.AA.	9.500.599,18		
45	Costruzione 12 alloggi E.P.R. in località Serra Rifusa - Matera	G00287	7992389	23/12/2020	Conclusa	Aggiudicata	-31,25%	1.485.492,08	Proc. negoziata previa manif. di interesse			1.485.492,08
							TOTALE 2020	240.037.928,48	Importi	186.197.996,26	826.500,00	53.013.432,22
									N. gare	25	4	16

Legenda:

Gare concluse/annullate/revocate

## GARE PUBBLICATE - ANNO 2021

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
1	Manutenzione rete monitoraggio idropluviometrico	G00297	8023829	01/02/2021	Conclusa	Aggiudicata	-12,00%	695.000,00			695.000,00	
2	Forniture pneumatici Consorzio di Bonifica	G00290	8042359	11/02/2021	Conclusa	Aggiudicata	-53,12%	300.000,00				300.000,00
3	Dispositivi per radiologia interventistica e neuroradiologia	G00298	8042977	05/03/2021	Conclusa	Aggiudicata	-30,51%	33.977.860,00		33.977.860,00		
4	Realizzazione di 24 alloggi nel Comune di Matera - ATER MT	G00301	8082428	15/03/2021	Conclusa	Aggiudicata	-29,26%	2.105.125,26				2.105.125,26
5	VACCINI antinfluenzali - Campagna 2021/2022	G00304	8095061	31/03/2021	Conclusa	Aggiudicata	0,00%	1.791.958,60	Id Prog. 2021_05 SS.AA.	1.791.958,60		
6	Sistema Informativo integrato di Contabilità (SIC)	G00303	8093710	01/04/2021	Conclusa	Aggiudicata	-12,41%	768.075,00			768.075,00	
7	Invasi sperimentali sul fiume Agri - Diga di Marsico Nuovo	G00305	8129814	01/04/2021	Conclusa	Aggiudicata	-28,52%	2.419.504,29				2.419.504,29
8	Riparazione macchine operatrici Consorzio di Bonifica	G00307	8102736	09/04/2021	Conclusa	Aggiudic. Lotto 3 (Lotti 1, 2 deserti)	-8,88%	984.000,00				984.000,00
9	Riparazione autoveicoli Consorzio di Bonifica	G00308	8103009	09/04/2021	Conclusa	Aggiudicata (Lotti 3, 4 deserti)	-37,61%	540.000,00				540.000,00
10	Sistemi Informativi SIFESR e SIMIP	G00299	8105501	16/04/2021	Conclusa	Aggiudicata	-12,69%	714.700,00			714.700,00	
11	Fornitura di derrate alimentari oer l'Ospedale di Chiaromonte	G00300	8117381	23/04/2021	Conclusa	Aggiudicata	-25,64%	624.346,50		624.346,50		
12	FARMACI - Edizione n. 5	G00302	8092305	10/05/2021	Conclusa	Aggiudicata	-21,05%	204.080.997,23	Id Prog. 2020_15 SS.AA.	204.080.997,23		
13	Elettropompe per impianti di sollevamento di Acquedotto Lucano	G00311	8166093	31/05/2021	Conclusa	Aggiudic. Lotto 1 (Lotti 2, 3, 4 deserti./infrutt.)	-43,10%	4.654.500,00				4.654.500,00
14	FARMACI per uso veterinario	G00310	8147166	14/06/2021	Conclusa	Aggiudicata	-16,80%	258.031,70	SS.AA.	258.031,70		

## GARE PUBBLICATE - ANNO 2021

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
15	Tesoreria Regione Basilicata	G00312	8177973	14/06/2021	Conclusa	Aggiudicata	-4,92%	315.000,00			315.000,00	
16	Sistema di depurazione Comuni di Muro Lucano e Bella	G00314	8181139	14/06/2021	Conclusa	Aggiudicata	-29,66%	1.098.943,66				1.098.943,66
17	VACCINI antinfluenzali - Campagna 2021/2022 - Edizione 2	G00313	8179985	15/06/2021	Conclusa	Aggiudicata	0,00%	652.464,00	Id Prog. 2021_05 SS.AA.	652.464,00		
18	Dispositivi per senologia - AOR San Carlo	G00315	8179544	16/06/2021	Conclusa	Aggiudicata	-16,12%	423.200,00		423.200,00		
19	AQ Lavori edili di manutenzione su patrimonio ATER PZ	G00317	8197082	28/06/2021	Conclusa	Aggiudicata	-24,90%	4.410.950,00				4.410.950,00
20	Servizi di ingegneria schema idrico FRIDA - Acquedotto Lucano	G00326	8209447	14/07/2021	Conclusa	Aggiudicata	-40,00%	546.397,52				546.397,52
21	Manutenz. e gestione reti GAS MEDICINALI	G00325	8217326	15/07/2021	Conclusa	Aggiudicata	-32,24%	1.902.053,23		1.902.053,23		
22	Centro Unico Prestazioni Ambulatoriali (CUPA) - Aziende del SSR	G00327	8237985	02/08/2021	Conclusa	Aggiudicata	-11,51%	14.338.192,20		14.338.192,20		
23	Laser a femtosecondi per oculistica AOR San Carlo	G00316	8193672	03/08/2021	Conclusa	Aggiudicata	-0,47%	430.000,00		430.000,00		
24	Screening oncologico - HPV-HR e sangue occulto	G00328	8247784	23/08/2021	Conclusa	Aggiudicata	-10,68%	966.920,00		966.920,00		
25	Sistema Informativo Tributi Regionali (SITR)	G00329	8275244	24/09/2021	Conclusa	Aggiudicata	-25,31%	481.800,00			481.800,00	
26	VACCINI obbligatori e raccomandati	G00330	8296634	30/09/2021	Conclusa	Aggiudicata	-4,83%	6.265.333,05	SS.AA.	6.265.333,05		
27	AQ Ossigenoterapia Domiciliare - ASP e ASM	G00331	8302810	06/10/2021	Conclusa	Aggiudicata	-4,70%	29.710.800,00	SS.AA.	29.710.800,00		

## GARE PUBBLICATE - ANNO 2021

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
28	Vigilanza armata Uffici SEL s.p.a.	G00332	8299554	06/10/2021	Conclusa	Aggiudicata	-25,74%	507.804,80	SS.AA.			507.804,80
29	AQ pronto intervento e manutenzione reti AL Lotti 1-3	G00334	8310552	18/10/2021	Conclusa	Aggiudicata	-28,49%	6.900.000,00	SS.AA.			6.900.000,00
30	Prodotti dietetici per nutrizione clinica	G00320	8195821	19/10/2021	Conclusa	Aggiudicata	-30,85%	6.802.653,60		6.802.653,60		
31	Sicurezza informatica sistemi infrastrutturali AOR San Carlo	G00333	8314799	25/10/2021	Conclusa	Aggiudicata	-0,28%	371.546,60	Id Prog. 2021_18	371.546,60		
32	Acceleratore Lineare IRCCS-CROB	G00335	8323394	03/11/2021	Conclusa	Aggiudicata	-18,89%	2.948.138,00		2.948.138,00		
33	Progettazione Ristrutturazione Diga Abate Alonia	G00336	8402165	31/12/2021	Conclusa	Aggiudicata	-49,92%	2.059.748,04				2.059.748,04
							<b>TOTALE 2021</b>	<b>315.963.957,04</b>	Importi	295.422.156,51	2.974.575,00	17.567.225,53
									N. gare	16	5	12

Legenda:

Gare concluse/annulate/revocate

Gare aggiudicate nel corso dell'anno 2023

## GARE PUBBLICATE - ANNO 2022

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
1	FORNITURA IN SERVICE DEL NOLEGGIO ATTREZZATURE PET-TC PER L'ASM	G00324	8332467	14/01/2022	conclusa	DESERTA		2.031.480,00		2.031.480,00		
2	ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA ASP e ASM	G00337	8459662	25/02/2022	conclusa	Aggiudicata	-8,59%	49.319.998,18		49.319.998,18		
3	SERVIZIO BAR RISTORO PER L'ASM e SAN CARLO DI POTENZA	G00340	8496671	30/03/2022	conclusa	Aggiudicata	-35,00%	1.656.000,00		1.656.000,00		
4	FORNITURA DI BENI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19 R ASM SAN CARLO CROB	G00342	8506485	06/04/2022	conclusa	Aggiudicata		19.032.448,00		19.032.448,00		
5	VACCINI ANTINFLUENZALI PER LE AZIENDE DEL SSR	G00341	8502830	08/04/2022	conclusa	Aggiudicata	-0,07%	1.764.325,00		1.764.325,00		
6	ELETTROPOMPE PER GLI IMPIANTI DI CASTELLUCCIO PATERNO E MARSICO	G00343	8508276	11/04/2022	conclusa	Aggiudicata	-4,00%	1.754.500,00				1.754.500,00
7	REALIZZAZIONE CATASTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE BASILICATA	G00338	8525868	20/04/2022	conclusa	Aggiudicata	-12,60%	806.451,61			806.451,61	
8	PROGETTO " ABITATO DI POLICORO ADEGUAMENTO DEI DEPURATORI CITTADINI "	G00344	8538081	22/04/2022	conclusa	Aggiudicata	-20,97%	1.953.724,52				1.953.724,52
9	SALA IBRIDA PER CARDIOCHIRURGIA E CHIRURGIA SAN CARLO	G00346	8553341	17/05/2022	conclusa	Aggiudicata	-0,003%	2.454.774,19		2.454.774,19		
10	PULIZIA AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA	G00349	8578932	25/05/2022	conclusa	Aggiudicata	-31,69%	1.155.194,69				1.155.194,69
11	FORNITURA IN SERVICE DEL NOLEGGIO ATTREZZATURE PET-TC PER L'ASM	G00348	8579008	31/05/2022	conclusa	Aggiudicata	-0,11%	1.303.480,00		1.303.480,00		
12	AFFIDAMENTO ATTIVITÀ VERIFICA PREVENTIVA PROGETTAZ. OPERE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	G00339	8584510	06/06/2022	conclusa	Aggiudicata	-63,83%	733.000,00				733.000,00
13	ACCORDO QUADRO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI AZIENDE SSR	G00350	8584043	15/06/2022	conclusa	Aggiudicata	-66,09%	38.198.727,00		38.198.727,00		



## GARE PUBBLICATE - ANNO 2022

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
14	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA DEL (SI-HR) R.B	G00353	8609751	22/06/2022	conclusa	Aggiudicata	-15,43%	208.678,75			208.678,75	
15	FORNITURA DIAGNOSTICHE RX AI PP.OO.POTENZA MELFI E VILLA D'AGRI	G00354	8631399	04/07/2022	conclusa	Aggiudicata	-0,02%	600.000,00		600.000,00		
16	PRONTO INTERVENTO SU RETI IDRICHE E FOGNARIE	G00358	8636106	11/07/2022	conclusa	Aggiudicata	-25,48%	43.434.546,00				43.434.546,00
17	MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA	G00361	8638000	11/07/2022	conclusa	Aggiudicata	-8,79%	6.429.539,28				6.429.539,28
18	PROGETTAZIONE INTEGRATA PER IL TRASFERIMENTO DELLA RISORSA IDRICA	G00360	8636133	22/07/2022	conclusa	DESERTA		1.262.976,00				1.262.976,00
19	MICROSCOPIO OPERATORIO 3D 'U.O.C DI OCULISTICA DELL'AOR POTENZA	G00364	8690059	31/08/2022	conclusa	Aggiudicata	-1,63%	300.000,00		300.000,00		
20	NOLEGGIO AUTOVEICOLI PER CONTO ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	G00365	8696984	05/09/2022	conclusa	DESERTA		965.880,00				965.880,00
21	VIGILANZA ARMATA+ALTRI SERVIZI UFFICI DEL COMUNE DI MATERA	G00366	8706487	12/09/2022	conclusa	Aggiudicata	-21,09%	421.630,63				421.630,63
22	FORNITURA GAS MEDICINALI E TECNICI ASM-AOR -POTENZA -ASP-CROB	G00367	8718701	21/09/2022	conclusa	Aggiudicata	-0,18%	15.337.388,73		15.337.388,73		
23	FORNITURA MEZZI PER LA COLONNA MOBILE EE.LL PROTEZIONE CIVILE	G00369	8736814	28/09/2022	conclusa	Aggiudicata	-23,77%	802.924,10			802.924,10	
24	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE N. 2 EDIFICI PUBBLICI - IRSINA	G00363	8756267	28/10/2022	conclusa	Aggiudicata	-6,09%	2.446.831,72				2.446.831,72
25	PROGETTAZIONE INTEGRATA PER IL TRASFERIMENTO DELLA RISORSA IDRICA	G00370	8756553	28/10/2022	conclusa	DESERTA		1.262.976,00				1.262.976,00

## GARE PUBBLICATE - ANNO 2022

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
26	APPARECCHI ANESTESIA MELFI, LAGONEGRO, VILLA D'AGRI E POTENZA AOR	G00371	8766758	28/10/2022	conclusa	Aggiudicata	-6,91%	840.000,00		840.000,00		
27	FORNITURA DI 2 LASER AD OLMIO UROLOGIA AOR SAN CARLO DI POTENZA	G00372	8780143	07/11/2022	conclusa	Aggiudicata	-4,00%	300.000,00		300.000,00		
28	GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE A.R.P.A.B	G00373	8822162	02/12/2022	conclusa	Aggiudicata	-25,82%	862.500,00				862.500,00
								<b>TOTALE 2022</b>		<b>133.138.621,10</b>	<b>1.818.054,46</b>	<b>62.261.668,21</b>
										13	3	12

Gare concluse/annulate/revocate

Gare aggiudicate nel corso dell'anno 2023

## Allegato 2

**Aggiornamento "Piani gara per la fornitura di beni e servizi  
per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali - anni 2015-2023  
(Conferenza di servizi del 20/02/2024)"**

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Fonte Finanziaria (definire)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
	1	2015_01	Prodotti Farmaceutici I° Edizione SDAPA	S/F	S.CARLO - ASP - ASM - CROB	ASM	Dott. L. Maggiore		3	€ 229.482.914,33	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott. L. Maggiore		Aggiudicata	
	2	2015_02	Pulizia ed altri servizi integrati SSR	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè		5	€ 84.861.555,58	SI		Non comunicata	Non comunicata	Avv. V. Telesca		Aggiudicata	
	3	2015_03	Manutenzioni ed impianti SSR	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASP	Arch. F. Cicale		5	€ 62.860.000,00	SI		Non comunicata	Non comunicata	Arch. F. Cicale		Aggiudicata	
	4	2015_04	Vigilanza armata SSR ed Enti vari	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASP	Arch. F. Cicale		5	€ 49.700.000,00	SI		Non comunicata	Non comunicata	Arch. F. Cicale		Aggiudicata	
	5	2015_05	Servizio di noleggio lavaggio di biancheria piana e confezionata	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM - CROB	Non comunicato		5	€ 23.319.240,50	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo		Aggiudicata	
	6	2015_06	Affidamento fornitura pasti	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB ARDSU	ASP - CROB	Dott.ssa P. Aloè		5	€ 36.900.093,98	SI		Non comunicata	Non comunicata	Arch. F. Cicale		Aggiudicata	
	7	2015_07	Materiale di medicazione	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM - CROB	Dott. L. Maggiore		3	€ 15.656.439,98	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott. L. Maggiore	Diversi lotti infruttuosi	Aggiudicata	
	8	2015_08	Fornitura ossigeno liquido per assistiti in ossigenoterapia domiciliare	S/F	ASP-ASM	ASP	Non comunicato		3	€ 16.489.628,92	SI		Non comunicata	Non comunicata	Geom. N. Locaspi		Aggiudicata	
	9	2015_10_a	Dispositivi medici per cardiologia (Stent)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	S.Carlo	Dott. R. Fiorilli		Differenti per le 5 procedure	€ 15.719.523,00	SI		Non comunicata	Scissa in 5 procedure differenti	Dott.ssa V. Locicero	Originariamente proposta come gara unica e successivamente scissa in 5 differenti procedure: 1) Stent 2) Pacemaker e defibrillatori 3) Emodinamica 4) Interventistica struttur. 5) Chirurg. Vascolare	Aggiudicate	
	10	2015_10_b	Dispositivi medici per cardiologia (Pacemaker)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	S.Carlo	Dott. P. Grieco		Differenti per le 5 procedure	€ 9.963.187,50	SI		Non comunicata	Scissa in 5 procedure differenti	Ing. E. Caimo	Originariamente proposta come gara unica e successivamente scissa in 5 differenti procedure: 1) Stent 2) Pacemaker e defibrillatori 3) Emodinamica 4) Interventistica struttur. 5) Chirurg. Vascolare	Aggiudicate	
	11	2015_10_c	Dispositivi medici per cardiologia (Emodinamica)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	S.Carlo	Dott. R. Fiorilli		Differenti per le 5 procedure	€ 8.406.150,00	SI		Non comunicata	Scissa in 5 procedure differenti	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo	Originariamente proposta come gara unica e successivamente scissa in 5 differenti procedure: 1) Stent 2) Pacemaker e defibrillatori 3) Emodinamica 4) Interventistica struttur. 5) Chirurg. Vascolare	Aggiudicate	
	12	2015_10_d	Dispositivi medici per cardiologia (Strutturale PFO)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	S.Carlo	Dott. RA Osanna		Differenti per le 5 procedure	€ 36.836.640,00	SI		Non comunicata	Scissa in 5 procedure differenti	Avv. V. Telesca	Originariamente proposta come gara unica e successivamente scissa in 5 differenti procedure: 1) Stent 2) Pacemaker e defibrillatori 3) Emodinamica 4) Interventistica struttur. 5) Chirurg. Vascolare	Aggiudicate	
	13	2015_10_e	Dispositivi medici per chirurgia vascolare	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	S.Carlo	Dott. P. Cappiello		Differenti per le 5 procedure	€ 11.576.100,00	SI		Non comunicata	Scissa in 5 procedure differenti	Ing. E. Caimo	Originariamente proposta come gara unica e successivamente scissa in 5 differenti procedure: 1) Stent 2) Pacemaker e defibrillatori 3) Emodinamica 4) Interventistica struttur. 5) Chirurg. Vascolare	Aggiudicate	
	14	2015_11	Ausili protesici	S/F	ASP-ASM-CROB-S.CARLO	ASP	Dott. A. Pennacchio	€ 10.164.722,52	4	€ 40.658.890,08	SI		Non comunicata	Non comunicata	Ing. G. Bianchini	Con 20BD.2022/D.00176 del 29/9/2022 aggiudicazione efficace dei lotti 2/3/5/6/8. In attesa di efficacia del lotto 4. Il lotto 9 annullato dal Consiglio di Stato. I lotti 1 e 7 sono infruttuosi. SIMOG: 6925706 - G00089	Aggiudicata	
	15	2015_12	Service centri trasfusionali	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.Carlo	Non comunicato		5	€ 19.898.125,00	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo		Aggiudicata	
	16	2015_14	Dispositivi per cardiocirurgia	S/F	S.CARLO	S.Carlo	Non comunicato		3+2	€ 13.780.173,00	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo		Aggiudicata	
	17	2015_15	Prodotti Farmaceutici PHT	S/F	ASP - ASM	ASM	Dott. L. Maggiore		3	€ 42.253.612,06	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott. L. Maggiore		Aggiudicata	
	18	2015_16	Dispositivi per neurochirurgia	S/F	S.CARLO - ASM	S.Carlo	Non comunicato		3	€ 3.176.340,00	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo		Aggiudicata	
	19	2015_17	Materiale specialistico per dialisi	S/F	S.CARLO-ASP-CROB-ASM	ASM	Dott. Santarsia	€ 2.046.950,40	5	€ 10.234.752,00	Non dichiarata		Non comunicata	31/03/2016 31/07/2019	Ing. G. Bianchini	Le Aziende hanno aderito all'AQ CONSIP pertanto è necessario adeguare la documentazione tecnica ai fabbisogni residui Tenutasi la CdS il 03/12/2019 AGGIUDICAZIONE (NON EFFICACE) approvata con DD 235 del 06/10/2021. Efficacia dell'aggiudicazione prevista entro il 31/10/2021	Aggiudicata	
	20	2015_18	Fornitura del materiale per ortopedia per le aziende sanitarie della Regione Basilicata	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Non comunicato		5	€ 51.895.250,00	SI		Non comunicata	Non comunicata	Avv. M. Gillo		Aggiudicata	
	21	2015_19	Prodotti Farmaceutici II° Edizione SDAPA	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Dott. L. Maggiore		2,5	€ 71.052.657,51	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott. L. Maggiore		Aggiudicata	
	22	2015_20	Magazzino centralizzato beni sanitari e non sanitari HUB	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Non comunicato		9	€ 25.213.200,00	SI		Nuovo contratto	Non comunicata	Rag. E. Ricciardi		Aggiudicata	
	23	2015_22	Vaccini** (annuale) 2016	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	ASP	Dott. A. Pennacchio		1	€ 3.838.755,52	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott. L. Maggiore		Aggiudicata	
	24	2017_01	Service PET/TC mobile	S/F	ASM S.CARLO	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara		12+12	€ 1.423.020,00	SI		Non comunicata	28/02/17	Ing. L. Battista		Aggiudicata	
	25	2017_02	Fornitura TNT	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara		5	€ 8.305.793,00	SI		Non comunicata	28/02/17	Ing. E. Caimo		Aggiudicata	
	26	2017_03	Acquisto ambulanze ed automediche per 118	S/F	ASP	ASP	Arch. F. Cicale		1	€ 4.099.650,00	SI		Non comunicata	31/03/17	Geom. N. Locaspi		Aggiudicata	
	27	2017_04	Servizio di manutenzione adeguata, MAC, MEV, assistenza e consulenza del nodo regionale della banca dati bovina informatizzata e del nodo applicativo regionale delle banche dati dei servizi veterinari e del SIAN	S/F	ASM-ASP-REG_BAS	REG_BAS	Dott. G. Salvatore		3	€ 820.938,94	SI		Non comunicata	31/03/17	Geom. N. Locaspi		Aggiudicata	
	28	2017_05	Servizi assicurativi (escluso RCT)	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB ATER PZ	ASP	Dott. A. Pennacchio		3	€ 2.259.054,36	SI		Non comunicata	31/03/17	Arch. E.P. Petrucci	Aggiunta anche fabbisogno dell'ATER di Potenza	Aggiudicata	
	29	2017_06	App. Elettromedicali - gamma camere	S/F	ASP-CROB-S.CARLO	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara		-	€ 1.360.000,00	SI		Non applicabile	31/03/17	Ing. L. Battista Ing. E. Caimo	Aut deroga CROB (72183/20A8)	Aggiudicata	
	30	2017_07	Telemedicina (Sperimentale)	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASP	Dott. N. Mazzeo		-	-	SI		Non comunicata	31/03/17	Ing. L. Battista	importo a base di gara € 286.000,00	Infruttuosa	
	31	2017_08	Tesoreria	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASP	Dott. A. Pennacchio Dott. G. Rinaldi		5	€ 1.652.500,00	SI		Non comunicata	31/03/17	Avv. V. Telesca	prima gara: deserto lotto sanità, aggiudicato lotto consorzi di bonifica - seconda gara: deserta - terza gara: deserta in data 06.02.2020. Deve essere riprogrammata	Conclusa - Deserta	
	32	2017_09	Servizi manutenzione app. Elettromedicali	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.Carlo	Ing. G. Spera		5	€ 48.913.868,86	SI		Non comunicata	30/04/17	Ing. G. Bianchini		Aggiudicata - Sottoscritte le convenzioni	
	33	2017_10	Disp. Medici - Endoscopia	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara		5	€ 9.235.900,00	SI		Non comunicata	30/04/17	Ing. E. Caimo	Originariamente l'importo segnalato in CdS era di € 20.054.600,00 Aut deroga ASM (68575/20A8 21/04/2017)	Aggiudicata	
	34	2017_11	Service anatomia patologica	S/F	ASM - CROB - S.CARLO	CROB	Dott.ssa P. Aloè		5	€ 5.310.000,00	SI		Non comunicata	30/04/17	Avv. M. Gillo		Aggiudicata	
	35	2017_12	Vaccini 2017	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	ASP	Dott. A. Pennacchio		1	€ 5.669.292,37	SI		Non comunicata	30/04/17	Dott. L. Maggiore		Aggiudicata	
	36	2017_13_a	Gara telematica mediante procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici e aghi per le aziende sanitarie della Regione Basilicata per la durata di anni 5	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè	€ 11.951.241,81	5	€ 59.756.209,05	SI		Non comunicata	30/04/2017 31/03/2018 31/05/2019	Avv. V. Telesca	Inizialmente riprogrammata e suddivisa in due procedure: 1 (Dispositivi di uso comune, ecc.) / 2 (Fornitura di aghi e siringhe) Attualmente (2019) suddivisa la parte "Dispositivi di uso comune" in 4 diverse procedure	Aggiudicata	
	37	2017_13_b	Fornitura di guanti per le aziende sanitarie della Regione Basilicata	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè	€ 2.285.550,00	5	€ 11.427.750,00	SI		Non comunicata	30/04/2017 31/03/2018 31/05/2019	Avv. V. Telesca	Inizialmente riprogrammata e suddivisa in due procedure: 1 (Dispositivi di uso comune, ecc.) / 2 (Fornitura di aghi e siringhe) Attualmente (2019) suddivisa la parte "Dispositivi di uso comune" in 4 diverse procedure	Aggiudicata	
	38	2017_13_bis	Dispositivi medici - aghi e siringhe	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè		5	€ 7.456.281,50	SI		Non comunicata	30/11/17	Avv. V. Telesca	Riprogrammata - Procedura divisa in due: 1 (Dispositivi di uso comune, ecc.) / 2 (Fornitura di aghi e siringhe)	Aggiudicata	
	39	2017_13_c	Fornitura di pannolini, mutande e traverse per le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè	€ 782.485,00	5	€ 3.912.425,00	SI		Non comunicata	30/04/2017 31/03/2018 31/05/2019	Avv. V. Telesca	Inizialmente riprogrammata e suddivisa in due procedure: 1 (Dispositivi di uso comune, ecc.) / 2 (Fornitura di aghi e siringhe) Attualmente (2019) suddivisa la parte "Dispositivi di uso comune" in 4 diverse procedure	Aggiudicata	

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Fonte Finanziaria (definire)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indicazione CdS
	40	2017_13_d	Fornitura di stent per le aziende sanitarie della Regione Basilicata	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè	€ 136.900,00	5	€ 684.500,00	SI		Non comunicata	30/04/2017 31/03/2018 31/05/2019	Avv. V. Telesca	Inizialmente riprogrammata e suddivisa in due procedure: 1 (Dispositivi di uso comune, ecc.) / 2 (Fornitura di aghi e siringhe) Attualmente (2019) suddivisa la parte "Dispositivi di uso comune" in 4 diverse procedure	Aggiudicata	
	41	2017_15	Farmaci (lotti infruttuosi, nuovi farmaci e nuovi farmaci generici, radiofarmaci se compatibili) - Ed. 3 SDAPA	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Dott. L. Maggiore		1,67	€ 121.860.524,36	SI		Non comunicata	31/05/17	Dott. L. Maggiore	Documentazione tecnica redatta e trasmessa alla SUA (prot. 20170042011 del 08-06-2017) come parzialmente rettificata con verbale del 27-07-2017	Aggiudicata	
	42	2017_16	Service laboratorio analisi + VEQ + Sistemi di prelievo	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.Carolo	Dott. N. Di Chiara	€ 11.138.010,00	5	€ 55.690.050,00	SI		Non comunicata	31/05/17 31/01/18	Arch. E.P. Petrucci	Aut deroga ASM (68583/20AB 21/04/2017) e S.CARLO (68454/20AB 21/04/2017) N.B. L'importo a base d'asta della gara indetta è pari ad € 58.159.345,00	Aggiudicata	
	43	2017_17	Disp. Medici - Fisiopatologia riproduzione (Procreazione medicalmente assistita)	S/F	ASM - S.CARLO	S.Carolo	Dott. N. Di Chiara		5	€ 1.686.908,58	SI		Non comunicata	31/05/17 31/01/18	Dott.ssa V. Locicero	Aut deroga S.CARLO (68465/20AB 21/04/2017) - S.CARLO comunica, in data 17/11/2017, che procederà con affidamento diretto. - Cambiata idea e trasmessa doc. tecnica per cui è in corso il tavolo.	Aggiudicata	
	44	2017_18_a	Gestione impianti gas medicale (ex Gestione impianti gas medicali e fornitura gas medical)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Ing. R. Giorgi	€ 819.406,20	5+1	€ 4.097.031,00	SI		Non comunicata	30/06/2017 30/04/2019 30/06/2020	Geom. N. Locaspi	Con verbale n. 4 del 15/09/2017 è stato concordato di svolgere due distinte procedure di gara (fornitura di gas e manutenzione degli impianti di distribuzione). Con nota 183155/20A2 del 20/11/2017 l'AOR S.CARLO ha comunicato che intende procedere alla proroga dell'affidamento per tre anni. In data 28.11.2017 la seduta del tavolo tecnico convocata è stata disertata da 7 componenti su 9. Aggiudicata con DD 2080.2022/D.00047 del 12 aprile 2022 - SIMOG: 8217326 - G00325	Aggiudicata	
	45	2017_18_b	Servizio fornitura Gas (ex Gestione impianti gas medicali e fornitura gas medical)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Ing. R. Giorgi	€ 4.574.990,41	5+1	€ 18.299.961,64	SI		Non comunicata	30/06/2017 30/04/2019 30/06/2020 31/03/2021 30/03/2022	Geom. N. Locaspi	Con verbale n. 4 del 15/09/2017 è stato concordato di svolgere due distinte procedure di gara (fornitura di gas e manutenzione degli impianti di distribuzione). Con nota 183155/20A2 del 20/11/2017 l'AOR S.CARLO ha comunicato che intende procedere alla proroga dell'affidamento per tre anni. In data 28.11.2017 la seduta del tavolo tecnico convocata è stata disertata da 7 componenti su 9.	Aggiudicata	
	46	2017_19	App. laboratorio - Microscopio	S/F	CROB	CROB	Ing. M. Lauletta		-	€ 300.000,00	SI		Non comunicata	30/06/17	Ing. G. Bianchini	Aut deroga CROB (95944/20AB 08/06/2017)	Stralciata	
	47	2017_20	Fornitura di piattaforma genomica-computazionale	S/F	CROB	CROB	Ing. M. Lauletta		-	€ 331.052,00	SI		Non comunicata	30/06/17	Ing. G. Bianchini	Aut deroga CROB (72183/20AB 28/04/2017)	Stralciata	
	48	2017_21	App. Elettromedicali - Linee	S/F	ASM	ASM	Ing. N.P. Sannicola Ing. T. Bengiovanni		-	€ 2.750.000,00	No, da reperire 1-M€		Non comunicata	31/07/17 31/03/18 CdS 29/01/2019	Geom. N. Locaspi	Unificata con la 2018_12L - Gara Mista	VEDI PROCEDURA 2018_12L	
	49	2017_22	Sistemi di prelievo	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Ing. T. Bengiovanni		-	€ 12.900.000,00	SI		Non comunicata	31/07/17	Dott.ssa V. Locicero	Fabbisogno confluito nella gara n. 2017_16	Stralciata	
	50	2017_23	Servizi manutenzione HW/SW	S/F	ASP-CROB-S. CARLO	S.Carolo	Dott. F. Labroca		-	€ 7.696.900,00	SI		Non comunicata	31/07/2017 ELIMINARE	Dott. A. Tedesco		Cancellata	
	51	2017_24	Disp. Medici - Odontoiatria	S/F	ASP ASM	ASP ASM	Dott. C. Lopardo Dott. Barbetti	€ 70.000,00	5	€ 350.000,00	SI		Non comunicata	31/07/2017 30/03/2018 30/06/2019 30/09/2020	Avv. M. Gillo	Sollecitato il referente Capofila da parte dell'RdP della SUA-RB. Con nota 11843 del 31/01/2020 (reg.17827 del 31/01/2020) l'ASP (Capofila) dichiara di non essere più interessata alla procedura (fabbisogno < € 15.000/anno).	Eliminata	
	52	2017_25	App. Elettromedicali - Radiologia - SDAPA	S/F	ASM-CROB-ASP	ASM	Ing. T. Bengiovanni		-	€ 1.665.131,00	SI		Non comunicata	30/09/17 31/03/18	Ing. E. Caimo	Si è deciso di procedere a distinte procedure di gara (una parte tramite SDAPA). In corso l'ultima revisione dei documenti tecnici. Aut deroga ASM (68593/20AB 21/04/2017) Specifiche condivise con AOR S.CARLO ed ASP che ha mostrato interesse con nota prot. n. 39045 del 16.04.2018. Fondi: 1) AdP (ex DGR 1670/2015 e 472/2017), 2) Regionali (DGR 1486/2015, 134/2017 e 473/2017)	Aggiudicata	
	53	2017_25_bis	App. Elettromedicali - Radiologia - TAC	S/F	ASM S.CARLO	ASM	Ing. T. Bengiovanni		-	€ 1.700.967,59	SI		Non comunicata	30/09/17 31/03/18	Ing. E. Caimo		Aggiudicata	
	54	2017_26	App. Elettromedicali - Endoscopia	S/F	ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Ing. T. Bengiovanni		-	€ 3.770.000,00	SI		Non comunicata	30/09/17 31/03/18	Ing. E. Caimo	AOR S.CARLO ha chiesto l'aut. In deroga, stante l'urgenza ed il fatto di avere già pronta la documentazione tecnica per il proprio fabbisogno. SUA-RB ha diniegata aut deroga AOR (161237/20AB del 12/10/2017) chiedendo all'AOR di contribuire ad accelerare i tempi per la gara aggregata.	Aggiudicata	
	55	2017_27	Arredi - sanitari	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	ASM	Ing. T. Bengiovanni		1	€ 1.261.460,00	SI		Non comunicata	30/09/17 30/03/18	Arch. E.P. Petrucci	ASP che non ha mostrato interesse con nota prot. n. 39045 del 16.04.2018. S.Carolo non ha interesse nota prot. n. 18095 del 16.04.2018. Fondi: 1) AdP (ex DGR 1670/2015 e 472/2017) ricevuta documentazione ASM con nota n. 19829 del 30.03.2018	Aggiudicata	
	56	2017_28	App. Elettromedicali - terapia intensiva (ventilatori polmonari)	S/F	ASM - S.CARLO	ASM	Ing. T. Bengiovanni		-	€ 300.000,00	SI		Non comunicata	30/09/17 30/03/18	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo	Ultima seduta tavolo tecnico 13/09/2017. Ricevuta documentazione ASM con nota n. 19829 del 30/03/2018 Originariamente l'importo segnalato in CdS era di € 793.553,72 Documentazione trasmessa con nota prot. 20160074985 del 09/08/2017. ASP che non ha mostrato interesse con nota prot. n. 39045 del 16/04/2018. Fondi: AdP (ex DGR 1670/2015 e 472/2017) - S.Carolo rinuncia con nota n. 20180019829 del 30/03/2018 come da nota della Sanità prot. n. 89803 del 23/05/2018.	Aggiudicata	
	57	2017_29	Sviluppo infrastruttura informatica per FSE	S/F	S. CARLO	S.Carolo	Dott. F. Labroca		-	€ 760.330,58	SI		Non comunicata	30/09/17	Geom. N. Locaspi	La gara è stata inglobata nella n. 2017_40	Stralciata	
	58	2017_30	App. Elettromedicali - Monitor	S/F	ASM ASP-S.CARLO	ASM	Ing. T. Bengiovanni	€ 569.000,00	-	€ 569.000,00	SI		Non comunicata	30/09/17 31/03/18	Ing. G. Bianchini	In fase di redazione. L'ASP potrebbe non essere più interessata (non ha più presidi per acuti). S.Carolo non ha interesse nota prot. n. 18095 del 16/04/18. Fondi regionali (DGR 1486/2015 e 134/2017)	Aggiudicata	
	59	2017_31	App. Elettromedicali - Tavoli operatori	S/F	ASM	ASM	Ing. T. Bengiovanni		-	€ 1.092.000,00	SI		Non comunicata	30/09/17	Ing. L. Battista	Trasmessa doc tecnica (20160074985 del 09/08/2017) Unificata con 2017_33 (Tavolo tecnico 18/09/2017)	Aggiudicata	
	60	2017_32	App. Elettromedicali - Sialitiche	S/F	ASM-ASP-S.CARLO	ASM	Ing. T. Bengiovanni		-	€ 335.500,00	SI		Non comunicata	30/09/17 31/03/18	Ing. G. Bianchini	Ricevuta documentazione ASM con nota n. 19829 del 30/03/2018. L'ASP non ha mostrato interesse con nota prot. n. 39045 del 16/04/2018 (non ha più presidi per acuti). S.Carolo non ha interesse nota prot. n. 18095 del 16/04/2018.	Aggiudicata	
	61	2017_33	App. Elettromedicali - Anestesia	S/F	ASM	ASM	Ing. T. Bengiovanni		-	vedi gara 2017_32	SI		Non comunicata	30/09/17	Ing. L. Battista Ing. E. Caimo	Trasmessa doc tecnica (20160074985 del 09/08/2017). AOR S.CARLO sta valutando eventuale interesse Unificata con 2017_31 (Tavolo tecnico 18/09/2017)	Aggiudicata	
	62	2017_34	App. Elettromedicali - Cardiologia	S/F	S. CARLO	S.Carolo	Dott. N. Di Chiara		-	€ 440.126,46	SI		Non comunicata	30/09/17	Dott.ssa T. Andriani		Stralciata	
	63	2017_35	Cancelleria e stampati	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè		3	€ 4.515.693,90	SI		Non comunicata	30/09/17	Arch. E.P. Petrucci		Aggiudicata	
	64	2017_36	RIS PACS regionale	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.Carolo	Dott. F. Labroca		-	€ 4.333.000,00	Non dichiarata		Non comunicata	28/02/18	Dott. A. Tedesco	integrata sul presupposto che la documentazione tecnica venisse elaborata dal capofila ed inoltrata alla SUA-RB	Aggiudicata	
	65	2017_37	Accordo quadro relativo all'esplicitamento dell'assistenza domiciliare respiratoria	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott. A. Pennacchio		4	€ 7.089.000,00	SI		Non comunicata	31/01/18	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo	Integrata con richiesta DG Sanità (31950/13A2 del 23/02/2017). L'Azienda capofila non ha dato riscontro alla nota di ricognizione 121140/20AB del 24/07/2017. Ricevuta documentazione con nota n. 41114 del 20.04.2018. Nuova nota ASP n. 51169 del 17.05.2018.	Gara annullata dal TAR	
	66	2017_38	Servizio di manutenzione ed assistenza full-risk degli ausili protesici di proprietà dell'ASP concessi in uso per assistenza ventilatoria domiciliare	S/F	ASP - ASM	ASP	Dott. A. Pennacchio		3	€ 513.792,00	SI		Non comunicata	31/01/18	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo	Ricevuta documentazione con nota n. 41114 del 20/04/2018 e integrata con nota prot. n. 55315 del 29/05/2018. Integrata con richiesta DG Sanità (31950/13A2 del 23/02/2017). L'Azienda capofila non ha dato riscontro alla nota di ricognizione 121140/20AB del 24/07/2017	Aggiudicata	
	67	2017_39	Servizio di brokeraggio	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.Carolo	Dott. D. Falasca		5	€ 3.274.851,00	SI		Non comunicata	31/03/18	Arch. E.P. Petrucci	Richiesta DG Sanità con nota 126803/12A2 del 03/08/2017	Aggiudicata	

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Fonte Finanziaria (definire)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indicazione CdS
	68	2017_40	Servizi manutenzione evolutiva (MEV), correttiva (MAC) ed adeguativa del sistema di gestione del fascicolo sanitario elettronico regionale integrato al SISR della Regione Basilicata - DPCM 20/09/2015 n. 178, ex art. 12 L. 17 dicembre 2012 n. 221 e art. 13 comma 2-quater, L. 9 agosto 2013 n. 98	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	REG_BAS	Dott. M. Recine		-	€ 4.815.000,00	Non dichiarata		Non comunicata	30/06/2019	Geom. N. Locaspi	Richiesta DG Sanità con nota 82767/13A2 del 17/05/2017 DGR 856 del 04/08/2017. Manca relazione ex art. 68 del D.Lgs. 82/2005 "Analisi comparativa delle soluzioni" per cui è in corso il Tavolo tecnico delle AA.SS. interessate. Con DD 8 del 21/01/2020 si è proceduto all'adesione ad un AQ di Consip	Cancellata	
	69	2017_41	Servizi per evoluzione del SISB sistema informativo sociale regionale ed integrazione con il fascicolo sociale informatizzato per la rilevazione dei bisogni sociali e la gestione del sistema di welfare regionale	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	REG_BAS	Non comunicato		-	€ 1.993.000,00	Non dichiarata		Non comunicata	Non comunicata	Geom. N. Locaspi	Richiesta DG Sanità con nota 82767/13A2 del 17/05/2017 DGR 859 del 04/08/2017	Aggiudicata	
	70	2017_42	Rete digitale di radiocomunicazione per il servizio di emergenza territoriale sanitaria "118"	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	REG_BAS	Non comunicato		5	€ 9.630.800,00	SI		Non comunicata	Non comunicata	Geom. N. Locaspi	Richiesta DG Sanità con nota 82767/13A2 del 17/05/2017 DGR 857 del 04/08/2017	Aggiudicata	
	71	2017_43	Attivazione di un sistema di telemedicina per le attività di ADI e presa in carico del paziente cronico	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott. N. Mazzeo		-	€ 3.275.000,00	Non dichiarata		Non comunicata	30/09/2018 30/06/2019	ex Ing. L. Battista	Richiesta DG Sanità con nota 82767/13A2 del 17/05/2017 DGR 840 del 04/08/2017 Procedura inclusa nella 2018_13	Non ricevuta documentazione tecnica	
	72	2017_44	Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, relazione geologica, progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento dei servizi di direzione dei lavori, misure e contabilità, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi all'intervento denominato "Ampliamento del P.O. di Lagonegro per l'adeguamento e la messa in sicurezza dei reparti"	S/F	ASP-S.CARLO	S.CARLO-ASP	Arch. F. Cicale		1	€ 773.950,60	SI		Non comunicata	Non comunicata	Geom. N. Locaspi	Comunicata con nota 24987/13A2 del 10/02/2017 (vedi verbale CdS 20/01/2017 e seguenti, pag. 18)	Aggiudicata	
	73	2017_45	Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione di un nuovo padiglione M7 da adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente vulnerabili dell'Azienda Ospedaliera regionale San Carlo di Potenza	S/F	S.CARLO	S.Carlo	Ing. G. Spera		1	€ 982.327,63	SI		Non comunicata	Non comunicata	Geom. N. Locaspi	Comunicata con nota 24987/13A2 del 10/02/2017 (vedi verbale CdS 20/01/2017 e seguenti, pag. 18)	Aggiudicata	
	74	2017_46	Affidamento dei lavori di ristrutturazione dei locali ubicati alle quote 745,08 e 748,54 del Padiglione B per l'alloggiamento dell'IRCCS di Reumatologia presso l'AOR San Carlo di Potenza	S/F	S.CARLO	S.Carlo	Ing. G. Spera		1	€ 246.400,85	SI		Non comunicata	Non comunicata	Geom. N. Locaspi	Comunicata con nota 24987/13A2 del 10/02/2017 (vedi verbale CdS 20/01/2017 e seguenti, pag. 18)	Aggiudicata	
	75	2018_01	Dispositivi per radiologia e neuroradiologia interventistica	S/F	ASM-S.CARLO	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara	€ 5.361.311,12	5	€ 26.806.555,60	SI		10/07/1905	31/01/2018 30/06/2019	Ing. E. Caimo	Documentazione consegnata dal S.Carlo con prot. n. 20180003885 del 25.01.2018 Ricontrata con nota SUA-RB prot. n. 178368 del 23.10.2018. Aggiudicata con DD 208D.2022/D.00155 del 6/9/2022 SIMOG 8042977 - G00298 162 lotti di cui deserti i lotti 25, 26 e 40 e infruttuosi i lotti 51 e 82	Aggiudicata	
	76	2018_01 L	Servizi progettazione - Completamento per l'adeguamento ed ampliamento del P.O. di Villa D'Agri - I Stralcio Funzionale. Adeguamento ai fini dei requisiti per l'accreditamento istituzionale	S/F	S.CARLO	S.Carlo	Ing. G. Spera		1	€ 234.959,59	SI	SI	Non comunicata	30/06/17	Geom. N. Locaspi	Nominata commissione 06/09/2018	Aggiudicata	
	77	2018_02	Gestione delle attività di supporto agli screening regionali	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Ing. M. Lauletta	€ 1.938.377,40	5	€ 9.691.887,00	SI		2018	31/03/18	Dott.ssa T. Andriani		Aggiudicata	
	78	2018_02 L	Lavori di costruzione di un nuovo padiglione M7 presso l'ospedale "S. Carlo" di Potenza ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente vulnerabili	L	S.CARLO	S.Carlo	Ing. G. Spera		-	€ 18.364.197,00	SI	SI	Non applicabile	dipende dal completamento della gara in corso per i relativi servizi tecnici ELIMINARE	Ufficio Appalti di Lavori	Progettazione aggiudicata per € 533.698,60 il 20/12/2017	Eliminata	
	79	2018_03	Manutenzione Software "Gestione del Personale"	S/F	ASP-ASM-CROB	ASP	Dott. N. Mazzeo	€ 187.500,00	2+2	€ 750.000,00	SI		2017	31/01/2018 30/06/2019	Dott. A. Tedesco		Aggiudicata	
	80	2018_03 L	Lavori di riqualificazione degli impianti tecnologici del plesso ospedaliero "S. Carlo" di Potenza	L	S.CARLO	S.Carlo	Ing. G. Spera		1	€ 1.825.598,15	SI	SI	Non applicabile	28/02/18	Ing. R. Onorati	Apertura busta A 04/07/2018	Aggiudicata	
	81	2018_04	Servizi di ausiliario per trasporto integrativo (Trasporto provette, medicinali, pazienti, ecc. escluso il trasporto di rifiuti)	S/F	ASM-S.CARLO	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara	€ 970.000,00	5	€ 4.850.000,00	SI		2018	10/02/2018 31/03/2019	Aww-M-Gilio Ing. E. Caimo	Buste economiche aperte in data 22/09/2021. In corso la verifica di anomalia delle offerte. Aggiudicata, in corso verifica requisiti per efficacia (DD 245 del 20.10.2021)	Aggiudicata	
	82	2018_04 L	Interventi di riqualificazione funzionale di ambienti sanitari, di miglioramento prestazionale e mitigazione del rischio sismico di alcuni padiglioni dell'Ospedale "S. Carlo" di Potenza	L	S.CARLO	S.Carlo	Ing. G. Spera		1	€ 1.080.230,19	SI	SI	Non applicabile	28/02/18	Ing. R. Onorati		Aggiudicata	
	83	2018_05	Fornitura di strumentario ed accessori per chirurgia robotica. (Materiali infungibili)	S/F	S.CARLO	S.Carlo	Dott. C. Misuriello	€ 876.000,00	1	€ 876.000,00	SI		2018	10/02/2018 31/03/2019	Ing.-L. Battista Ing. E. Caimo		Aggiudicata	
	84	2018_05 L	Lavori di integrazione e adeguamento della rete elettrica di emergenza del plesso ospedaliero San Carlo di Potenza	L	S.CARLO	S.Carlo	Ing. G. Spera		-	€ 1.229.323,77	SI	SI	Non applicabile	28/02/2018		Riposizionata come gara servizi e forniture cfr nota prot. n. 21573/13A2 del 05.02.2018 Sanità	Stralciata	
	85	2018_06	Prodotti alimentari, bevande e prodotti affini (vincolata all'aggiudicazione della gara SUA-RB ristorazione)	S/F	S.CARLO	S.Carlo	Dott.ssa L. Villani	€ 1.290.852,98	1	€ 1.290.852,98	SI		2018	28/02/18	Arch. E.P. Petruzzi	Cancellata con nota prot 20180052576 del 05/12/2018 (acq. Prot. Reg. 207398/20A2 del 07/12/2018), in seguito all'aggiudicazione della gara ristorazione	Cancellata	
	86	2018_06 L	Ampliamento del P.O. di Lagonegro per l'adeguamento e la messa in sicurezza dei reparti (ex - Lavori di "Costruzione nuovo corpo di fabbrica PO Lagonegro")	L	ASP	ASP	Arch. F. Cicale		-	€ 10.158.993,78	SI	NO	Non applicabile	30/06/2020 30/06/2021 28/02/2022	Ufficio Appalti di Lavori RUP ONORATI	18/01/2018 aggiudicazione efficace del servizio di progettazione Vecchia denominazione: Lavori di "Costruzione nuovo corpo di fabbrica PO Lagonegro" Vecchio importo : € 9.225.000,00 E' stata disposta l'aggiudicazione efficace del servizio di progettazione il 18/01/2018. Tavoli tecnici in corso. Richiesta integrazione documentale non ancora ricevuta	Stralciata in quanto lavori	
	87	2018_07	Fornitura disinfettanti	S/F	S.CARLO - ASM - CROB - ASP	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara	€ 1.286.117,50	5	€ 6.430.587,50	SI		2018	28/02/18	Arch. E.P. Petruzzi	Riaperta la revisione della gara a seguito dell'incontro del 05/12/2018 Con nota 68204 del 17/12/2019 l'ASM manifesta la volontà di aderire alla procedura di gara Con nota del 13/12/2019 il CROB manifesta la volontà di aderire alla procedura di gara ma non comunica l'importo economico del suo fabbisogno I fabbisogni annui sono: S.Carlo 639.300 - ASM 463.150 - CROB 121.337,50 - ASP 52.330	Aggiudicata	
	88	2018_07 L	Miglioramento/Adeguamento sismico del vecchio plesso ospedaliero di Chiaromonte + Realizzazione di Residenze per bambini ed adolescenti con disturbi dello spettro autistico e spazi per l'Alcolgia presso il Presidio di Chiaromonte	L	ASP	ASP	Arch. F. Cicale		-	€ 2.900.000,00	SI	SI	Non applicabile	31/03/2018 30/09/2020	Ufficio Appalti di Lavori	Progetto in attesa di autorizzazione dal Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata. Nel 2023 l'ASP chiede di stralciare dal piano gare. Non ricevuta documentazione tecnica Eliminata		
	89	2018_08	Fornitura e manutenzione del software di gestione laboratori analisi (LIS)	S/F	S.CARLO - ASM	S.Carlo	Dott. F. Labroca	€ 900.000,00	5	€ 4.500.000,00	SI		2018	28/02/2018 30/04/2019	Dott. A. Tedesco		Aggiudicata	
	90	2018_08 L	Servizi di progettazione - "Realizzazione Casa della salute di Senise"	S/F	ASP	ASP	Arch. F. Cicale		-	€ 250.000,00	SI	SI	Non applicabile	30/04/2018 31/10/2020 30/09/2021 30/06/2022	Ufficio Appalti di Lavori	Non ricevuta documentazione tecnica Nel 2023 l'ASP chiede di stralciare dal piano gare. L'intervento sarà realizzato mediante adesione all'Accordo Quadro Inviatalia PNRR Eliminata		
	91	2018_09	Sistema automatico per la determinazione dell'HPV su prelievi cervico-vaginali e di sistemi analitici in service per la ricerca di sangue occulto nelle feci nell'ambito del programma di screening regionale	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Ing. M. Lauletta	€ 250.000,00	5	€ 1.250.000,00	SI		2018	31/03/2018 31/07/2019 30/03/2020 31/03/2021	Dott.ssa T. Andriani	Legata alla gara screening 2018_02	Aggiudicata	

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Fonte Finanziaria (definire)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione Cds	
SEZIONE A	92	2018_09_L	Gara lavori "Realizzazione Casa della salute di Senise"	L	ASP	ASP	Arch. F. Cicale		-	€ 2.040.000,00	SI	SI	Non applicabile	30/11/2018 30/06/2021 31/03/2022	Ufficio Appalti di Lavori	Legata alla gara 2018_08L	Documentazione disponibile dopo realizzazione intervento 2018_08L Non ricevuta documentazione tecnica Nel 2023 l'ASP chiede di stralciare dal piano gare. L'intervento sarà realizzato mediante adesione all'Accordo Quadro Inviatalia PNRR Eliminata		
	93	2018_10	Affidamento dei servizi di governo, di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici territorio del Lagonegrese e Ospedale di Lagonegro	S/F	ASP-S.CARLO	ASP	Arch. F. Cicale	€ 740.000,00	5	€ 3.700.000,00	SI		2017	31/03/18	Dott. G. Grisolia	Un concorrente inizialmente escluso ha proposto ricorso, respinto dal TAR nel 2019 e accolto dal Cds nel 2020. Il concorrente è stato quindi riammesso con provvedimento del 12/10/2020	Buste economiche aperte in data 09/08/2021. In corso la verifica di anomalia delle offerte. Aggiudicata, in corso verifica requisiti per efficacia (DD 250 del 25.10.2021)		
	94	2018_10_L	Servizi di progettazione - "Ristrutturazione Polo riabilitativo a Maratea"	S/F	ASP	ASP	Arch. F. Cicale		-	€ 300.000,00	SI	NO	Non applicabile	31/03/2018 31/03/2022	Ufficio Appalti di Lavori		Non ricevuta documentazione tecnica Nel 2023 l'ASP chiede di stralciare dal piano gare. L'intervento sarà realizzato mediante adesione all'Accordo Quadro Inviatalia PNRR Eliminata		
	95	2018_11	Dispositivi medici per anestesia e rianimazione, apparato respiratorio e urogenitale	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Dott. G. Iuliano	€ 3.400.000,00	5	€ 17.000.000,00	SI		2018	31/03/2018 Confluita nella 2017_13	Ing. E. Caimo		Confluita nella gara dispositivi medici 2017_13 (RdP Vincenzo Telesca)		
	96	2018_11_L	Gara lavori "Ristrutturazione Polo riabilitativo a Maratea"	L	ASP	ASP	Arch. F. Cicale		-	€ 3.000.000,00	SI	NO	Non applicabile	30/11/2018	Ufficio Appalti di Lavori	Legata alla gara 2018_10L	Documentazione disponibile dopo realizzazione intervento 2018_10L Non ricevuta documentazione tecnica Nel 2023 l'ASP chiede di stralciare dal piano gare. L'intervento sarà realizzato mediante adesione all'Accordo Quadro Inviatalia PNRR Eliminata		
	97	2018_12	Reagenti chimici per laboratori di ricerca	S/F	CROB	CROB	Ing. M. Lauletta	€ 427.000,00	5	€ 2.135.000,00	SI		2018	31/03/2018 ELIMINARE	Geom. A. D'ambrogio	ELIMINARE (nota CROB 200099/11AB del 27/11/18)	Eliminata		
	98	2018_12_L	Apparecchiature elettromedicali Linac - GARA MISTA di esecuzione, progettazione e fornitura per la realizzazione bunker radioterapico completo di acceleratore lineare (PO Matera)	S/F	ASM	ASM	Ing. G. Donadio		-	€ 4.500.000,00	SI	NO	Non comunicata	31/07/2017 31/03/2018 Cds 29/01/2019	Geom. N. Locaspi		Gara mista già presente nel programma 2017 - importo passato da € 2.750.000 a € 4.188.752,00. Documenti trasmessi in data 6/03/2018; effettuata conferenza di servizi. L'ASM deve trasmettere il provvedimento di approvazione del progetto definitivo	Aggiudicata	
	99	2018_13	Software servizio ADI e cure palliative	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott. N. Mazzeo	€ 230.000,00	5	€ 1.150.000,00	SI		Non applicabile	31/03/2018 30/06/2019	Dott. A. Tedesco		Con nota 11843 del 31/01/2020 l'ASP asserisce di essere in attesa decisioni da parte del Dipartimento regionale competente. Attualmente (febbraio 2020) il progetto è in fase di rimodulazione da parte dell'ASP (possibile partnership con il CROB) - Info. Dott. Mazzeo Non ricevuta documentazione tecnica Da ridefinire progetto della gara entro il 30/06/2021 L'RdP è stato collocato in quiescenza. Non si è proceduto alla nomina del nuovo RdP in quanto non è ancora pervenuta nessuna integrazione documentale dall'Azienda committente.	Stralciata	
	100	2018_14	Contratti assicurativi RCT/RCO	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Dott. A. D'Onofrio Avv. R. Digirolamo	€ 4.750.000,00	3	€ 14.250.000,00	SI		2017	31/03/18	Arch. E.P. Petrucci		Per una prima gara pubblicata ad agosto 2019, i lotti del SSR sono andati deserti. La gara è stata nuovamente indetta ad agosto 2020 solo per i lotti del SSR	Aggiudicata	
	101	2018_15	Dispositivi medici per oculistica	S/F	ASP-S.CARLO-ASM	S.Carlo	Dott. D. Lacerenza	€ 2.100.000,00	5	€ 10.500.000,00	SI		2019	31/03/2018 30/06/2019	Avv. M. Gillo			Aggiudicata	
	102	2018_16	Concessione del servizio Bar	S/F	ASM-S.CARLO-EROB-ASP	ASM	Arch. R. Bisceglie	€ 652.000,00	5	€ 3.260.000,00	SI		2017	30/04/2018 30/06/2019 31/05/2020 30/04/2021	Geom. N. Locaspi		Si aggiunge ASP con nota n. 39045 del 16.04.2018. CROB rinuncia con nota 5626 del 23.05.2018	Aggiudicata	
	103	2018_17	Concessione del servizio di somministrazione bevande e snack mediante distributori automatici	S/F	ASM, CROB-ASP e S.CARLO	ASM	Dott. L. Maggiore Arch. R. Bisceglie Dott. Leonardo Maggiore	€ 329.000,00	5	€ 1.645.000,00	SI		2017	30/04/2018 30/10/2018 30/09/2020 30/04/2021 31/01/2022 30/05/2023	Dott. L. Maggiore Dott.ssa V. Locicero		Documentazione tecnica consegnata con nota prot. n. 20180064596 del 30/10/2018. Si aggiunge ASP con nota n. 39045 del 16.04.2018. CROB rinuncia con nota 5626 del 23.05.2018. Si aggiunge San Carlo con nota 186375/13A2 del 07.11.2018. A partire dal 2020, dopo vari TTL la documentazione di gara è stata trasmessa dall'ASM in data 11/8/2022. Nel corso del tavolo tecnico dell'11/01/2023 le AA.SS. si sono impegnate a fornire la documentazione tecnica aggiornata. La SUA-RB non ha mai ricevuto tale documentazione.	ELIMINATA E RIPROGRAMMATA	
	104	2018_18	Vaccini 2018	S/F	ASP - ASM	ASP	Dott. A. Pennacchio		da definire	€ 4.348.895,15	SI		2018	30/04/18	Dott. L. Maggiore			Aggiudicata	
	105	2018_19	Conservazione sostitutiva dei documenti clinici ed amministrativi digitali	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	REG_BAS	Dott. M. Recine	€ 833.333,33	3	€ 2.500.000,00	SI		2018	30/04/2018 ELIMINARE	Avv. V. Telesca		mai ricevuta documentazione di gara		
	106	2018_20	Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara	€ 1.458.792,48	5	€ 7.293.962,40	SI		2018	31/05/2018 30/04/2019	Ing. G. Bianchini		A seguito delle dimissioni del Presidente della Commissione giudicatrice, con provvedimento del 30/09/2020 è stato nominato un Presidente sostituto. Aggiudicata con DD20BD.2022/D.00040 del 25/3/2022 SIMOG 7638639 - G00250	Aggiudicata	
107	2018_21	Service laboratorio chimica clinica	S/F	S.CARLO	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara	€ 1.598.219,78	5	€ 7.991.098,90	SI		2019	30/06/2018 ELIMINARE	Geom. A. D'ambrogio		ELIMINARE (nota 41314 del 19/09/2018 e 48830 del 09/11/2018)	Eliminata		
108	2018_22	Servizi di assistenza informatica e di supporto	S/F	S.CARLO - CROB - ASP - ASM	S.Carlo	Dott. F. Labroca Ing. P. Galli	€ 1.038.526,20	5	€ 5.192.631,00	SI		2019	30/06/2018 30/04/2019 30/09/2020	Dott. A. Tedesco Ing. Giuseppe Bianchini		Comunicazioni intercorse con note 41314 del 19/09/2018 e 48830 del 09/11/2018. Documentazione tecnica di gara trasmessa con nota 20190017804 del 30/04/2019. L'ASP comunica il suo interesse a partecipare alla gara L'ASM comunica il suo interesse a partecipare alla gara ed aggiorna il piano segnalando un fabbisogno annuo di € 400.000 L'ultimo TTL si è tenuto il 17/11/2021. Le AA.SS. si sono impegnate ad inviare la documentazione tecnica definitivamente aggiornata entro il 26/11/2021. ASP e ASM trasmetteranno la parte di competenza della documentazione tecnica entro il 30/04/2022. L'ASM ha manifestato il mancato interesse alla gara prima della Cds di approvazione degli atti di gara. Novembre 2022, ricevute determine a contrarre.	Aggiudicata		
109	2018_24	Service materiali per esecuzione dei controlli di qualità interni (CQI), sistemi preanalitici, perianalitici e diagnostici di chimica clinica, immunometria e proteine specifiche per i P.O.D. di Venosa e P.O. di Melfi. Sistemi diagnostici relativi all'area siero e preanalitica "stand alone" per il P.O.D. di Chiaromonte	S/F	ASP-S.CARLO	ASP	Dott. F. Maglione	€ 1.240.000,00	5	€ 6.200.000,00	SI		2019	31/07/18	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo			Aggiudicata		
110	2018_25	Service sistema diagnostico per coagulazione	S/F	ASP-S.CARLO	ASP	Dott. F. Maglione	€ 490.000,00	5	€ 2.450.000,00	SI		2019	31/07/18	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo			Aggiudicata		
111	2018_26	Service sistema diagnostico per ematologia	S/F	ASP-S.CARLO	ASP	Dott. F. Maglione	€ 430.000,00	5	€ 2.150.000,00	SI		2019	31/07/18	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo			Aggiudicata		
112	2018_27	Progetto Domotica Pescopagano	S/F	S.CARLO	S.Carlo	Dott. Ciampa	€ 955.030,00	1	€ 955.030,00	SI		Non applicabile	31/10/2018 30/06/2019 30/06/2020 31/12/2021 30/04/2022 30/06/2023	ex Ing. L. Battista		Tavolo tecnico da convocare a seguito di approvazione regionale della rimodulazione del progetto (febbraio 2020) Non ricevuta documentazione tecnica. NESSUN RISCONTRO DALLE AA.SS. (rif. 2018). CONFERMARE INTERESSE Stralciata in occasione della Cds di approvazione del 2024	Cancellata		
113	2018_28	Radiofarmaci	S/F	ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Dott. L. Maggiore		da definire	€ 44.535.909,00	SI		2018	31/12/18	Dott. L. Maggiore		I Radiofarmaci inerenti il CROB sono stati aggiudicati per un importo pari ad € 2.292.153,19. Per le rimanenti AA.SS. ed OO. il tavolo tecnico è in corso	Aggiudicata		

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Fonte Finanziaria (definire)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indicazione CdS
	114	2018_29	Servizio ADI - assistenza domiciliare sanitaria, infermieristica	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott. G. Corona	€ 3.240.000,00	3	€ 9.720.000,00	SI		2019	31/10/2018 31/05/2019	Ing. E. Caimo Ing. G. Bianchini	Rivista più volte la documentazione tecnica ed attualmente ancora in revisione da parte dei referenti aziendali. Commissione nominata con DD20BA.2022/D.00092 del 27/6/2022. A seguito di rinuncia della dott.ssa Velluzzi, si dovrà procedere con la sostituzione SIMOG 8459662 - G00337 Gara indetta a luglio 2020. Con Sentenza del TAR Basilicata n. 19/2021, pubblicata il 15/01/201, è stato disposto l'annullamento del bando di gara. Conferenza di servizi svoltasi a settembre 2021. Le DD a contrarre sono state inoltrate in data 17/11/2021 dall'ASP e in data 16/11/2021 dall'ASM Previsione di re indicazione della procedura entro febbraio 2022. Commissione nominata	Aggiudicata	
	115	2018_30	Farmaci (biosimilari - A.Q.)	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Dott. L. Maggiore	da definire	1	€ 10.034.631,00	SI		2018	non comunicata	Dott. L. Maggiore		Aggiudicata	
	116	2018_31	Farmaci (nuovi, con brevetto scaduto, infruttuosi)	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Dott. L. Maggiore	da definire	5	da definire	SI		2018	da definire 31/05/2019	Dott.ssa V. Locicero		Aggiudicata	
	117	2018_32	Gestione servizio dialisi (con parte residuale di lavori)	S/F	ASP	ASP	Dott. A. Pennacchio	€ 6.083.333,33	12	€ 73.000.000,00	SI		Non applicabile	30/09/18	Ing. G. Bianchini	I <sup>a</sup> integrazione al piano gare "Servizi e forniture del SSR" - Inserimento appendici al piano gare approvato (nota prot. n. 15875/13A2 del 26.01.2018) nota ASP n. 51153 del 17.05.2018 e nota Sanità n. 89803/13A2 del 23.05.2018	Stralciata parte del servizio, le forniture residue sono nella procedura 2015_17	
	118	2018_33	Gestione servizio di trasporto sangue per il SSR	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	S.Carlo	Dott.ssa C. Musto	€ 684.408,00	5	€ 3.422.040,00	SI		Non comunicata	28/02/2018 30/04/2019	Avv. M. Gilio	I <sup>a</sup> integrazione al piano gare "Servizi e forniture del SSR" - Inserimento appendici al piano gare approvato (nota prot. n. 15875/13A2 del 26.01.2018)	Aggiudicata	
	119	2018_34	Ammodernamento del parco macchine a garanzia dell'alimentazione elettrica in continuità dei presidi ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza	S/F	S.CARLO	S.Carlo	Ing. G. Spera	€ 1.229.323,77	1	€ 1.229.323,78	SI		Non comunicata	28/02/18	Geom. N. Locaspi	Nominata commissione 20/08/2018 II <sup>a</sup> integrazione al piano gare "Servizi e forniture del SSR" - Spostamento procedura di gara dal piano gare "Lavori del SSR" al piano gare "Servizi e forniture del SSR" (nota prot. n. 21573/13A2 del 05.02.2018) Gara sostituita con Ammodernamento del parco macchine a garanzia dell'alimentazione elettrica in continuità dei presidi ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza	Aggiudicata	
	120	2018_35	Service Iniettori per TAC e Risonanza magnetica	S/F	S.CARLO	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara		5	€ 1.067.500,00	SI		2018	28/02/18	Ing. L. Battista Ing. E. Caimo	III <sup>a</sup> integrazione al piano gare "Servizi e forniture del SSR" - Inserimento nuova procedura di gara da parte del A.O.R. "San Carlo" (nota prot. n. 25046/13A2 del 08.02.2018)	Aggiudicata	
	121	2018_36	Servizio di distribuzione dei farmaci A/PHT regionale in distribuzione per conto (DPC) alle farmacie convenzionate della Regione Basilicata da parte dei distributori intermedi.	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott. A. Carretta	€ 1.200.000,00	3	€ 3.600.000,00	SI		2017	30/06/2018 31/03/2020 30/11/2020	Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore	IV <sup>a</sup> integrazione al piano gare "Servizi e forniture del SSR" - Inserimento nuova procedura di gara da parte di ASP e ASM (nota prot. n. 49552/13A2 del 19.03.2018). In CdS del 18.03.2019 era stata accorpata erroneamente con la gara 2018_31. Cancellata dal Piano gara con nota ASP n. 20200109726 del 27/11/2020	Eliminata	
	122	2018_37	Fornitura di sistemi per laboratorio di genetica medica regionale.	S/F	ASM	ASM	Dott. D. Dell'Edera	€ 320.000,00	5	€ 1.600.000,00	SI		Lotto 1: 2019 Lotto 2: 2020	30/10/2018 07/02/2019	Dott.ssa V. Locicero	Integrazione al piano gare "Servizi e forniture del SSR" - Inserimento nuova procedura di gara da parte di ASM (nota prot. n. 48770 del 09.08.2018) e nota Dip. Sanità n. 142128/13A2 del 24.08.2018.	Aggiudicata	
	123	2019_01	Dispositivi medici per infusione	S/F	ASM - S. CARLO	ASM	Dott. F. Dimona	€ 744.000,00	5	€ 3.720.000,00	SI		Non comunicata	30/04/2019 30/07/2020 30/06/2021	Dott.ssa A.R.-De- Bartolomeo Avv. Gilio Dott.ssa V. Locicero	Vecchio referente dott.ssa Bagnato. Sostituito col Dott. Dimona Francesco. Rettifica effettuata con nota prot. 20190060514 del 07/11/2019. Nel corso del Tavolo tecnico del 07/09/2021 è stata richiesta documentazione tecnica integrativa. In data 19/10/2021 è pervenuta documentazione tecnica integrativa, sostituita con altra documentazione pervenuta in data 17/11/2021. La documentazione integrativa è attualmente in istruttoria da parte del nuovo RdP nominato in data 12/01/2022. In attesa della determina a contrarre del S.Carlo. Pubblicata il 24/02/2023	Aggiudicata	
	124	2019_02	Apparecchiature e test per virologia	S/F	ASM	ASM	Dott.ssa F. Dicuia	€ 150.000,00	5	€ 750.000,00	SI		Non comunicata	30/04/19		Con nota ASM prot. n. 20190049494 del 11/09/2019 è stata richiesta la cancellazione della gara SUA-R inserita nella programmazione 2019 (Andrà riproposta nel piano 2021)	Verificare se è opportuna la riproposizione della gara nella programmazione 2021	
	125	2019_03	Dispositivi medici per otorinolaringoiatria	S/F	S. CARLO - ASM	S.Carlo	Dott. Santandrea Dott.ssa Aloè Dott.ssa Centore	253.442,62 164.000,00	3	760327,87 492.000,00	SI		Non comunicata	30/04/2019 30/04/2020 31/03/2023	Dott. G. Grisolia	Documentazione tecnica trasmessa con nota 20190026498 (acq. prot. reg. 114946/20AB del 05/07/2019) Documentazione mancante richiesta in più occasioni, anche a seguito di Tavoli Tecnici (da ultimo con note in data 23/10/2020 prot. 201007/20AB e successivamente in data 02/12/2020 prot. 229917/20AF) Risulta necessario verificare se il referente dell'Azienda Capofila sia variato. Documentazione mancante. Il RUP Grisolia dovrà essere sostituito dopo la ricezione della documentazione NESSUN RISCONTRO DALLE AA.SS. (rif. 2020). CONFERMARE INTERESSE Stralciata in occasione della CdS di approvazione del 2024 in quanto inglobata nella 2023_29	Cancellata	
	126	2019_04	Dispositivi medici per senologia	S/F	S. CARLO	S.Carlo	Dott. S. Drago	€ 121.249,60	3	€ 363.748,80	SI		Non comunicata	30/04/19	Dott.ssa T. Andriani	Ricevuta bozza incompleta della documentazione tecnica con nota 20190026498 del 28/06/2019 (acq. prot. reg. 114946/20AB del 05/07/2019)	Aggiudicata	
	127	2019_05	Fornitura nuovo acceleratore lineare	S/F	CROB	CROB	Ing. E. Arminio	€ 2.890.000,00	1	€ 2.890.000,00	SI		Non comunicata	30/05/2019 30/05/2020 30/06/2021	Locaspi	In via di approvazione il progetto da parte del CROB. Aggiudicata con DD 20BC.2022/D.00079 dell'8/06/2022 SIMOG: 8323394 - G00335	Aggiudicata	
	128	2019_06	Sistemi di citofluorimetria	S/F	CROB	CROB	Dott.ssa-Vita Dott.ssa F. d'Auria	€ 200.000,00	5	€ 1.000.000,00	SI		Non comunicata	30/05/2019 30/04/2020 30/06/2021 30/04/2022		Fabbisogno non più presente in quanto soddisfatto mediante altro appalto. La nuova edizione della procedura verrà eventualmente comunicato dal CROB in sede di prossima programmazione	Eliminata	
	129	2019_07	Dispositivi medici per neonatologia	S/F	S. CARLO - ASM	S.Carlo	Dott.ssa S. Pesce	€ 233.039,61	3	€ 699.118,84	SI		Non comunicata	31/05/2019 31/05/2020 30/04/2022 30/04/2023	Arch. E.P. Petruzzi	L'ASM ha manifestato l'interesse all'inserimento dei propri fabbisogni con nota 132127 del 27/07/2021. La SUA-RB con nota prot. 81860 del 14/06/2022 sollecita l'Azienda Capofila all'invio della documentazione tecnica completa. NESSUN RISCONTRO DALLE AA.SS. (rif. 2022). CONFERMARE INTERESSE Stralciata in occasione della CdS di approvazione del 2024	Cancellata	



Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Fonte Finanziaria (definire)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS	
	130	2019_08	Dispositivi per emodinamica - lotti infungibili	S/F	ASM - S. CARLO	S. Carlo	<del>Dott. RA Osanna</del> Dott.ssa Aloè / Eugenio Stabile	<del>520.000</del> 3.100.000	5	<del>2.600.000</del> 15.500.000	SI		Non comunicata	31/05/2019 31/05/2020 31/03/2022 30/04/2023	Avv. V. Telesca	Tavolo tecnico concluso e ritrasmessa documentazione nel mese di luglio 2021. A seguito del cambio primario è stato richiesto alla SUARB di attendere per l'indizione al fine di valutare i beni richiesti in acquisto. Tardando la risposta è stata indetta conferenza di servizi per il giorno 21.12.2021. Il S. Carlo ha chiesto un differimento dovendo presentare ulteriori richieste di acquisto da inserire in gara. Rinviata CdS al 21.01.2022. CdS andata deserta. N.B. Benché tra gli Enti committenti compaia anche l'A.S.M., quest'ultima non ha mai fornito alcun elemento per l'espletamento della gara, che pertanto si sta preparando a beneficio esclusivo dell'AOR San Carlo. Il dott. Calculli (referente ASM) si interfaccerà con il dott. Osanna (referente S. Carlo) per concordare la documentazione tecnica da trasferire poi al RdP della SUA-RB Nessuna documentazione pervenuta L'ASM manifesta il suo non interesse alla procedura inerente i lotti infungibili. La documentazione predisposta in una prima fase dal A.O.R. San Carlo è attualmente soggetta ad una fase di revisione da parte dell'Azienda committente che al momento non ha fornito alcuna ulteriore informazione sulla volontà di proseguire con l'espletamento della procedura di gara.	ELIMINATA E RIPROGRAMMATA		
	131	2019_09	Prodotti dietetici per nutrizione clinica	S/F	ASP - ASM - S. CARLO - CROB	S. Carlo	Dott.ssa Di Michele	€ 495.000,00	5	€ 2.475.000,00	SI		Non comunicata	31/05/2019 31/03/2020	Ing. E. Caimo	Con nota prot. 1152 del 03/02/2020 (reg.le 19147/20A2 del 04/02/2020) il CROB comunica il proprio interesse a partecipare alla gara. In sede di CdS di Programmazione (27/02/2020) comunica il fabbisogno economico. Aggiudicata con DD20BD.2022/D.00044 del 7/4/2022 e DD 20BD.2022/D.00071 del 25/5/2022 SIMOG8195821 - G00320 177 lotti di cui 140 aggiudicati, 29 deserti e 8 infruttuosi	Aggiudicata		
	132	2019_10	Vaccini	S/F	TUTTE	ASM	Dott.ssa F. Di Cuia	€ 5.724.415,53	1	€ 5.724.415,53	SI		Non comunicata	30/06/19	Dott.ssa V. Locicero	Aggiudicazione efficace con D.D. 20AB.2019/D.00181 13/11/2019	Aggiudicata		
	133	2019_11	Farmaci veterinari	S/F	ASP - ASM	ASM	Dott. Tralli	€ 70.000,00	5	€ 350.000,00	SI		Non comunicata	30/06/2019 31/03/2020	Rag. E. Ricciardi	L'ASP dichiara in sede di CdS (27/02/2020) di non aderire più alla procedura di gara.	AGGIUDICAZIONE (NON EFFICACE) approvata con DD 217 del 16/09/2021. Efficacia dell'aggiudicazione prevista entro il 31/10/2021.		
	134	2019_12	Farmaci biosimilari (accordo quadro)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Dott. F. Di Cuia	€ 10.000.000,00	1	€ 10.000.000,00	SI		Non comunicata	30/06/19	Rag. E. Ricciardi		Aggiudicata		
	135	2019_13	Dispositivi medici (lotti infruttuosi)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	CROB	<del>Dott.ssa P. Aloè</del>	€ 1.230.000,00	5	€ 6.150.000,00	SI		Non comunicata	30/06/2019 31/07/2020 31/12/2021 30/09/2022		La procedura viene eliminata in quanto tutto il quantitativo di dispositivi risultati all'epoca infruttuosi ricadrà nella nuova procedura che andrà a recuperare i lotti risultati deserti ed infruttuosi a seguito dell'aggiudicazione di dicembre 2021 (sottoscrizione convenzioni luglio 2022)	Eliminata		
	136	2019_14	Casa alloggio	S/F	ASP-ASM	ASM	Dott. Guarino	€ 11.726.160,40	5	€ 58.630.801,99	SI		Non applicabile	30/06/19			Eliminata a seguito delle note dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP (prot. n. 68311 del 28.06.2019 ed acquisita al prot. reg.le n. 111265/20A2 del 28.06.2019) e dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera - ASM (delib. n. 629 del 05.07.2019 ed acquisita al prot. reg.le n. 115592/20A2 del 08.07.2019) GIÀ PRESENTE IN PROGRAMMAZIONE - VEDI PROCEDURA 2015_13 - TRATTASI DI DUPLICATO	Cancellata in quanto duplicato della gara ID 2015_13	
	137	2019_16	Fornitura di derrate alimentari	S/F	ASP	ASP	Dott. G. Rinaldi	€ 205.000,00	3	€ 615.000,00	SI		Non comunicata	30/06/2019 31/08/2020 31/03/2021	Dott.ssa V. Locicero		Aggiudicata		
	138	2019_17	Frese con service di trapano motorizzato per U.O. Neurochirurgia (ex Dispositivi medici per neurochirurgia Ed.2)	S/F	S. CARLO	S. Carlo	Dott. Colella	€ 264.000,00	3	€ 792.000,00	SI		Non comunicata	30/06/2019 31/05/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/06/2023	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo	Documentazione tecnica trasmessa con nota prot. 20190026498 (acq. prot. reg. 114946/20AB del 05/07/2019) La documentazione pervenuta risulta incompleta. La SUA-RB ha chiesto integrazione documentale con nota prot. n.202991/20AB del 3/12/2019 alla quale non ha fatto seguito la richiesta integrazione documentale. L'RdP è stato trasferito ad un altro Dipartimento regionale. Non si è proceduto alla nomina del nuovo RdP in quanto non è ancora pervenuta nessuna integrazione documentale dall'Azienda committente. NESSUN RISCONTRO DALLE AA.SS. (rif. 2019). CONFERMARE INTERESSE Stralciata nel corso della CdS di approvazione del 2024	Cancellata		
	139	2019_18	Dispositivi medici per cardiologia - Lotti infungibili	S/F	ASM - S. CARLO	S. Carlo	Dott. Luzzi	€ 255.739,18	3	€ 767.217,54	SI		Non comunicata	30/06/2019 31/05/2020 31/05/2021 30/04/2022 30/04/2023			ELIMINATA		
	140	2019_19	Dispositivi medici per elettrofisiologia - lotti infungibili	S/F	ASM - S. CARLO	S. Carlo	Dott. R. Fiorilli Dott. P. Grieco Dott.ssa Aloè / Eugenio Stabile	1.015.000 1.260.000	3	3.045.000 3.780.000	SI		Non comunicata	30/06/2019 31/05/2020 31/05/2021 30/04/2022 30/04/2023	Dott. G. Grisolia	Integrazione alla documentazione tecnica effettuata con nota prot. 20190048768 La documentazione pervenuta risulta inadeguata. La SUA-RB ha chiesto documentazione integrativa con nota prot. n.210202/20AB del 6/12/2019. Il San Carlo ha riscontrato la richiesta con nota prot. 7331 del 20/02/2020 (acq. Prot. Reg.le 31294/20A2 del 21/02/2020). Ulteriore richiesta della documentazione con nota in data 30/10/2020 prot. 205647/20AB. L'ASM manifesta il suo non interesse alla procedura inerente i lotti infungibili. NESSUN RISCONTRO DALLE AA.SS. (rif. 2020). CONFERMARE INTERESSE Stralciata nel corso della CdS di approvazione del 2024 in quanto inglobata nella 2022_17	Cancellata		
	141	2019_20	Fili di sutura	S/F	ASP - ASM - S. CARLO - CROB	S. Carlo	Dott.ssa De Michele	€ 1.050.000,00	5	€ 5.250.000,00	SI		Non comunicata	30/06/19	Ing. E. Caimo	Con nota prot. 1152 del 03/02/2020 (reg.le 19147/20A2 del 04/02/2020) il CROB comunica il proprio interesse a partecipare alla gara. Aggiudicata con DD20BD.2022/D.00094 del 30/6/2022 45 lotti di cui deserti i lotti 25, 26 e 40 SIMOG gara n. 7955633 - G00292	Aggiudicata		
	142	2019_21	Suturatrici	S/F	ASP - ASM - S. CARLO - CROB	S. Carlo	Dott.ssa De Michele	€ 900.000,00	5	€ 4.500.000,00	SI		Non comunicata	30/06/19	Ing. E. Caimo	Documentazione tecnica trasmessa con nota prot. 20190047306 Con nota prot. 1152 del 03/02/2020 (reg.le 19147/20A2 del 04/02/2020) il CROB comunica il proprio interesse a partecipare alla gara. Aggiudicata con DD20BD.2022/D.00072 del 25/5/2022 SIMOG gara n. 7919445 - G00283	Aggiudicata		
	143	2019_22	Service revisione contabile	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Dott. M. Viggiano	€ 120.000,00	3	€ 360.000,00	SI		Non comunicata	CdS 12.03.2019	Arch. E.P. Petruzzi		Aggiudicata		
	144	2020_01	Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva per "Lavori di realizzazione di un edificio da adibire a Centro per le cure palliative - Hospice"	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Arch. A. Grieco	€ 331.698,13	1	€ 331.698,13	SI		-	31/12/19	Geom. N. Locaspi		Aggiudicata		
	145	2020_02	Service Reagenti e Consumabili per Laboratori analisi (tra cui PP.OO. Lagonegro e Villa d'Agri)	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dr. Antonio Picerno	€ 3.300.000,00	5	€ 16.500.000,00	SI		-	31/01/2020 31/05/2021		Gara non più di interesse per espresa rinuncia (nota prot. UOC Provveditorato San Carlo n.20210038247 del 01/09/2021)	Annullata		

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Fonte Finanziaria (definire)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indicazione CdS
	146	2020_04	Dispositivi infungibili per Chirurgia vascolare	S/F	S. Carlo - ASM	S. Carlo	Dott.ssa Aloè Dr. Pierluigi Cappiello	€ 450.000,00	3	€ 1.350.000,00	SI			31/01/2020 30/04/2022 30/04/2023	Ing. G. Bianchini	In data 08/06/2020 (Prot. 103906/20AB), l'Azienda capofila ha trasmesso la documentazione tecnica di gara, ma non l'ulteriore documentazione prevista, nel caso di approvvigionamento di beni infungibili, dalla D.G.R. n. 1226 del 24/06/2015. Con nota prot. 132096/20AB del 09/07/2020 è stato chiesto all'Azienda capofila di trasmettere la documentazione mancante, precisando che il Tavolo tecnico sarebbe stato convocato solo all'esito del completamento della documentazione. Con nota S. Carlo 8044 del 17/02//2021 comunica la documentazione integrativa richiesta (lettere di infungibilità). Trattasi di prodotti infungibili. E' stata fatta richiesta di relazione di infungibilità ai sensi della DGR 1226/2015 con nota 132096 del 09/07/2020 non ancora riscontrata nonostante un sollecito prot 38906 del 10/02/2021. L'ASM comunica nel corso della CdS del 28/02/2023 il mancato interesse alla procedura inerente i lotti infungibili. In attesa di documentazione NESSUN RISCONTRO DALLE AA.SS. (rif. 2021). CONFERMARE INTERESSE Stralciata nel corso della CdS di approvazione del 2024	Cancellata	
	147	2020_05	Dispositivi per Laboratorio di Ematologia	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dott.ssa Aloè Dr. Michele Pizzuti	€ 230.000,00	3	€ 690.000,00	Bilancio aziendale		2019	31/01/2020 31/05/2021 30/04/2022 31/05/2023			Eliminata	
	148	2020_06	Farmaci biosimilari (ed. 2020)	S/F	ASP-ASM-CROB-S. Carlo	S. Carlo	Dott.ssa De Michele	€ 912.450,00	1	€ 912.450,00	SI		2020	30/06/2020	Rag. E. Ricciardi	L'importo annuo è stato ridotto rispetto a quanto previsto nei Piani degli anni precedenti in quanto la procedura pubblicata ha riguardato un solo farmaco (BEVACIZUMAB)	Aggiudicata	
	149	2020_08	Vaccini (ed. 2020)	S/F	ASP-ASM-CROB-S. Carlo	ASP	Dott. D'Elisa	€ 5.005.000,00	2	€ 10.010.000,00	SI		2020	30/06/2020		Aggiudicata - solo per vaccino antinfluenzale	Aggiudicata	
	150	2020_09	Service sistemi diagnostici per urine, elettroforesi, sedimento urinario	S/F	ASP-S. Carlo-CROB	S. Carlo	Dott.ssa Aloè Dott. A. Picerno	590.000,00 246.000,00	5	2.950.000,00 1.230.000,00	Bilancio aziendale		2021	30/06/2020 31/05/2021 30/04/2022 30/06/2023		Non ricevuta documentazione tecnica integrata con ingresso del CROB per un importo annuo di € 150.000,00 Stralciata in occasione della CdS di approvazione del 2024 in quanto inglobata nella 2023_11	Cancellata	
	151	2020_10	Sostanze pure per laboratorio e materiale consumo per Anatomia Patologica	S/F	ASM - CROB - S. CARLO	ASM	Dott.ssa Di Cuià	€ 277.924,36	5	€ 1.389.621,80	SI		2020	30/06/2020 31/12/2021 30/06/2022 31/03/2023		Non ricevuta documentazione tecnica Il CROB manifesta il suo interesse a partecipare alla gara per un importo annuo di € 70.000,00 Stralciata in occasione della CdS di approvazione del 2024 in quanto inglobata nella 2023_20	Cancellata	
	152	2020_11	Materiale sanitario per UOC Oncologica critica territoriale e cure domiciliari e palliative	S/F	ASP	ASP	Dott. G. Corona	€ 80.000,00	3	€ 240.000,00	SI		2019	30/06/2020 30/05/2021			Stralciata	
	153	2020_11	Materiale sanitario per UOC Oncologica critica territoriale e cure domiciliari e palliative	S/F	ASP	ASP	Dott. G. Corona	€ 80.000,00	3	€ 240.000,00	SI		2019	30/06/2020 30/05/2021			Eliminata	
	154	2020_12	Fornitura ossigeno liquido per assistiti in ossigenoterapia domiciliare	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott. A. Carretta	€ 5.150.000,00	4	€ 20.600.000,00	SI		2021	31/12/20	Bianchini Giuseppe		Aggiudicata	
	155	2020_13	PET-TC mobile	S/F	ASM	ASM	Dott. Schiaviariello	€ 1.800.000,00	2	€ 3.600.000,00	SI		2021	31/12/2020 30/04/2021	Arch. E.P. Petruzzi	Indetta in data 14/01/2022. Deserta - Indetta nuova gara in data 31/5/2022; commissione nominata; apertura busta B in data 30 settembre 2022- insediamento della Commissione	Aggiudicata	
	156	2020_15	Farmaci (Ed. 5 - 2020)	S/F	ASP-ASM-CROB-S. Carlo	ASM	Dott.ssa Di Cuià	€ 53.100.000,00	3	€ 159.300.000,00	SI		2020	30/06/20			Aggiudicata	
	157	2020_17	Vigilanza armata del CROB - Ed. II	S/F	CROB	CROB	Dott.ssa Maria G. Lauletta	€ 132.000,00	6	€ 792.000,00	SI		2020	30/04/20	Geom. N. Locaspi		Eliminata	
	158	2020_18	TAC da installare presso il P.O. di Pescopagano	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dott. G. Araneo	€ 250.000,00	1	€ 250.000,00	SI		-	30/06/20			Eliminata	
	159	2020_19	Sistemi di monitoraggio cardiaco da installare presso il P.O. di Pescopagano	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dott.ssa P. Aloè / Dott. G. Araneo	€ 235.800,00	1	€ 235.800,00	SI		-	30/06/2020 30/06/2021 30/04/2022 31/07/2023		Non ricevuta documentazione tecnica Stralciata in occasione della CdS di approvazione del 2024	Cancellata	
	160	2020_20	Dispositivi medici vari e piccola strumentazione occorrente al P.O. di Pescopagano	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dott.ssa P. Aloè / Dott. G. Araneo	€ 774.400,00	1	€ 774.400,00	SI		-	30/06/2020 30/06/2021 30/04/2022 31/07/2023		Non ricevuta documentazione tecnica Stralciata in occasione della CdS di approvazione del 2024	Cancellata	
	161	2020_21	Letti e materassi utili al Centro Riabilitativo di alta specializzazione del P.O. di Pescopagano	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dott.ssa P. Aloè / Dott. G. Araneo	€ 252.000,00	1	€ 252.000,00	SI		-	30/06/2020 30/06/2021 30/04/2022 31/07/2023			ELIMINATA E RIPROGRAMMATA	
	162	2020_22	Fornitura in service di due Sistemi per l'estrazione di materiale virale in modalità completamente automatica e relativi kit (COVID-19)	S/F	ASP	ASP	Dott. F. Maglione	€ 1.320.000,00	1+1	€ 2.640.000,00	SI		-	30/07/20	Ing. G. Bianchini		Aggiudicata	
	163	2020_23	Laser a Femtosecondi	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dott. D. Lacerenza	€ 430.000,00	1	€ 430.000,00	SI		-	02/09/20	Ing. E. Caimo		Aggiudicata	
	164	2021_03	Farmaci Biosimilari (ed. 2021)	S/F	ASP-ASM-S. Carlo-CROB	ASM	Dott.ssa F. Di Cuià	€ 9.812.500,00	3	€ 29.437.500,00	SI		-	30/06/21	Dott. E. Ricciardi		Aggiudicata	
	165	2021_04	Farmaci (ed. 2021)	S/F	ASP-ASM-S. Carlo-CROB	ASM	Dott.ssa F. Di Cuià	€ 25.466.666,67	3	€ 76.400.000,00	SI		-	30/06/2021 31/01/2022 28/02/2022	Dott.ssa V. Locicero	In data 16/11/2022 si è tenuta Conferenza di servizi non chiusa definitivamente La CdS definitiva si è tenuta il 23/11/2022	Aggiudicata	
	166	2021_05	Vaccini (ed. 2021)	S/F	ASP-ASM-CROB	ASP	Dott. M. D'Elisa	€ 4.936.000,00	1	€ 4.936.000,00	SI		-	30/06/21			Aggiudicata	
	167	2021_06	Stent angioplastica e cateteri (II Edizione)	S/F	ASM-S. Carlo	S. Carlo	Dott. G. Paternò Dott.ssa Aloè Dott. E. Stabile	2.173.350,00 824.010,00	3	6.520.050,00 2.472.030,00	SI		-	30/06/2021 30/04/2022 30/06/2023		Non ricevuta documentazione tecnica Stralciata in occasione della CdS di approvazione del 2024 inseguito ad adesione a CONSIP ed aggregazione alla 2022_17	Cancellata	
	168	2021_08	Dispositivi per Neurochirurgia (II Edizione)	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dott. G. Vitale	€ 263.221,10	2	€ 526.442,20	SI		-	30/06/2021 30/04/2022 31/07/2023		Non ricevuta documentazione tecnica Stralciata in occasione della CdS di approvazione del 2024 in quanto inglobata nella 2022_11	Cancellata	
	169	2021_13	Radiofarmaci (ed. 2021)	S/F	ASM-S. Carlo-CROB	CROB	Dott.ssa R-Le Rose Dott.ssa M.R. Millella	€ 6.784.307,68	3	€ 20.352.923,05	SI		-	31/08/2021 31/03/2022	Ing. E. Caimo	In attesa delle delibere a contrarre dagli Enti committenti Indetta il 18/01/2023	Aggiudicata	
	170	2021_15	Colonna laparoscopica completa di accessori	S/F	CROB	CROB	Ing. E. Arminio	€ 250.000,00	1	€ 250.000,00	SI		-	31/03/21			Eliminata	
	171	2021_16	Manutenzione correttiva ed evolutiva del SISIR e integrazione con il sistema contabile del SSR	S/F	ASP-ASM-S. Carlo-CROB-Reg_Bas	Reg_Bas	Dott. M. Recine	€ 1.800.000,00	5	€ 9.000.000,00	SI		-	31/03/21		Si conferma l'interesse. Ci si riserva l'indicazione della data di invio della documentazione tecnica. Non più necessaria in seguito ad attivazione gara CONSIP.	Eliminata	
	172	2021_17	Sistema informativo per anatomia patologica	S/F	ASM-S. Carlo-CROB	CROB	Ing. D. Scapicchio	€ 126.000,00	5	€ 630.000,00	SI		-	31/12/2021 30/03/2022		Adesione a accordo quadro Consip	Eliminata	
	173	2021_18	Adeguamento e aggiornamento per la sicurezza informatica	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Ing. P. P. Galli	€ 430.000,00	1	€ 430.000,00	SI		-	31/07/2021 30/04/2022 31/07/2023	Arch. E.P. Petruzzi	Non ricevuta documentazione tecnica Aggiudicazione efficace il 17.01.2022	Aggiudicata	
	174	2021_19	Attrezzature ecografiche per P.O. di Lagonegro	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dott. B. M. La Rocca	€ 300.000,00	1	€ 300.000,00	SI		-	30/06/2021 30/04/2022 30/04/2023		Stralciata in occasione della CdS di approvazione del 2024 in quanto si è aderito a CONSIP	Cancellata	
	175	2021_20	TAC P.O. di Lagonegro	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dott. B. M. La Rocca	€ 450.000,00	1	€ 450.000,00	SI		-	30/06/2021 30/04/2022 30/04/2023		Stralciata in occasione della CdS di approvazione del 2024 in quanto si è aderito a CONSIP	Cancellata	
	176	2021_21	Fornitura di n. 2 tomografi assiali computerizzati	S/F	CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè Ing. S. Fulgieri	€ 1.800.000,00	-	€ 1.800.000,00	SI		-	31/03/22		Finanziata mediante il Progetto TECNOCROB-POC Basilicata 2014/2020 - Asse 1 "Ricerca e Sviluppo Tecnologico e Innovazione" Adesione a accordo quadro Consip	Eliminata	

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Fonte Finanziaria (definire)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indicazione Cds	
	177	2021_22	Fornitura di apparecchiature per l'allestimento di n. 1 SALA OPERATORIA IBRIDA per cardiocirurgia e chirurgia vascolare presso Ospedale "San Carlo" di Potenza	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Arch. Antonio GRIECO Ing. Alfonso CASALETTO	€ 3.050.000,00	-	€ 3.050.000,00	SI		-	-	Ing. E. Caimo	Documentazione tecnica inviata alla Direzione Salute ed in seguito trasferita alla SUA-RB. Apertura Busta C (15/11/2022)	Aggiudicata		
	178	2021_23	Gara per la fornitura di beni legati all'emergenza sanitaria "COVID-19"	F	S. CARLO - ASM - CROB	S. Carlo	Dott.ssa F. Centore	€ 19.474.516,00	1	€ 19.474.516,00	in attesa di determinare a contrarre		Non comunicata	03/2021 01/2022	Avv. V. Telesca	Procedura di gara inizialmente inserita nel piano gara "COVID" ed in occasione della Cds del 15/02/2022 si è proceduto al suo trasferimento nel Piano gare Beni e servizi "ordinario". Richiesta gara da Dip. Sanità e San Carlo per fornitura dispositivi covid e sanificazione ambienti. Stabilito come da atti la non trattazione come "Urgenza" le AA.SS. hanno trasmesso gli atti in tavoli tecnici tenuti presso la SUARB sino al mese di gennaio 2022. Nelle more della trattazione la gara sanificazione è stata nei fatti abbandonata non avendo trasmesso la documentazione.	Aggiudicata		
	179	2022_02	Farmaci (ed. 2022)	S/F	ASM-ASP-S. Carlo-CROB	ASM	Dott.ssa F. Di Cuia	€ 15.000.000,00	3	€ 45.000.000,00	SI		2022-2023	31/12/2022 31/09/2023		CONFERMARE ANNULLAMENTO PROCEDURA IN QUANTO INCLUSA NELL'EDIZIONE 2023 (rif. ID 2023_02) Stralciata in occasione della Cds di approvazione del 2024	Cancellata		
	180	2022_03	Vaccini antinfluenzali (ed. 2022)	S/F	ASM-ASP-S. Carlo-CROB	ASP	Dott. De Lisa	€ 5.600.000,00	1	€ 5.600.000,00	SI		2022	31/03/22	Dott.ssa V. Locicero		Aggiudicata		
	181	2022_04	Vaccini obbligatori e raccomandati (ed. 2022)	S/F	ASM-ASP-S. Carlo-CROB	ASP	Dott. De Lisa	€ 1.800.000,00	2	€ 3.600.000,00	SI		2022	31/03/22		Sostituita dalla edizione 2023 (ID 2023_04)	Eliminata		
	182	2022_07	Servizi di pulizia e sanificazione	S/F	ASP-ASM-S. Carlo - CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè Dott. P. Libutti	€ 14.600.000,00	5	€ 73.000.000,00	SI		2023	31/12/2022 30/04/2023			ELIMINATA E RIPROGRAMMATA		
	183	2022_08	Ausili per diabetologia	S/F	ASM-ASP	ASP	Dott.ssa G. Motola	€ 5.000.000,00	5	€ 25.000.000,00	SI		2022	30/04/22	Ing. E. Caimo	Cds il 09/02/2023 Manca la determina a contrarre dell'ASP prevista entro il 15/03/2023	Aggiudicata		
	184	2022_10	Dispositivi medici emodinamica	S/F	ASM-S. Carlo	S. Carlo	Avv. F. Cariatì Dott.ssa P. Aloè Dott. A. Lopizzo	€ 1.527.992,41	3	€ 4.583.977,22	SI		2023	30/06/2022 30/04/2023		Stralciata in occasione della Cds di approvazione del 2024 in quanto inglobata nella 2022_17	Cancellata		
	185	2022_13	Trattamento extracorporeo endotossiemia	S/F	ASM	ASM	Ing. D. Casino	€ 205.000,00	3	€ 615.000,00	SI		2023	30/09/22			Eliminata		
	186	2022_15	Sistema robotico per chirurgia endoscopica	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dott. R. Falabella	€ 2.000.000,00	1	€ 2.000.000,00	SI		n.a.	31/10/22	Ing. E. Caimo	Svolta Cds. Manca la determina a contrarre del S. Carlo prevista entro il 18/10/2022	Aggiudicata		
	187	2022_16	Servizi di ausiliario	S/F	ASP-ASM-S. Carlo - CROB	CROB	Ing. M. Lauletta Dott. P. Libutti	€ 2.900.000,00	5	€ 14.500.000,00	SI		2023	31/12/2022 30/04/2023			ELIMINATA E RIPROGRAMMATA		
	188	2022_18	Apparecchiature elettromedicali varie (Finanziamento FSC)	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Avv. F. Cariatì Dott.ssa P. Aloè	€ 3.040.000,00	1	€ 3.040.000,00	SI		n.a.	30/05/2022 31/07/2023			All'interno di tale procedura rientrano, le 4 procedure indicate con i codici 2022_18a-b-c-d. L'importo originariamente indicato di € 6.800.000 è stato rimodulato nel corso della Cds del 28.02.2023 a 3.040.000 lasciando un residuo per altre eventuali procedure, rispetto a quanto già aggiudicato, di € 1.000.000 NESSUN RISCONTRO DALL'A.O.R. SAN CARLO RISPETTO ALL'UTILIZZAZIONE DELLA SOMMA RESIDUA (rif. Cds 2023). CONFERMARE INTERESSE	AGGIUDICATA	
	189	2022_18a	Fornitura di n. 3 diagnostiche RX Telecomandate occorrenti ai PP.OO. di Potenza, Melfi e Villa d'Agri		AOR San Carlo		-	-	-	€ 600.000,00	SI		n.i.	-	Dott. S. Grosso	In attesa nomina della commissione SIMOG 8631339 -G00354	Aggiudicata		
	190	2022_18b	Fornitura di microscopio operatorio 3D occorrente alla UOC di oculistica di Potenza		AOR San Carlo		-	-	-	€ 300.000,00	SI		n.i.	-	Dott.ssa M. G. Piedilato	Prevista apertura busta B il 21/11/2022 G00364	Aggiudicata		
	191	2022_18c	Fornitura di n. 2 laser ad olmo occorrenti alla UOC di Urologia dell'A.O.R. San Carlo di Potenza e alla UO di Urologia del PO di Lagonegro		AOR San Carlo		-	-	-	€ 300.000,00	SI		n.i.	-	Dott.ssa M. G. Piedilato	Gara indetta con scadenza il 25/11/2022 G00372	Aggiudicata		
	192	2022_18d	Fornitura di apparecchi per anestesia occorrenti ai PP.OO. Di Melfi, Lagonegro, Villa d'Agri e Potenza dell'A.O.R. San Carlo		AOR San Carlo		-	-	-	€ 840.000,00	SI		n.i.	-	Dott. S. Grosso	il 28/11/2022 scadenza gara e apertura offerte G00371	Aggiudicata		
	193	2022_20	Fornitura ed installazione di spect/tc	S/F	CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè Ing. S. Fulgieri	€ 600.000,00	1	€ 600.000,00	SI		n.a.	30/06/2022 15/03/2023	Dott.ssa M.G. Piedilato	Inviata documentazione tecnica in data 10/02/2023. Unità con gara ID 2022_19 - LOTTO 2 della procedura congiunta. Lotto andato deserto	Lotto deserto		
	194	2022_23	Servizio revisione contabile	S/F	ASP-ASM-S. Carlo -CROB- Regione	S. Carlo	Dott. R. Giordano	€ 200.000,00	3	€ 600.000,00	SI		2023	30/04/22		Cds svolta il 10/02/2023 In attesa delle delibere a contrarre dagli Enti committenti	Aggiudicata		
	195	2022_24	Suturatrici II Ed. (lotti deserti ed. I e infungibili)	S/F	ASP-ASM-S. Carlo - CROB	S. Carlo	Dott.ssa Aloè Dott.ssa F. Centore	443.000,00 281.639,00	5	2.215.000,00 1.408.195,00	SI		n.a.	31/05/2022 31/05/2023		Stralciata in occasione della Cds di approvazione del 2024	Cancellata		
	196	2023_01	Vaccini antinfluenzali	S/F	ASP-ASM-CROB	ASP	Dott. M. De Lisa	€ 1.701.500,00	1	€ 1.701.500,00	Bilancio aziendale		2023	31/03/2023	Dott.ssa V. Locicero		Aggiudicata		
	197	2023_03	Farmaci Biosimilari (ed. 2023)	S/F	ASP-ASM-S. CARLO-CROB	ASM	Dott.ssa F. A. Di Cuia	€ 14.351.500,00	3	€ 43.054.500,00	Bilancio aziendale		n.d.	30/09/2023			ELIMINATA		
	198	2023_13	Servizio di noleggio n.50 monitor defibrillatori per le ambulanze del DEU-118	S/F	ASP	ASP	Arch. F. Cicale	€ 420.000,00	6	€ 2.520.000,00	Bilancio aziendale		n.d.	30/06/2023			ELIMINATA E RIPROGRAMMATA		
	199	2023_15	Fornitura di Robot Chirurgico	S/F	CROB	CROB	Ing. S. Fulgieri	€ 2.049.180,00	1	€ 2.049.180,00	Finanziamento concesso con Determina dirigenziale Ufficio Internalizzazione, Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica n. 158G.2022/D.01983 del 22/12/2022 - POC Basilicata 2014/2020		n.d.	31/03/2023			Aggiudicata		
	200	2023_20	Dispositivi medici anatomia patologica	S/F	S. CARLO	S. CARLO	Dott.ssa P. Aloè / Dott.ssa G. Vita	€ 308.804,00	3	€ 926.412,00	Bilancio aziendale			11/08/2023	30/04/2023			ELIMINARE	
	201	2023_22	Servizio per screening neonatale	S/F	S. CARLO	S. CARLO	Dott.ssa P. Aloè / Dott.ssa S. Pesce	€ 300.000,00	2	€ 600.000,00	Bilancio aziendale			45246	30/04/2023		Stralciata in occasione della Cds di approvazione del 2024	Cancellata	
	202	2023_27	Manutenzione Risonanza Magnetica	S/F	ASP	ASP	Arch. F. Cicale	€ 80.000,00	5	€ 400.000,00	Bilancio aziendale			n.d.	30/06/2023			ELIMINARE	
	203	2023_29	Dispositivi medici lotti deserti ed infruttuosi della procedura ID 2017_13 (SIMOG 7627821)	S/F	ASP-ASM-S. CARLO-CROB	S. CARLO	Dott.ssa P. Aloè / Dott.ssa F. Centore Dott.ssa E. Ravaoli	€ 2.110.000,00	5	€ 10.550.000,00	Bilancio aziendale			lotti deserti della gara aggiudicata	Documentazione già in possesso della SUA-RB in quanto trattata di lotti deserti e infruttuosi	Avv. V. Telesca	RUP ha convocato il TTL in data 22/09/2023 Nel corso del TTL itenutosi in data 22/09/2023, il RUP della SUA-RB ha chiesto alle AA.SS. Di aggiornare i fabbisogni ed il dettaglio dei lotti di interesse. A novembre 2023 non risulta pervenuto nessun riscontro.	ELIMINATA E RIPROGRAMMATA ACCORPATA A AGHI E SIRINGHE 2024	
	204	2015_09	Servizio elisoccorso con gestione integrate delle basi	S/F	S. CARLO-ASP-ASM-CROB	ASP	Non comunicato		5+3	€ 36.381.000,00	Non dichiarata			31/01/16	Geom. N. Locaspi	Sottoscritto Protocollo di Azione di Vigilanza Collaborativa con ANAC. Richiesta all'ASP la Delibera di approvazione della documentazione Tecnica. Gara sospesa per un periodo a causa di un contenzioso, ripubblicata il 18/01/2021.	Gara aggiudicata con ricorso pendente avverso l'aggiudicazione		
	205	2017_14	Personale per supporto amministrativo	S/F	ASP - S. CARLO - ASM - CROB	ASP	Dott. C. Lopardo	€ 9.287.200,00	5	€ 46.436.000,00	SI			Non comunicata	30/04/2017 31/03/2018 30/06/2019 18/02/2021	Dott.ssa T. Andriani	G00327 - SIMOG: 8237985	Gara aggiudicata con ricorso al TAR avverso l'aggiudicazione visto dall'amministrazione. Attuale ricorso pendente al Consiglio di Stato	
	206	2018_23	Materiale per laboratorio NAT + lotti infruttuosi gara SIT	S/F	S. CARLO - ASM	S. Carlo	Dott. N. Di Chiara Dott.ssa E. Musto Dott.ssa Pafundi	€ 499.778,40	5	€ 2.498.892,00	SI			2019	30/06/2018 31/05/2019 31/03/2020 31/03/2023	Ing. G. Bianchini	L'ASM comunica il proprio interesse alla gara e lo quantifica in € 60.000 annui (27/02/2020)	Indetta Scadenza presentazione offerte il 27/11/2023	

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Fonte Finanziaria (definire)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS	
SEZIONE B	207	2020_14	Fornitura attrezzature e materiale consumo per laboratorio di Tipizzazione Tissutale	S/F	ASM	ASM	Dott. Dell'Edera	€ 700.000,00	5	€ 3.500.000,00	SI		2022	31/12/2020 30/06/2021 30/04/2022 18/11/2022		ASM ha trasmesso la DOCUMENTAZIONE DEL TAVOLO TECNICO con PEC Protocollo n. 50470 del 18/11/2022. Nominato RdP (Maria Grazia Piedilato) con nota Protocollo nr. 171084 - del 25/11/2022. Si attende convocazione CdS.	Indetta Apertura busta B il 22/11/2023		
	208	2021_07	Supporto attività amministrative ed ausilio operativo	S/F	ASM - S. Carlo	S. Carlo	Dott. N. Di Chiara Avv. F. Ciarati Avv. P. Aloè	€ 2.810.694,32	5	€ 14.053.471,58	SI		-	30/06/2021 30/06/2022 28/02/2023	Arch. E.P. Petruzzi	Effettuata verifica, avente esito negativo, di eventuale sovrapposizione con altre procedure inerenti il personale. Arrivata in data 28/02/2023 integrazione documentale ed attualmente in corso di istruttoria. Con nota prot. 4523 del 27/01/2023 l'ASM comunica la propria rinuncia alla partecipazione alla gara (contributo di € 730.000)	Indetta Scadenza presentazione offerte 04/12/2023		
	209	2021_11	Cancelleria e Stampati (II edizione)	S/F	ASP-ASM-S. Carlo-CROB	CROB	Dott.ssa M. Lauletta Dott.ssa P. Aloè Dott. P. Libutti	€ 1.505.231,30	5	€ 7.526.156,50	SI		-	30/04/2021 15/03/2022 31/08/2023	Dott. S. Grosso	Tra i committenti si è aggiunta la Giunta.	Indetta Scadenza presentazione offerte 15/12/2023		
	210	2022_06	Servizi assicurativi (no RCT)	S/F	ASM-ASP-CROB	ASP	Dott. G. Rinaldi	€ 575.000,00	3	€ 1.725.000,00	SI			2023	30/06/2022 31/03/2023	Arch. E.P. Petruzzi	ASP ha trasmesso la DOCUMENTAZIONE DEL TAVOLO TECNICO con nota protocollo reg.le n. 123526 del 07/06/2023. RUP nominato in data 08/06/2023. CdS conclusiva tenutasi il 25/10/2023. In attesa Determina a contrarre	Indetta	
	211	2022_19	Fornitura di PET di ultima generazione comprensiva di lavori	S/F	CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè Ing. S. Fulgieri	€ 3.800.000,00	1	€ 3.800.000,00	SI			n.a.	30/06/2022 15/03/2023	Dott.ssa M.G. Piedilato	Inviata documentazione tecnica in data 10/02/2023. Unità con gara ID 2022_20 - LOTTO 1 della procedura congiunta. La procedura di gara congiunta è stata pubblicata il 07/04/2023. Con nota acquisita al prot. reg.le n. 0092916 del 28/04/2023 il CROB comunica la necessità di correzione refusi contenuti nella documentazione di gara. La SUA-RB integra con determina 20BC.2023/D.00102 del 05/05/2023 la documentazione di gara pubblicata e proroga i termini di presentazione delle offerte. In data 13/07/2023 viene nominata la commissione di gara che successivamente (25/09/2023 e 03/10/2023) si dimette in parte. Con nota 207514 del 09/10/2023 la SUA-RB chiede al CROB di confermare l'intenzione di acquistare il sistema PET/CT WHOLE BODY avente le caratteristiche tecniche riportate nel capitolato tecnico rettificato.	Revocata Con nota prot. 2023-0008300 del 22/11/2023 (acq. al prot. reg.le n. 242898 del 22/11/2023) il CROB ha notificato la deliberazione 424/2023 recante la revoca in autotutela della gara. In attesa di revoca da parte della SUA-RB	
	212	2022_21	Fornitura ed installazione di sequenziatore NGS	S/F	CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè Ing. S. Fulgieri	€ 400.000,00	1	€ 400.000,00	SI			n.a.	30/06/2022 14/02/2023	Ing. R. Onorati	Inviata documentazione tecnica in data 14/02/2023 prot. 2023-0001226. In attesa di nomina del RdP da parte della SUA-RB	Indetta Aperta busta B l'08/11/2023	
	213	2022_22	Fornitura ed installazione di acceleratore lineare	S/F	CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè Ing. S. Fulgieri	€ 3.223.373,06	1	€ 3.223.373,06	SI			n.a.	30/06/2022 15/03/2023	Dott.ssa P. Santarsiero		Indetta Busta B aperta	
	214	2022_26	Corso di formazione in infezioni ospedaliere	S/F	ASP - ASM - S. Carlo - CROB	S. Carlo	Dott.ssa A. Bellettieri	€ 404.852,31	3	€ 1.214.556,93	SI			n.a.	15/12/2022 30/04/2023	Dott.ssa T. Andriani	TTL conclusi Prevista CdS entro fine novembre 2023	Indetta	
	215	2023_04	Vaccini obbligatori e raccomandati	S/F	ASP-ASM-S. CARLO-CROB	ASP	Dott. M. De Lisa	€ 3.055.500,00	1	€ 3.055.500,00	Bilancio aziendale			n.d.	30/04/2023	Dott.ssa V. Locicero		Indetta Scadenza presentazione offerte 05/12/2023	
	216	2015_13	Casa alloggio: gestione dei servizi assistenziali, terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi per utenti psichiatrici presso le strutture residenziali e semi-residenziali ASM e ASP	S/F	ASP-ASM	ASP-ASM	Non comunicato			5	€ 58.630.801,99	SI		Non comunicata	31/03/2020 27/02/2023	Geom. N. Locaspi	Necessità di nuova CdS in seguito a revisione atti dopo la sospensione. Nel corso del TTL del 13/01/2021 l'ASM si è impegnata ad effettuare le verifiche sul rispetto degli standard dei propri immobili. In data 19/05/2021 il referente per l'ASM Dott.ssa Lucia D'Ambrosio ha trasmesso alla SUA-RB l'esito dell'attività istruttoria di verifica della sussistenza dei requisiti strutturali stabiliti dalla DGR n.1218 del 14.11.2017 presso gli immobili nella disponibilità dell'Azienda Sanitaria di Matera. A seguito di quanto discusso nel TTL del 17/02/2023, 15/03/2023, 05/04/2023, 28/04/2023 e 10/05/2023, si è concordato di modificare gli atti di gara prevedendo l'onere della messa a disposizione delle strutture a carico dell'aggiudicatario. La SUA-RB è in attesa della formalizzazione da parte delle AA.SS. di tale volontà per convocare la CdS conclusiva.	TTL convocato per il 11/12/2023 e prevista indizione entro il 31/03/2024	CdS effettuata ed in attesa delle delibere a contrarre
	217	2015_21	Centrale unica sterilizzazione	S/F	S. CARLO - ASM - CROB - ASP	ASM	Dott. G. Di Sabato Ing. T. Bengiovanni	€ 6.382.499,52	9	€ 57.442.495,68	SI			Nuovo contratto	31/05/2016 30/06/2019 30/09/2020 30/06/2022 20/03/2023	Ing. V. Terese Geom. N. Locaspi	Documentazione trasmessa in SUA-RB in data 9/11/2018, con nota prot. n. 20180066808. Le aziende devono aggiornare la documentazione di gara. ASM e S. Carlo aderiscono a tutti e 3 i lotti (1- servizio sterilizz. 2- Strumentario pluriuso. 3 - Strumentario monouso) CROB aderisce solo a lotto 2 e 3. ASP non aderisce (nota 106995 del 05.10.2017). Nuova trasmissione, da parte dell'ASM, al S. Carlo degli stessi atti con nota prot. 20190018360 del 28.03.2019 al fine di redigere la parte del progetto definitivo di competenza del S. Carlo.	Dopo numerosi TTL, a partire dal giugno 2018, si è rimasti in attesa della documentazione tecnica da parte del S. Carlo, come evidenziato dall'ASM con nota 9360 del 12/02/2021. Non essendo mai pervenuta tale documentazione nel corso del TTL del 12/06/2023 il S. Carlo ha comunicato di voler rinunciare alla procedura di gara. L'Azienda ha confermato il proprio interesse trasmettendo il progetto con nota acquisita al prot. 241796 del 21/11/2023. L'ASM ha trasmesso il progetto di gara con nota acquisita al prot. regionale 241796 del 21/11/2023. Richiesta integrazione strumentario da arrivare in SUA-RB entro Febbraio 2024	29/02/2024
	218	2020_03	Dispositivi per Cardiocirurgia - II Ed.	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dr. Giampaolo Lodi Dott.ssa Aloè / Eugenio Stabile	4.604.742,41 5.100.000,00	3	13.814.227,23 15.300.000,00	SI			2020	31/01/2020 30/04/2022 30/04/2023	Arch. E.P. Petruzzi	Con nota S. Carlo 50214 del 11/12/2020 comunica la documentazione integrativa richiesta. Gli importi di gara sono stati aggiornati in seguito alla CdS del 18/02/2021 integrandoli per un valore annuo di € 4.354.742,41. Trattasi di prodotti infungibili. E' stata fatta richiesta di relazione di infungibilità ai sensi della DGR 1226/2015 con nota 114618/20AC del 23/06/2021 non ancora riscontrata nonostante un sollecito del 31/08/2021. La SUA-RB con nota prot. 10997 del 17/01/2023 sollecita l'Azienda committente all'invio della documentazione tecnica completa. NESSUN RISCONTRO DALLE AA.SS. (rif. 2023). CONFERMARE INTERESSE	Atti inviati in SUA-RB a Gen-2024. In valutazione dal RUP	
	219	2020_07	Ausili per assistenza domiciliare respiratoria	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott.ssa G. Motola	€ 1.800.000,00	6	€ 10.800.000,00	SI			2020	30/06/2020 31/05/2021 30/06/2022 da definire	Avv. V. Telesca	Si rende necessario, da parte dell'ASP di definire, congiuntamente alla SUA-RB, preliminarmente all'invio della documentazione tecnica una linea di condotta tale da recepire le indicazioni del Consiglio di Stato. Nominato RUP. Il RUP il 21/11/2022, in occasione del TTL, ha chiesto integrazione documentale alle AA.SS. che ancora non è pervenuta. NESSUN RISCONTRO DALLE AA.SS. (rif. 2022). CONFERMARE INTERESSE	31/03/2024	
	220	2021_01	Tesoreria	S/F	ASP-ASM-S. Carlo-CROB	S. Carlo	Dott.ssa P. Vinei Dott. R. Giordano	€ 185.000,00	5	€ 925.000,00	SI			-	30/06/2021 30/04/2022 31/05/2023		Il CROB manifesta il suo interesse a partecipare nel corso della CdS del 15/02/2022. Non ricevuta documentazione tecnica	31/03/2024	

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Fonte Finanziaria (definire)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indicazione Cds	
SEZIONE C	221	2021_02	Ortopedia (lotti scaduti, infruttuosi, deserti, esauriti)	S/F	ASM-S.Carlo	S.Carlo	Dott. R. Romeo	€ 1.251.854,20	5	€ 6.259.271,00	SI		-	30/06/2021 30/04/2022 30/06/2023		In data 27/01/2022 si sollecitava invio documentazione. Con nota del Dott. Romeo del 10 maggio 2022, si invitava ciascuna azienda a riesaminare il proprio fabbisogno annuale di dispositivi. In data 09/06/2022 la SUARB invitava la trasmissione della documentazione riferita ad entrambe le aziende, previa definizione del fabbisogno da parte di ciascuna Azienda. In data 18/10/2022 l'ASM trasmette i propri fabbisogni. Ad oggi si attendono i fabbisogni del San Carlo e della trasmissione alla SUARB dell'intera documentazione riferita ad entrambe le aziende. NESSUN RISCONTRO DALLE AA.SS. (rif. 2022). CONFERMARE INTERESSE		31/03/2024	
	222	2021_09	Dispositivi medici per Chirurgia Vascolare (II edizione)	S/F	ASM-S.Carlo	S.Carlo	Dott.ssa Aloè Dott. P. Cappiello Dott. Esposito	5449062,29 1.640.706,00	3	16257186,68 4.922.118,00	SI		-	31/10/2021 30/04/2022 30/04/2023	Ing. E. Caimo	Documentazione tecnica inviata in data 12/09/2023. RUP nominato in data 08/11/2023.		Gara di prossima indicazione	
	223	2021_12	Pacemaker, defibrillatori e mat. elettrofisiologia (II edizione)	S/F	ASM-S.Carlo	ASM	Dott. G. Calulli Dott. N. Bozza	€ 4.500.000,00	3	€ 13.500.000,00	SI		-	30/06/2021 30/03/2022 29/11/2022	Ing. E. Caimo	ASM ha trasmesso la DOCUMENTAZIONE DEL TAVOLO TECNICO con PEC Protocollo n. 52719 del 29/11/2022. RUP nominato in data 07/03/2023.		15/03/2024	
	224	2022_05	Materiale per medicazioni	S/F	ASM-ASP-S.CARLO-CROB	ASM	Dott.ssa F. Di Cuia	€ 1.692.123,31	5	€ 8.460.616,55	SI		2023	30/06/2022 da definire	Avv. V. Telesca	Nomina RUP in data 26/10/2022 con prot. 150784/20BD Convocati nove TTL e si prevede di poter pubblicare la gara entro il 31/12/2023		Convocata Cds per il 15/12/2023 (nota prot. reg.le n. 262827/BD del 13/12/23) In attesa delle DD a contrarre	
	225	2022_12	Reagenti immunotrasfusionale con service attrezzature	S/F	ASM-S.Carlo	S.Carlo	Dott.ssa M Pafundi	€ 3.140.556,00	5	€ 15.702.780,00	SI		2022	30/06/2022 30/06/2023		Non ricevuta documentazione tecnica		Documentazione pervenuta alla SUA-RB a Gennaio 2024. La SUA-RB deve nominare il RUP	
	226	2022_25	Servizio di digitalizzazione, obliterazione, rilevazione, controllo ed elaborazione delle informazioni delle ricette farmaceutiche e di quelle relative all'assistenza integrativa regionale (ASIR) e conservazione sostitutiva dei documenti trattati	S/F	ASP - ASM	ASP	Dott. G. Lardino	€ 210.000,00	3	€ 630.000,00	SI		30/11/22	30/09/2022 31/03/2023	Geom. N. Locaspi	Ultimo TTL da convocare a seguito di chiarimento richiesto alla Dir. Gen. Salute. Richiesta ASP prot. 98047 del 18/10/2023 Richiesta ASM prot. 215715 del 19/10/2023		30/03/2024	
	227	2023_02	Farmaci (ed. 2023)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Dott.ssa F.A. Di Cuia	€ 57.000.000,00	3	€ 171.000.000,00	Bilancio aziendale		n.d.	30/09/2023	Dott.ssa V. Locicero	RUP nominato il 16/10/2023 Prossima convocazione primo TTL (novembre 2023)		TT in corso Verifica su Consip da parte del RUP e pubblicabile entro 31/03/2024	
	228	2023_05	Servizi di governo di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	S.CARLO	Dott.ssa P. Aloè	€ 20.550.000,00	5	€ 102.750.000,00	Bilancio aziendale		n.d.	31/07/2023				In attesa di DD a Contrarre	
	229	2023_11	Reagenti e consumabili previo service apparecchiature per U.O.C. Lab. Analisi A.O.R. San Carlo	S/F	S.CARLO	S.CARLO	Dott.ssa P. Aloè / Dott. A. Picerno	€ 3.890.000,00	3	€ 11.670.000,00	Bilancio aziendale		lotti non aggiudicati	31/03/2023			Non ricevuta documentazione tecnica		29/02/2024
	230	2023_12	Somministrazione di personale	S/F	ASP	ASP	Dott. A. Pedota	€ 3.000.000,00	3	€ 9.000.000,00	Bilancio aziendale		scaduti	30/04/2023	Dott.ssa T. Andriani	RUP nominato il 23/08/2023 TTL avviati e prevista la convocazione della Cds entro il 31/12/2023		In attesa di DD a Contrarre	
	231	2023_18	Strumentario dedicato Robot Da Vinci	S/F	S.CARLO	S.CARLO	Dott.ssa P. Aloè / Dott. Falabella	€ 369.420,50	3	€ 1.108.261,50	Bilancio aziendale		31/12/2022	31/03/2023			Non ricevuta documentazione tecnica		Documentazione inviata a SUA-RB a Febbraio 2024
	232	2023_30	Gara d'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di supporto alle Aziende Sanitarie ASP e ASM per l'attuazione del Piano Regionale Gioco d'Azzardo Patologico	S/F	ASP - ASM	ASP	Dott. Pietro Fundone	€ 456.198,21	3	€ 1.368.594,63	"DGR n.214 del 16 marzo 2018. "Piano Regionale 2017/2018 - Gioco d'Azzardo Patologico". DD 132/20-13AO - DD 143/20-13AO - DD14/22-13BD		2023	15/06/2023	Ing. G. Cirigliano	RUP nominato il 16/10/2023 TTL da avviarsi entro dicembre 2023 Documentazione progettuale in bozza inviata alla SUA-RB il 08/06/2023		CDS ENTRO IL 30/04/2024	
	233	2023_31	Radiofarmaci - lotti deserti ed infruttuosi della procedura ID 2021_13 (SIMOG 8825108)	S/F	ASM-S.CARLO-CROB	CROB	Dott.ssa M.R. Milella				Bilancio aziendale				Ing. E. Caimo				IN INDIZIONE
	SEZIONE D	234	2019_15	Ausili protesici - Ed. 2 (Lotti deserti e infruttuosi + Integrazione ad Ed. 1)	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott. G. Rinaldi Dott.ssa Giulia Motola	€ 1.450.000,00	5	€ 7.250.000,00	SI		Non comunicata	30/06/2019 31/07/2020 30/04/2021 30/06/2022 30/04/2023		Non ricevuta documentazione tecnica		30/06/2024
		235	2020_16	Servizi gestione apparecchiature elettromedicali - lotti nuovi e lotti infruttuosi ed 1	S/F	ASP-ASM-CROB-S.Carlo	S.Carlo	Dott. Grieco	€ 2.130.440,00	5	€ 10.652.200,00	SI		varie	30/06/2020 31/05/2021 30/04/2022 31/07/2023		Non ricevuta documentazione tecnica		31/08/2024
236		2021_10	Revisione dell'infrastruttura di backup centrale e periferica	S/F	S.Carlo	S.Carlo	Ing. P. P. Galli	€ 600.000,00	1	€ 600.000,00	SI		-	30/06/2021 30/04/2022 31/07/2023		Non ricevuta documentazione tecnica		01/06/2024	
237		2021_14	Fornitura iniettori e materiale di consumo per TAC, Angiografi e Risonanza magnetica	S/F	ASM-S.Carlo	ASM	Ing. T. Bengio Dott.ssa F. Di Cuia Ing. R. Morroi	€ 600.000,00	3+2	€ 3.000.000,00	SI		-	30/08/2021 30/09/2022 30/06/2023		Non ricevuta documentazione tecnica		30/09/2024	
238		2022_01	Farmaci Biosimilari (ed. 2022)	S/F	ASM-ASP-S.CARLO-CROB	ASP	Dott. G. Lardino	€ 3.000.000,00	2	€ 6.000.000,00	SI		2022-2023	31/12/2022 30/09/2023		Non ricevuta documentazione tecnica		30/04/2024	
239		2022_09	Dispositivi medici per fisiopatologia della riproduzione	S/F	ASM-S.Carlo	S.Carlo	Dott. S. Schettini	€ 329.601,12	5	€ 1.648.005,59	SI		2022	30/06/2022 30/06/2023		Non ricevuta documentazione tecnica		31/03/2024	
240		2022_11	Dispositivi medici neurochirurgia	S/F	S.Carlo	S.Carlo	Dott. G. Vitale	€ 663.713,98	3	€ 1.991.141,94	SI		2023	30/06/2022 31/07/2023		Non ricevuta documentazione tecnica		30/04/2024	
241		2022_14	Sistema artroscopico per interventi di ortopedia in service	S/F	ASM	ASM	Ing. F. Petrara	€ 70.000,00	5+2	€ 490.000,00	SI		n.a.	31/12/2022 30/05/2023		Non ricevuta documentazione tecnica		31/12/2024	
242		2022_17	Dispositivi medici per cardiologia strutturale	S/F	ASM-S.Carlo	S.Carlo	Dott. E. Stabile	€ 2.800.000,00	3	€ 8.400.000,00	SI		2023	30/06/2022 30/04/2023		Non ricevuta documentazione tecnica		31/03/2024	
243		2023_06	Servizio di brokeraggio assicurativo	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASP	Dott. G. Rinaldi	€ 580.000,00	5	€ 2.900.000,00	Bilancio aziendale		n.d.	31/07/2023		Non ricevuta documentazione tecnica		30/04/2024	
244		2023_07	Servizi assicurativi RCT	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASP	Dott. G. Rinaldi	€ 5.871.666,67	3+2	€ 29.358.333,33	Bilancio aziendale		n.d.	31/07/2023		Non ricevuta documentazione tecnica		30/04/2024	
245		2023_08	Servizio di noleggio, lavaggio di biancheria piana, confezionata, materasseria	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	S.CARLO	Dott.ssa P. Aloè	€ 4.400.000,00	5	€ 22.000.000,00	Bilancio aziendale		n.d.	31/07/2023		Non ricevuta documentazione tecnica		30/04/2024	
246		2023_09	Servizio di preparazione e somministrazione pasti veicolati ai degenti e al personale	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Dott. A. Molino	€ 9.100.000,00	5	€ 45.500.000,00	Bilancio aziendale		n.d.	30/06/2023		Non ricevuta documentazione tecnica		31/05/2024	
247		2023_10	Servizio di vigilanza	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Dott. A. Molino	€ 6.950.000,00	5	€ 34.750.000,00	Bilancio aziendale		n.d.	30/06/2023		Non ricevuta documentazione tecnica		31/03/2024	
248		2023_14	Fornitura di dispositivi medici per Endoscopia Digestiva Ed. 2	S/F	ASM - S.CARLO - CROB	ASM	Dott. B. D'Ascoli	500.000,00 €	5	€ 2.500.000,00	Bilancio aziendale		ott-24	31/12/2023		Non ricevuta documentazione tecnica		30/04/2024	
249	2023_16	Acquisizione in modalità "full service" di sistemi diagnostici per la gestione dell'identificativo del campione di immunoistochimica, colorazioni speciali e fish/cish per anatomia patologica	S/F	S.CARLO - CROB - ASM	CROB	Dott.ssa G. Vita	€ 560.000,00	5	€ 2.800.000,00	Bilancio aziendale		giu-24	15/09/2023		Non ricevuta documentazione tecnica		30/04/2024		
250	2023_17	Servizio di manutenzione ed assistenza full-risk degli ausili protesici di proprietà dell'ASP concessi in uso per assistenza ventilatoria domiciliare	S/F	ASP	ASP	Dott.ssa G. Motola	€ 300.000,00	4	€ 1.200.000,00	Bilancio aziendale		28/02/2022	31/05/2023		Non ricevuta documentazione tecnica		30/04/2024		
251	2023_19	Servizio di conservazione sostitutiva digitale	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	S.CARLO	Ing. P. P. Galli	€ 350.000,00	3	€ 1.050.000,00	Bilancio aziendale		31/12/2022	31/05/2023		Non ricevuta documentazione tecnica		01/12/2024		
252	2023_21	Emogasanalizzatori	S/F	ASM	ASM	Dott. A. Molino	€ 140.000,00	5	€ 700.000,00	Bilancio aziendale		mag-24	30/06/2023		Non ricevuta documentazione tecnica		30/05/2024		

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Fonte Finanziaria (definire)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
	253	2023_23	Sistema in service per trattamento mininvasivo per ipertrofia prostatica benigna	S/F	S.CARLO - ASM	S.CARLO	Dott.ssa P. Aloè / Dott. Falabella	€ 395.000,00	2	€ 790.000,00	Bilancio aziendale		31/12/2022	30/11/2023			Non ricevuta documentazione tecnica	31/12/2024
	254	2023_24	Acquisto di n. 2 gruppi elettrogeni per la sede ospedaliera San Carlo di Potenza	S/F	S.CARLO	S.CARLO	De S. Pietro	€ 350.000,00	1	€ 350.000,00	Bilancio aziendale		31/12/2023	31/07/2023			Non ricevuta documentazione tecnica	31/08/2024
	255	2023_25	Ventilatori ospedalieri e maschere	S/F	ASM	ASM	Dott.ssa F.A. Di Cuià	€ 100.000,00	3+2	€ 500.000,00	Bilancio aziendale		set-25	30/06/2023			Non ricevuta documentazione tecnica	30/06/2024
	256	2023_26	Fornitura in service analizzatori biochimici per il DEU 118	S/F	ASP	ASP	Arch F. Cicale	€ 120.000,00	5	€ 600.000,00	Bilancio aziendale		n.d.	30/06/2023			Non ricevuta documentazione tecnica	30/06/2024
	257	2023_28	Servizi di mantenimento edile e giardinaggio	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	CROB	Ing. M. G. Lauletta	€ 1.180.000,00	5	€ 5.900.000,00	Bilancio aziendale		n.d.	30/04/2023			Non ricevuta documentazione tecnica	31/03/2024

Legenda colori:

Sezione A	Procedure di gara aggiudicate o comunque concluse o non da effettuarsi
Sezione B	Procedure di gara in corso di espletamento (si intende gare per le quali è stata conclusa la Conferenza di Servizi)
Sezione C	Istruttoria in corso (si intende che è stata ricevuta la documentazione secondo quanto previsto al punto 1.a della DGR 713/2020)
Sezione D	Procedure di gara per le quali non è stata trasmessa la documentazione secondo quanto previsto al punto 1.a della DGR 713/2020)
Attenzione	Informazioni mancanti o da aggiornare
	Informazioni aggiornate
